

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2023EE03517

Fecha: 31/03/2023

Bogotá D.C.,

Doctor
CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA
Representante a la Cámara
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
carlos.ardila@camara.gov.co
debatescomisionprimera@camara.gov.co
Ciudad

Asunto: Respuesta oficio No. C.P.C.P.3.1.982-23 del 27 de marzo de 2023. Comisión Primera Constitucional Permanente. Radicado UNGRD 2023ER06276.

Cordial saludo,

En atención al requerimiento del asunto, mediante el cual el secretario de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, remitió el cuestionario presentado en Proposición No. 19 por el Representante CARLOS ADOLFO ARDILA ESPINOSA, con relación a la Reconstrucción de Mocoa, a continuación procedemos a suministrar respuesta a cada uno de los puntos formulados:

“1. ¿Cuáles fueron las líneas de acción del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del municipio de Mocoa y sus plazos de ejecución?”

El Plan de Acción Específico - PAE del proceso de Reconstrucción de Mocoa contempla actividades que atienden seis líneas de acción estratégicas, a saber: (i) ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo; (ii) infraestructura social; (iii) conectividad e integración regional; (iv) desarrollo económico; (v) desarrollo social, y (vi) desarrollo institucional; actividades en las que concurren diversas entidades del orden nacional, seccional y local, atendiendo su misionalidad, capacidades, funciones y competencias, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, que establece:

“ARTÍCULO 61. Una vez declarada la situación de desastre o calamidad pública, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos para el manejo y recuperación, siendo de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones”.

“ARTÍCULO 62. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES. En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de acción específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades



en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan”.

El PAE del proceso de Reconstrucción de Mocoa, contempla las siguientes actividades atendiendo las seis líneas de acción estratégicas:

1. CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL	
1.1 INFRAESTRUCTURA VÍAL	1.1.1 CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES
	1.1.2 RECONSTRUCCIÓN 1 PUENTE VEHÍCULAR MULATO
	1.1.3 RECONSTRUCCIÓN PUENTE SANGOYACO
	1.1.4 PAVIMENTACION DE 5 KM DE VÍA URBANA - INGENIEROS MILITARES
	1.1.5 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO - MOCOA, PUTUMAYO.
	1.1.6 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA
	1.1.7 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO VEREDA VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE MOCOA
1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.2.1 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA
2. DESARROLLO ECONÓMICO	
2.1 ACTIVACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO	2.1.1 IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
2.2 COMERCIO	2.2.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO TEMPORAL
	2.2.2 REACTIVACIÓN DE 164 EMPRESARIOS AFECTADOS POR LA AVALANCHA Y AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA
2.3 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	2.3.1 CONSTRUCCIÓN DEFINITIVA DE LA PLAZA DE MERCADO
3. DESARROLLO INSTITUCIONAL	
3.3 FORTALECIMIENTO LEGAL	3.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCUTRA FÍSICA DEL CENTRO CARCELARIO-INPEC
3.4 PRESENCIA INSTITUCIONAL	3.4.1 OFICINA DE GOBIERNO NACIONAL
3.5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3.5.1 CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MOCOA
	3.5.2 CONSTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA
	3.5.3 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS (Máquina cisterna)
	3.5.4 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS (Kit de rescate acuático)
4. DESARROLLO SOCIAL	
4.1 EDUCACION	4.1.1 DOTACIÓN DE UNIFORMES FORMAL Y DEPORTIVO PARA LOS 2.518 NIÑOS
	4.1.2 PROGRAMA SER PILO PAGA
4.2 INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	4.2.1 ATENCION Y RECUPERACION INTEGRAL DE LAS FAMILIAS INDIGENAS Y PERSONAS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DAMNIFICADAS EN LA AVALANCHA EN MOCOA
4.3 MINAS Y ENERGÍA	4.3.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS COMBUSTIBLE DOMICILIARIO
	4.3.2 APOYO ECONÓMICO A LOS DAMNIFICADOS MEDIANTE EL CONGELAMIENTO DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA LOS ESTRATOS 1, 2, 3
4.4 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	4.4.1 AMPLIACION PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR
4.5 SALUD	4.5.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
	4.6.1 APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

4.6 RECONSTRUCCIÓN TEJIDO SOCIAL	4.6.2 APOYO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN AFECTADA
4.7 EVALUACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN	4.7.1 REALIZAR LA EVALUACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS FASES DE INTERVENCIÓN DE LA EMERGENCIA
5. INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
5.1 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	5.1.1 VERIFICAR EL DIAGNOSTICO Y GRADO DE AFECTACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURAL Y URBANAS
	5.1.2 REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE VIABILIZACIÓN DE PREDIOS, FORMULACIÓN DE PROYECTOS, DEFINICIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS, DISEÑOS, ESTUDIOS ENTRE OTROS ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIEDAS.
	5.1.3 CONSTRUCCIÓN 300 VIVIENDAS URBANAS FASE 1
	5.1.4 CONSTRUCCIÓN 909 VIVIENDAS URBANAS FASE 2
	5.1.5 CONSTRUCCIÓN DE 253 VIVIENDAS RURALES
	5.1.6 INTERVENTORIAS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
	5.1.7 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA
	5.1.8 MEJORAMIENTO DE 350 VVIENDAS RURALES
	5.1.9 MEJORAMIENTO DE 300 VIVIENDAS PROSPERIDAD SOCIAL
	5.1.10 CARACTERIZACIÓN Y POSTULACIÓN DE FAMILIAS EN VIVIENDA
	5.1.11 PROGRAMA MI CASA YA
5.2 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5.2.1 AMPLIACIÓN DE 3 SEDES EDUCATIVAS EN 24 AULAS
	5.2.2 CONSTRUCCIÓN DE 1 COLEGIO DE 24 AULAS SAUCES II
	5.2.3 CONSTRUCCIÓN DE 2 COLEGIOS GOBERNACIÓN (FRAY PLACIDO Y CAMENTSA)
	5.2.4 MEJORAMIENTO DE 9 SEDES EDUCATIVAS
	5.2.5 CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA - MINCULTURA-EMBAJADA DE JAPÓN
	5.2.6 CONSTRUCCIÓN CASA LÚDICACANCELLERIA
	5.2.7 DOTACIÓN MOBILIARIO LUDOTECA
	5.2.8 CONSTRUCCIÓN CDI BARRIO LOS SAUCES I
5.3 INFRAESTRUCTURA AGUA, ENERGIA Y GAS	5.3.1 RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO
	5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA
	5.3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO
5.4 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	5.4.1 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TERCER NIVEL- JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
	5.4.2 DOTACIÓN HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
5.6 MITIGACIÓN DEL RIESGO	5.6.1 OBRAS DE MITIGACIÓN
	5.6.2 CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO EL PEÑÓN MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO
6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO	
6.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	6.1.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
6.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL	6.2.1 FORMULACIÓN DEL POT (POT MODERNOS) Y LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y RIESGO-DNP
	6.2.2 DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE EJES AMBIENTALES DE LOS RÍOS MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA-CORPOAMAZONIA
	6.2.3 ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL RÍO MULATO EN LA ZONA URBANA-CORPOAMAZONIA
	6.2.4 PRIORIZACIÓN POMCAS
	6.2.5 ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SISMICA

Fuente: PAE Mocoa



Se adjunta acta de CMGRD 32 y acta de CDGRD 07, donde se aprueba el PAE 2017. Anexo 01.

“2. ¿Cuál es el estado actual de ejecución y/o implementación del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del municipio de Mocoa?”

Según la matriz de seguimiento de la oficina de Mocoa se tiene la siguiente ejecución:

45,5%	Ejecución UNGRD	\$ 791.244 millones
56,2%	Ejecución total Reconstrucción Mocoa	\$ 1.302.898 millones

Inversión total de UNGRD \$ 791.244 Millones, representados en proyectos finalizados por la UNGRD, Ayudas humanitarias y proyectos en ejecución solo por la UNGRD.

Inversión total de \$ 1.302.898 Millones (1,30 billones), representados en proyectos finalizados por la UNGRD, proyectos finalizados por otros sectores (Ministerios), Ayudas humanitarias y proyectos en ejecución.

“3. ¿Se ha definido un nuevo cronograma de ejecución y/o implementación del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del municipio de Mocoa?”

La alcaldía de Mocoa quien definió el PAE no ha informado a la oficina de Mocoa de la UNGRD de cambios en cronogramas.

“4. ¿Cuál es el estado actual de las obras de mitigación en los cauces de los ríos Mulato y Sangoyaco, así como la quebrada la Taruca y la Taruquita? ¿Cuáles eran los plazos iniciales de ejecución de estos proyectos? ¿A qué se deben los retrasos?”

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los contratos de ejecución de las obras de mitigación en la cuenca Media y Baja de las fuentes hídricas de los ríos Mulato, Sangoyaco y las quebradas la Taruca y Taruquita, incluyendo su valor, avance físico, avance financiero, fecha de terminación, fecha de finalización y estado de los mismos. Las obras de mitigación de Cuenca Media y Baja corresponden a 31 contratos de los cuales 18 constituyen obras y 13 contratos de interventoría.

No.	No. DE CONTRATO	TIPO CTO	ESTRUCTURA	CUENCA (BAJA/MEDIA/ALTA)	VALOR CONTRATO	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
1	9677-PPAL001-1334-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 1 Y DIQUE ABIERTO 2. SECTOR RÍO MULATO	MEDIA	\$6,923,961,014	08/03/2021	08/09/2022	40.00%	22,91%	SUSPENDIDO



No.	No. DE CONTRATO	TIPO CTO	ESTRUCTURA	CUENCA (BAJA/MEDIA/ALTA)	VALOR CONTRATO	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
2	9677-PPAL001-141-2021	INTERVENTORÍA	INTERV AL CTO 9677-PPAL001-1334-2020	MEDIA	\$546,150,500	08/03/2021	08/09/2022	47,54%	22,91%	VENCIDO
3	9677-PPAL001-988-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 03 , MURO 1, AZUD 05, MURO 2, AZUD 04 y MURO 3 SECTOR RÍO MULATO	MEDIA	\$10,192,094,882.00	09/03/2021	08/11/2022	100.00%	71.55%	FINALIZADO
4	9677-PPAL001-116-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-116-2021	MEDIA	\$823,079,398.00	09/03/2021	08/11/2022	100.00%	71.55%	FINALIZADO
5	9677-PPAL001-201-2021	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 06, MURO 4, AZUD 07 Y MURO 5, MURO 09, AZUD 11, MURO 8 Y MURO 10, AZUD 12 Y OBRAS DE DRENAJE, SECTOR RÍO MULATO	BAJA	\$11,323,151,748.00	09/03/2021	09/09/2022	58.73%	45.42%	VENCIDO
6	9677-PPAL001-344-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-201-2021	BAJA	\$928,830,700.00	09/03/2021	08/02/2023	55,12%	20.67%	EN EJECUCIÓN
7	9677-PPAL001-1025-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE MURO 06 , ESPOLON 01, ESPOLON 02 Y AZUD 08, SECTOR RÍO MULATO	BAJA	\$4,302,041,377.00	12/02/2021	11/12/2022	77.66%	36.07%	VENCIDO
8	9677-PPAL001-980-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 09, AZUD 10 Y MURO 07, SECTOR RÍO MULATO	BAJA	\$5,710,699,340.00	12/02/2021	29/08/2022	35.49%	22.45%	VENCIDO
9	9677-PPAL001-139-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-1025-2020 Y CTO 9677-PPAL001-980-2020	BAJA	\$809,421,123.00	12/02/2021	09/08/2022	43.81%	21.07%	VENCIDO
10	9677-PPAL001-1388-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 01, SECTOR QUEBRADA TARUCA	MEDIA	\$6,665,699,934.00	12/03/2021	11/01/2023	73,14%	73.14%	VENCIDO
11	9677-PPAL001-1023-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 2, SECTOR QUEBRADA LA TARUCA	MEDIA	\$6,318,499,572.00	12/03/2021	11/09/2022	100.00%	89.42%	LIQUIDACIÓN
12	9677-PPAL001-345-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-1388-2020 Y CTO 9677-PPAL001-1023-2020	MEDIA	\$1,044,310,680.00	12/03/2021	11/09/2022	81.06%	48.66%	VENCIDO
13	9677-PPAL001-977-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE JARILLON	MEDIA	\$30,413,014,931.00	15/12/2020	15/06/2023	84.87%	81.80%	EN EJECUCIÓN



No.	No. DE CONTRATO	TIPO CTO	ESTRUCTURA	CUENCA (BAJA/MEDIA/ALTA)	VALOR CONTRATO	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
			01.SECTOR QUEBRADA TARUCA							
14	9677-PPAL001-1365-2020	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-1365-2020	MEDIA	\$2,425,386,600.00	15/12/2020	20/04/2023	81.80%	81.80%	EN EJECUCIÓN
15	9677-PPAL001-1342-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 03, AZUD 04, AZUD 07, AZUD 08 Y MURO 01 SECTOR QUEBRADA TARUCA	MEDIA	\$8,307,462,026.81	11/11/2021	10/05/2023	16.28%	0.00%	EN EJECUCIÓN
16	9677-PPAL001-098-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-098-2021	MEDIA	\$673,647,100.00	11/11/2021	10/05/2023	16.28%	0.00%	EN EJECUCIÓN
17	9677-PPAL001-639-2021	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 09 Y MURO 03, SECTOR RIO SANGOYACO, AZUD 05, AZUD 06 Y MURO 02 SECTOR QUEBRADA TARUCA	MEDIA	\$7,838,331,969.00	26/08/2021	25/02/2023	52.39%	25.24%	SUSPENDIDO
18	9677-PPAL001-311-2021	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 10, SECTOR RÍO SANGOYACO	MEDIA	\$2,723,386,639.00	03/05/2021	02/11/2022	88.57%	36.76%	SUSPENDIDO
19	9677-PPAL001-110-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-639-2021 Y CTO 9677-PPAL001-311-2021	MEDIA	\$851,659,200.00	03/05/2021	02/11/2022	59.27%	37.51%	VENCIDO
20	9677-PPAL001-1119-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 11, MURO 04 Y MURO 05, SECTOR RÍO SANGOYACO	BAJA	\$5,280,966,838.95	16/03/2021	15/09/2022	89.44%	79.05%	VENCIDO
21	9677-PPAL001-1064-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE JARILLÓN 02, SECTOR RIO SANGOYACO	BAJA	\$15,407,336,784.60	16/03/2021	15/09/2022	92,06	78.00%	VENCIDO
22	9677-PPAL001-154-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-1119-2020 Y CTO 9677-PPAL001-1064-2020	BAJA	\$1,669,791,816.00	16/03/2021	15/09/2022	82.37%	49.67%	VENCIDO
23	9677-PPAL001-1330-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 15, MURO 09, SECTOR RÍO SANGOYACO	BAJA	\$1,930,861,194.00	15/04/2021	14/10/2022	98.00%	0.00%	VENCIDO
24	9677-PPAL001-323-2021	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 16, AZUD 17 Y MURO GAVION 10, SECTOR RIO SANGOYACO	BAJA	\$6,196,852,151.00	15/04/2021	14/01/2023	90.00%	26.57%	VENCIDO
25	9677-PPAL001-133-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-1330-2021 Y CTO 9677-PPAL001-323-2021	BAJA	\$660,557,330.00	15/04/2021	14/10/2022	65 %	0.00%	VENCIDO



No.	No. DE CONTRATO	TIPO CTO	ESTRUCTURA	CUENCA (BAJA/MEDIA/ALTA)	VALOR CONTRATO	FECHA DE ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERO	ESTADO ACTUAL
26	9677-PPAL001-183-2021	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE; SECTOR QUEBRADA LA TARUCA - RIO SANGOYACO	BAJA	\$4,452,771,492.00	11/04/2022	10/04/2023	4,51%	0.00%	EN EJECUCIÓN
27	9677-PPAL001-743-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-743-2021	BAJA	\$363,516,745.00	11/04/2022	10/04/2023	4,51%	0.00%	EN EJECUCIÓN
28	9677-PPAL001-1382-2020	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON Y ESPOLONES, SECTOR RÍO MOCOA	BAJA	\$24,560,158,153.00	28/04/2021	27/10/2022	80.00%	25,79%	VENCIDO
29	9677-PPAL001-205-2021	INTERVENTORÍA	INTERV CTO 9677-PPAL001-205-2021	BAJA	\$1,953,504,000.00	28/04/2021	27/10/2022	85.31%	25,79%	VENCIDO
30	9677-PPAL001-679-2022	OBRA	COMPENSACION AMBIENTAL	MEDIA-BAJA	\$5,442,344,231.00	N/A	N/A	N/A	N/A	EN EJECUCIÓN
31	9677-PPAL001-1056-2022	INTERVENTORÍA	COMPENSACION AMBIENTAL	MEDIA-BAJA	\$380,181,200.00	N/A	N/A	N/A	N/A	EN EJECUCIÓN

Fuente: FNGRD Expedientes contractuales

A la fecha la UNGRD se encuentra consolidando un informe sobre la verificación del estado de ejecución de los proyectos, incluyendo variables de ejecución como porcentaje de avance de las obras, estado contractual y ejecución financiera, con el fin de establecer los mecanismos para culminar satisfactoriamente la ejecución de la totalidad de las obras de mitigación en la cuenca media y baja.

En referencia a las Obras de Mitigación Cuenca Alta (a corte de 18-02-2023):

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres- UNGRD, dio apertura a veintidós (22) procesos (Invitaciones a cotizar) para la atención de la fase II de la cuenca alta del municipio de Mocoa con una inversión de \$185.494.833.210,00. De los 22 procesos, once (11) corresponden a obra por valor de \$ 174.565.981.785,00; y once (11) corresponden a interventoría por valor de \$ 10.928.851.425,00.

Actualmente desde proyectos de infraestructura de la SRR, línea encargada de la estructuración de los proyectos en apoyo a la línea de reconstrucción Mocoa, se remiten los siguientes avances:

1. En elaboración de la minuta del contrato por parte de la Fidupervisora: 1.
2. En perfeccionamiento y legalización del contrato: 2.
3. Contratos perfeccionados: 9 procesos de obra y 10 procesos de interventoría.

RESUMEN MOCOA CUENCA ALTA		
ESTADO	Número de procesos	
	Obra	Interventoría
En instrucción	0	0

RESUMEN MOCOA CUENCA ALTA		
ESTADO	Número de procesos	
	Obra	Interventoría
En elaboración de la minuta del contrato por parte de Fiduprevisora	1	0
En expedición de garantías	0	0
En perfeccionamiento y legalización de contrato	1	1
Contratos perfeccionados	9	10
Total	11	11

ANEXO 03: Informe 11 de seguimiento a la contratación a Obras de Mitigación Parte Alta.

“5. ¿Cuál es el estado actual de los proyectos de vivienda urbana y rural nueva? ¿Cuáles eran los plazos iniciales de ejecución de estos proyectos? ¿A qué se deben los retrasos?”

Proyecto de Vivienda Urbana Sauces II (909 Viviendas)

Contratos de Obra	No. 9677-PPAL001-243-2018
Contratos de Obra	No. 9677-PPAL001-244-2018
Contrato de Interventoría	No. 9677-PPAL001-277-2018
Inversión Obra	\$90.900.000.000
Inversión Interventoría	\$9.761.669.714
Beneficiarios:	909 familias
Tipo de intervención:	Obra de viviendas unifamiliares
Avance Físico:	35.85%
Avance financiero:	23.39%
Fecha de finalización:	31 de julio de 2023
Estado:	En ejecución

Los contratos de obra suscritos por la UNGRD para la ejecución de las 909 viviendas del proyecto Sauces II, a la fecha presentan un atraso respecto al cumplimiento de los hitos contractuales relacionados a la entrega de viviendas terminadas. Sobre los atrasos la interventoría HMV Ingenieros se ha manifestados informando a la UNGRD sobre la problemática social que se ha venido presentando de manera constante desde el mes de noviembre de 2022 a la fecha en la ciudad de Mocoa, representada en bloqueos de obra y manifestaciones sociales, las cuales evidentemente han afectado el avance de las actividades constructivas de las viviendas e



impidieron que el Contratista pudiera operar de manera normal y continua durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero de 2023.

No obstante, la interventoría HMV también manifestó a la UNGRD en la comunicación B2023-0089 del 24 de enero de 2023 que los atrasos presentados obedecen a presuntos incumplimientos del contratista de obra. (Se adjunta oficio de la interventoría).

Desde la UNGRD y con el apoyo de la interventoría HMV Ingenieros se han coordinado mesas de trabajo conjuntas con la finalidad de plantear planes de choque y alternativas de ejecución para el Consorcio Mocoa 2019, que permitan culminar a satisfacción la ejecución de las viviendas.

Adicionalmente, y como se relaciona a continuación, desde la UNGRD se han articulado mesas de seguimiento con la vinculación de agentes clave para la ejecución del proyecto como la comunidad beneficiaria del proyecto, la alcaldía de Mocoa, la Gobernación del Putumayo, Fonvivienda, Corpoamazonía, Procuraduría y Contraloría, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y aunar esfuerzos para dirimir inconvenientes que se han presentado durante la ejecución de los contratos de obra.

El siete (7) de diciembre de 2022, se llevó a cabo en la ciudad de Mocoa la instalación de la mesa de evaluación y seguimiento al proceso - Reconstrucción Mocoa, espacio liderado por esta Entidad y que contó con la asistencia de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fonvivienda, Findeter, la Gobernación de Putumayo, el municipio de Mocoa, la Procuraduría Regional de Putumayo, la Defensoría del Pueblo de Mocoa, la Personería de Mocoa y la participación de la ciudadanía representada por grupos de veeduría ciudadana.

En dicho espacio se trataron asuntos relativos a los proyectos que hacen parte de la reconstrucción de Mocoa, incluido el proyecto de vivienda de interés social denominado –Sauces II, que actualmente se ejecuta; donde se establecieron compromisos por parte de diferentes actores que concurren en su ejecución, seguimiento, vigilancia y control, dentro de los cuales se encuentra la realización de una primera reunión de evaluación y seguimiento, la cual se programó para llevarse a cabo el día veintidós (22) de diciembre de 2022. (Se adjunta acta de la reunión para conocimiento).

Ahora bien, el 22 de diciembre de 2022, no fue posible la realización de la reunión señalada, por lo cual se reprogramó para llevarse a cabo los días seis (6) y siete (7) de febrero de 2023.

Los días seis (6) y siete (7) de febrero de 2023, se realizó la jornada que contó con la presencia de servidores públicos de las entidades mencionadas así como la participación de la comunidad de Mocoa y las veedurías convocadas - se adjunta acta de reunión para conocimiento -. Como se evidencia en el acta, durante la intervención del Consorcio Mocoa 2019 *"(...) en 10 meses se entregarán las 909 viviendas distribuidas de la siguiente manera, el 15 de marzo se entregan las 12 primeras viviendas (...)"*.

Dentro de los compromisos de la citada acta se establece *"(...) comunidad acoge la propuesta de darle la oportunidad al consorcio de continuar con el contrato y en caso de incumplimiento la comunidad damnificada solicitará la liquidación al contratista, y la respuesta de ello será una acción de tipo en vías de echo (Sic.) para sus respectivas garantías (...)"*



A la fecha, desde la UNGRD se evalúa la propuesta del contratista de modificación contractual en plazo hasta finales del mes de diciembre del presente año, que ya tiene viabilidad por parte de la Interventoría HMV Ingenieros, con el fin de poder instruir a la fiduciaria la Previsora S.A para perfeccionar suscribir las minutas de Otrosíes correspondientes

Proyecto Sauces III (87 Viviendas)

Convenio:	9677-PPAL001-783-2018
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar y ejecutar el programa de construcción de vivienda nueva en fase de recuperación, en el marco de la Declaratoria de Situación de Calamidad Pública en el Municipio de Mocoa, de conformidad con el Decreto Municipal No. 00176 del 12 de agosto de 2018.
Entidades:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda y Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FNGRD
Inversión:	\$9.309.000.000,00
Beneficiarios:	87 familias
Tipo de intervención:	Vivienda Nueva
Cantidad de intervención:	87 soluciones de vivienda nueva
Avance Físico:	0,00%
Avance financiero:	0,00%
Fecha de Suscripción:	28/12/2018
Fecha de Inicio:	28/12/2018

Estado Actual: El convenio se encuentra en ejecución.

La alcaldía se encuentra gestionando la consecución de un predio, para posteriormente postularlo y en él implantar y desarrollar el proyecto de vivienda.

Proyecto Mocoa Nucleado (216 Viviendas)

Convenio:	9677-PPAL001-668-2017
Objeto:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar y ejecutar rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de viviendas rurales en los departamentos del Huila, Caldas, Nariño y Putumayo, en el marco de las declaratorias de situación de calamidad pública.
Entidades:	Banco Agrario de Colombia - BAC Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FNGRD
Inversión para Mocoa:	Obra: \$25.628.140.210,00

Convenio:	9677-PPAL001-668-2017
	Interventoría: \$2.562.814.021,00 Total: \$28.190.954.231,00
Beneficiarios:	216 familias
Tipo de intervención:	Vivienda Nueva
Cantidad de intervención:	216 soluciones de vivienda nueva
Avance Físico:	0,00%
Avance financiero:	0,00%
Fecha de Suscripción:	10/10/2017
Fecha de Inicio:	10/10/2017
Fecha de finalización:	17/10/2022

Estado Actual:

El convenio marco se encuentra finalizado.

- Se realizó un proceso de convocatoria pública, con el fin de contratar la obra, el cual fue declarado desierto.
- Por directriz del Banco Agrario de Colombia, se adelanta la liquidación del Convenio Marco No. 9677-PPAL001-668-2017, del cual se deriva el proyecto.
- Las gestiones administrativas se encuentran aplazadas hasta tanto se liquide el convenio actual y se genere uno nuevo.

Proyecto Mocoa Disperso (36 Viviendas)

Convenio:	9677-PPAL001-668-2017
Objeto:	<i>Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar y ejecutar rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de viviendas rurales en los departamentos del Huila, Caldas, Nariño y Putumayo, en el marco de las declaratorias de situación de calamidad pública.</i>
Entidades:	Banco Agrario de Colombia - BAC Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FNGRD
Inversión para Mocoa:	Obra: \$2.367.193.692,48 Interventoría: \$240.667.980,00 Total: \$2.607.861.672,48
Beneficiarios:	36 familias
Tipo de intervención:	Vivienda Nueva
Cantidad de intervención:	36 soluciones de vivienda nueva



Convenio:	9677-PPAL001-668-2017
Avance Físico:	33,33%
Avance financiero:	33,33%
Fecha de Suscripción:	10/10/2017
Fecha de Inicio:	10/10/2017
Fecha de finalización:	17/10/2022

Estado Actual:

El convenio marco se encuentra finalizado.

- ❖ Durante el tiempo de ejecución del contrato de obra, el contratista ejecutó 12 de las 36 soluciones de vivienda.
- ❖ El contratista argumentó inconvenientes en consecución y transporte de materiales a causa de la ola invernal. Asimismo, demoras de los beneficiarios en la adecuación de los predios para poder iniciar la ejecución de las obras y finalmente, problemas de orden público.
- ❖ Por directriz del Banco Agrario de Colombia, se adelanta la liquidación del Convenio Marco No. 9677-PPAL001-668-2017, del cual se deriva el proyecto.
- ❖ Las gestiones administrativas se encuentran aplazadas hasta tanto se liquide el convenio actual y se genere uno nuevo.

■ Contratación derivada:

Contrato de Obra No.:	9677-PPAL001-1737-2021
Objeto:	<i>Realizar los estudios, diseños, construcción de soluciones de vivienda de interés social rural dispersas en sitio propio en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, de conformidad con las especificaciones establecidas en el estudio previo y su anexo técnico en el desarrollo del Convenio 9677-PPAL001-668-2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora S.A. y el Banco Agrario de Colombia.</i>
Contratista:	CONSORCIO OTES MOCOA 1
Valor Inicial:	\$2.367.193.692,48
Plazo Inicial:	8 meses
Fecha de Suscripción:	15 de diciembre de 2021
Fecha de Inicio:	26 de enero de 2022
Novedades:	<ul style="list-style-type: none"> ● Otrosí No. 1: Modificación contractual. ● Suspensión No. 1: Por 1 mes, hasta 11 de octubre de 2022. ● Suspensión No. 2: Por 1 mes, hasta 11 de noviembre de 2022.

Contrato de Obra No.:	9677-PPAL001-1737-2021
	<ul style="list-style-type: none"> Otrosí No. 2: Prórroga por 4 meses hasta 25 de marzo de 2023.
Fecha de Terminación Actualizada:	25 de marzo de 2023
Valor Final:	\$2.367.193.692,48

Contrato de Interventoría No.	9677-PPAL001-1843-2021
Objeto:	<i>Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato que tiene por objeto los estudios, diseños, construcción de soluciones de vivienda de interés social rural dispersas en sitio propio en el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo, de conformidad con las especificaciones establecidas en el estudio previo y su anexo técnico en el desarrollo del Convenio 9677-PPAL001-668-2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora S.A. y el Banco Agrario de Colombia.</i>
Contratista:	CONSORCIO APOYOS 2022
Valor Inicial:	\$240.667.980,00
Plazo Inicial:	8 meses
Fecha de Suscripción:	29 de diciembre de 2021
Fecha de Inicio:	26 de enero de 2022
Fecha de Terminación Inicial:	25 de septiembre de 2022
Novedades:	<ul style="list-style-type: none"> Suspensión No. 1: Por 1 mes, hasta 11 de octubre de 2022. Suspensión No. 2: Por 1 mes, hasta 11 de noviembre de 2022. Otrosí No. 2: Prórroga por 4 meses hasta 25 de marzo de 2023.
Fecha de Terminación Actualizada:	25 de marzo de 2023
Valor Final:	Valor Inicial: \$240.667.980,00

“6. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de estudios, diseños y construcción de la nueva Plaza de Mercado? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?”

Para la ejecución de la actividad del PAE denominada: “CONSTRUCCIÓN DEFINITIVA DE LA PLAZA DE MERCADO”, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-812-2017:



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
Número del convenio:	9677-PPAL001-812-2017
Objeto	El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (PROSPERIDAD SOCIAL) se comprometen, a: "Articular esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del Proyecto Plaza de Mercado del municipio de Mocoa, en el departamento del Putumayo.
Valor Inicial	Aporte de \$6.000.000.000 por parte de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Valor Final	Aporte de \$6.000.000.000 por parte de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Contratista	Al tratarse de un Convenio Interadministrativo no hay contratista sino entidades que concurren aunando esfuerzos para el cumplimiento del objeto: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Plazo	Treinta (30) meses
Fecha de Inicio	14 de diciembre de 2017
Fecha de Liquidación o terminación	13 de junio de 2020
Estado actual	Finalizado por expiración de plazo

El FNGRD en cumplimiento de la cláusula cuarta numeral 1 del convenio realizó la adquisición por vía de expropiación administrativa del predio con escritura pública número 502 de 2018 y matrícula inmobiliaria número 440-48513 a la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTAMONICA por un valor de Cuatrocientos Millones de Pesos M/Cte. (\$400.000.000), con un área de 2 hectáreas.

El valor inicial del convenio interadministrativo suscrito con el Departamento de Prosperidad Social fue de Seis Mil Millones de Pesos M/Cte. (\$6.000.000.000), los cuales estarían destinados a la construcción de la Plaza de Mercado. Dicho valor fue el presupuesto estimado en el Capítulo de Desarrollo Económico, Línea de Intervención Infraestructura Económica para la actividad de "Construcción definitiva de la Plaza de Mercado", cuyo responsable sería Prosperidad Social - DPS.

En cuanto a la contratación derivada del Convenio, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres suscribió los siguientes contratos:



CONTRATO	
Número del contrato:	9677-PPAL001-255-2018
Objeto	Realizar los estudios y diseños, así como la construcción de las obras complementarias de la plaza de mercado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, adelantados en el marco de lo declaratorio de calamidad pública No.056 prorrogado por el Decreto 772 del Municipio de Mocoa y 068 prorrogado por el Decreto 247 de 2017 del Departamento del Putumayo, declaratorio de situación de desastre en el municipio de Mocoa No.599 de 2017 prorrogado mediante Decreto No. 606 de 2018 y en el marco del desarrollo del convenio 9677-PPAL0011-812-2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A., y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS-, y conforme con el Anexo técnico Especificaciones técnicas Plaza de Mercado.
Valor Inicial	\$1.687.684.080
Valor Final	\$1.687.684.080
Contratista	TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S., representado legalmente por ALEXIS JAVIER MAYORGA.
Plazo	Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Prorroga de 12 meses y 45 días
Fecha de Inicio	28 de junio de 2018
Fecha de Liquidación o terminación	12 de febrero de 2020
Estado actual	Finalizado con acta de entrega y recibo final
Valor ejecutado	\$1.210.804.103,00

CONTRATO	
Número del convenio o contrato:	9677-PPAL001-301-2018
Objeto	Realizar la Interventoría integral (técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental, social y jurídica) al contrato de obra 9677-PPAL001- 255-2018, que tiene por objeto: "Realizar los estudios y diseños, así como la construcción de las obras complementarias de lo plaza de mercado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, adelantados en el marco de lo declaratorio de calamidad pública No.056 prorrogado por el Decreto 772 del Municipio de Mocoa y 068 prorrogado por el Decreto 247 de 2017 del Departamento del Putumayo, declaratorio de situación de desastre en el municipio de Mocoa No.599 de 2017 prorrogado mediante Decreto No. 606 de 2018 y en el marco del desarrollo del convenio 9677-PPAL0011- 812-2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora S.A., y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS-, y conforme con el Anexo técnico Especificaciones técnicas Plaza de Mercado.



CONTRATO	
Número del convenio o contrato:	9677-PPAL001-301-2018
Valor Inicial	\$228.409.063
Valor Final	\$311.009.478
Contratista	UNIÓN TEMPORAL ROCA - VILLÁN, representado legalmente por LUIS HERNANDO RONDÓN RAMÓN.
Plazo	Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Prorroga de 12 meses y 45 días
Fecha de Inicio	28 de junio de 2018
Fecha de Liquidación o terminación	12 de febrero de 2020
Estado actual	Finalizado con informe final
Valor ejecutado	\$311.009.478

Conforme el acta de recibo final de fecha 29 de junio de 2020, el estado de ejecución del contrato es el siguiente:

“ETAPA 1:

ESTUDIOS Y DISEÑOS: Se realiza el diseño de la nueva plaza de mercado del municipio de Mocoa el cual se implanta en el terreno disponible para la reubicación de la plaza de mercado actual; para lo cual se hizo entrega a la entidad contratante de los siguientes volúmenes:

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA GALERÍA:

HITO 1:

- VOLUMEN I – RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%

HITO 2:

- VOLUMEN II – TOPOGRAFÍA. (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN III – GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA, HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA. (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN IV – DISEÑO ARQUITECTÓNICO. (Radicado No. 2019ER10041 de fecha 11 de septiembre de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN V – DISEÑO ESTRUCTURAL. (Radicado No. 2019ER11562 de fecha 21 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%



- VOLUMEN VI – DISEÑO VÍAS. (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN VII – DISEÑO ELÉCTRICO. (Radicado No. 2019ER11375 de fecha 15 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN VIII – DISEÑO HIDROSANITARIO. (Radicado No. 2019ER12063 de fecha 01 de noviembre de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN IX – DISEÑO RED DE SUMINISTRO DE GAS. (Radicado No. 2019ER11376 de fecha 15 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN X – ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE OBRA, PRESUPUESTO DE OBRA Y APUS. (Radicado No. 2019ER11825 de fecha 28 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN XI – ESTUDIO AMBIENTAL – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019 Y Radicado No. 2019ER09688 de fecha 03 de SEPTIEMBRE de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN XII – CERTIFICADO DE FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO. (Radicado No. 2019ER09687 de fecha 03 de septiembre de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN XIII – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Radicado No. 2019ER11378 de fecha 15 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN XIV – INFORME FINAL. - EJECUTADO AL 100%

- VOLUMEN XV – LICENCIAS Y PERMISOS APROBADOS. (NOTA 1: Se hizo entrega del permiso de vertimientos emitido por CORPOAMAZONIA, del permiso para la acometida de la red eléctrica hasta el sitio emitido por la Empresa de Energía del Putumayo, del permiso de intervención de la vía terciaria emitida por PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MOCOYA. NOTA 2: Por causas ajenas a los intervinientes del proceso contractual: a) el permiso de INVIAS no fue posible tramitarlo dado que esta entidad exigía un alcance de obra por fuera de los estándares presupuestales del proyecto, b) la Licencia de construcción requerida ante el municipio de MOCOYA no fue emitida a pesar del cumplimiento a cada uno de los requerimientos exigidos por ésta entidad. - EJECUTADO AL 100% DE ACUERDO AL ALCANCE ESTABLECIDO POR LA SUPERVISIÓN.

ETAPA 2:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS:

- COMPONENTE I - PROLONGACIÓN DE LA RED EXISTENTE DE ACUEDUCTO HASTA SITIO DE PROYECTO: Consistió en la construcción de la red de acueducto desde el punto de conexión frente a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY PLACIDO hasta el sitio del proyecto en una longitud de 758.10m en tubería presión PVC unión mecánica D=3", construcción de un paso elevado, instalación de 4 válvulas ventosas, instalación de 4 válvulas de purga, instalación de 1 hidrante,



excavaciones y rellenos con material de sitio y material seleccionado, instalación de colchón de arena y retiro de escombros provenientes de las excavaciones.

- **COMPONENTE II: SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO:** Consistió en la construcción de la red de alcantarillado sanitario en tubería NOVAFORT D=8" en una longitud de 171.07m, la construcción de 4 cámaras de inspección entre 2m y 4m altura en diámetros de 1.2m, llegando hasta el punto de conexión de la PTAR según diseño, adicionalmente se realizó la adecuación del terreno hasta niveles arquitectónicos mediante excavaciones mecánicas, se realizó la instalación de rellenos con material del sitio, instalación de colchón de arena y retiro de material sobrante.

- **COMPONENTE III: SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL:** Consistió en la construcción de la red de alcantarillado pluvial en tubería NOVAFORT D=12" en una longitud de 99.84m, NOVAFORT D=18" en una longitud de 18.99m, NOVAFORT D=27" en una longitud de 36.52m, NOVAFORT D=30" en una longitud de 96.50m; la construcción de 5 cámaras de inspección entre 2m y 5m en diámetros de 1.2m y 1.5m; la construcción de un cabezal de descarga con disipador hasta el punto de entrega de la fuente hídrica aldaña al sitio del proyecto por el costado SUR, adicionalmente se realizó la adecuación del terreno hasta niveles arquitectónicos mediante excavaciones mecánicas, se realizó la instalación de rellenos con material del sitio, instalación de colchón de arena y retiro de material sobrante.

- **COMPONENTE IV: ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO:** Consistió en la construcción de la red de media y baja tensión y alumbrado público al servicio del proyecto y la instalación de la red provisional eléctrica según diseños.

- **COMPONENTE V: CONFORMACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍA ALTERNA** (placa en concreto, bordillos y andenes): Consistió en la estabilización de la rasante de la vía alterna y bahías; con pedraplen, subbase y base granular estabilizada e imprimada con emulsión RF-1 en una longitud de 115 m por 10 m de ancho.

- **COMPONENTE VI: PLACA EN CONCRETO Y CORREDOR PEATONAL** (anden): Consistió en la construcción de andenes, entrada peatona al margen izquierdo de la vía alterna de acceso en una longitud aproximada de 48 m, para esta actividad se hizo necesaria la conformación del talud aldaño".

Como resultado de los estudios y diseños contratados por el FNGRD mediante contrato 9677-PPAL001-255-2018, se señaló que el presupuesto requerido para la construcción de la plaza de mercado sería por un valor de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE (\$18.976.637.030), es decir, más de un 68% de lo inicialmente estimado y del presupuesto aportado por el DPS.

En razón a esto y como gestión de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD-, en aras de cumplir con el objeto del convenio y sobre todo por el beneficio de la comunidad de Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo en general y la reactivación económica se remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante radicados del MHCP 1-2021-030179, 1-2021-064109 y 1-2021-085497 la solicitud de recursos



con el fin de contar con el cierre financiero de este proyecto, a los cuales el Ministerio respondió de la siguiente forma:

“(…)

... Es de anotar, que una articulación interinstitucional, es de vital importancia para el Plan de Reconstrucción de Mocoa, teniendo en cuenta la diversidad de proyectos, ya que no solo se deben financiar obras de mitigación retención y estabilización, además se solicitan recursos para la ejecución de proyectos de vivienda urbana y rural, megacolegio y plaza de mercado, sumado a estos proyectos, también en la solicitud se incluyen costos equivalentes al 5.25% (\$14.590.491.818) de los recursos solicitados por concepto de: Costos Estructurales UNGRD.

Por lo anterior, en el desarrollo de una gestión interinstitucional, con entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que cuenta con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entre otras, en el presupuesto de cada una de ellas consideren estas necesidades a través de proyectos de inversión, que surta los trámites pertinentes de registro en las herramientas tecnológicas del SUIFP y SPI del Departamento Nacional de Planeación –DNP, con el propósito de viabilizar y financiar proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura, esto según corresponda a la misión sectorial de cada entidad.

Igualmente, es importante señalar que, mediante el Decreto No.1805 del 31 de diciembre de 2020, se le asignaron a la UNGRD en el rubro de Atención de Desastres y Emergencias en el Territorio Nacional – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres una apropiación de \$304.722 millones con recurso 10, para la vigencia fiscal 2021.

Así mismo, ante la situación que se ha presentado por la presencia del coronavirus en el territorio colombiano, el gobierno nacional ha tenido que priorizar los recursos del Presupuesto General de la Nación para hacer frente a la situación de crisis. De acuerdo con lo anterior y revisado el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de indicar que en la actualidad no existe apropiación presupuestal disponible que permita atender favorablemente los requerimientos de su entidad...”

Mediante Resolución 3449 del 28 de diciembre de 2021 expedida por el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizó asignación de presupuesto al FNGRD por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$333.042.560.274), asignados para la construcción de obras de mitigación y reducción de riesgos a nivel nacional, en los cuales se encuentran los proyectos derivados del plan de reconstrucción Mocoa que requieren cierre financiero para finalización de obras, con una asignación de presupuesto por valor de TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$310.861.589.863).

Con la asignación efectuada, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en su calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, el 01 de julio de 2022 designó un comité estructurador de conformidad con la



normatividad vigente y el manual de contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD para la celebración de un Convenio Interadministrativo con fundamento en el artículo 95 la Ley 489 de 1998, con el objeto de adelantar la construcción de la plaza de mercado en el Municipio de Mocoa Putumayo.

Fue así como el 15 de julio de 2022, se suscribió con el municipio de Mocoa, el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-1103-2022, a través del cual las entidades aúnan esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para adelantar la construcción de la plaza de mercado en el Municipio de Mocoa Putumayo.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
Número del convenio o contrato	9677-PPAL001-1103-2022
Objeto	“AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SNGRD”.
Valor Inicial	Aporte de \$21.375.332.244,29 por parte de FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Aporte de predio identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 440-48513 ubicado en la Vereda el Diviso del Municipio de Mocoa, con un área de dos (2) hectáreas por valor de \$400.000.000.
Valor Final	21.375.332.244,29.
Contratista	Al tratarse de un Convenio Interadministrativo no hay contratista sino entidades que concurren aunando esfuerzos para el cumplimiento del objeto: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) Y EL MUNICIPIO DE MOCOA
Plazo	Veinticuatro (24) meses
Fecha de Inicio	A la fecha no se ha suscrito acta de inicio
Fecha de Liquidación o terminación	A la fecha no se ha suscrito acta de inicio
Estado actual	Suscrito el 15 de julio de 2022.
Valor ejecutado	\$0.

Ahora bien, en desarrollo de las mesas de trabajo que se vienen adelantando en el municipio de Mocoa, en el marco del “*Pacto por la reconstrucción de Mocoa*”, en las cuales participan entidades Públicas, autoridades de control, veedurías ciudadanas y la comunidad en general, en sesión del 27 de febrero de 2023 fueron socializados los siguientes compromisos con respecto al proyecto construcción de la plaza de mercado:



“Para la Plaza de mercado, la UNGRD informa que se constituirá un fondo de Inversión (FIC) con la alcaldía municipal, para que sea el ente territorial quien realice el proceso de contratación para la construcción de la Plaza de Mercado, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías”.

“7. ¿Cuál es el estado actual del proyecto para la construcción del Megacolegio de Mocoa? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?”.

Convenio:	9677-PPAL001-512-2017 (FNGRD) 1303-2017 (MEN)
Objeto:	<i>Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD y el Ministerio de Educación Nacional - MEN, para adelantar los estudios, diseños, construcción y dotación de la infraestructura educativa de carácter oficial en el marco de las Declaratorias de situación de Calamidad Pública Municipal y Departamental, mediante los Decretos 0056 del 01 de abril de 2017 y 0068 de 2017, respectivamente.</i>
Entidades:	Ministerio de Educación Nacional - MEN Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FNGRD
Inversión:	\$19.255.065.328,00
Beneficiarios:	1.200 Estudiantes
Tipo de intervención:	Infraestructura Educativa
Cantidad de intervención:	Una infraestructura educativa y su mobiliario, compuesta de las siguientes áreas: Bloques administrativo, de preescolar, primaria y bachillerato, laboratorios, comedor, portería, biblioteca, rampas y tanque de almacenamiento, completamente funcional.
Avance Físico:	100,00%
Avance financiero:	68,39%
Fecha de finalización:	07/04/2023
Estado:	Terminado

■ **Contratación derivada:**

Contrato de Obra No.	9677-PPAL001-225-2018
Objeto:	<i>El contratista se obliga para con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FONDO a realizar la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DETALLADOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER OFICIAL, EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, acorde a los estudios previos, pliegos, anexos, oferta presentada por el contratista y demás documentos que hacen parte integral del contrato.</i>



Contrato de Obra No.	9677-PPAL001-225-2018
Contratista:	CONSORCIO COLEGIO MOCOA
Valor Inicial:	\$8.500.000.000,00
Plazo Inicial:	11 meses:
Fecha de Suscripción:	25 de abril de 2018
Fecha de Inicio:	13 de noviembre de 2018
Fecha de Terminación Inicial:	12 de octubre de 2019
Novedades:	<ul style="list-style-type: none"> ● Otrosí No. 1: Prórroga por 8 meses, hasta 12 de junio de 2020 ● Suspensión No. 1: Por 3 meses, hasta 2 de abril de 2020. ● Suspensión No. 2: Por 3 meses, hasta 2 de julio de 2020. ● Otrosí No. 2: Adición por \$1.962.078.032,00 y Prórroga por 6 meses hasta 10 de junio de 2021. ● Suspensión No. 3: Por 1 mes, hasta 11 de junio de 2021. ● Suspensión No. 4: Por 2 meses, hasta 11 de agosto de 2021. ● Otrosí No. 3: Prórroga por 3 meses, hasta 30 de octubre de 2021. ● Suspensión No. 5: Por 2 meses, hasta el 19 de diciembre de 2021. ● Otrosí No. 4: Adición por \$6.714.662.434,00 y Prórroga por 6 meses hasta 30 de junio de 2022. ● Suspensión No. 6: Por 1 mes, hasta 22 de julio de 2022. ● Suspensión No. 7: Por 8 días, hasta 29 de julio de 2022. ● Suspensión No. 8: Por 1 mes, hasta el 3 de septiembre de 2022. ● Otrosí No. 5: Adición por \$700.000.000,00 y Prórroga por 3 meses hasta el 7 de diciembre de 2022. ● Otrosí No. 6: Prórroga por 1 mes, hasta el 7 de enero de 2023.
Fecha de finalización luego de suspensiones y otrosíes:	7 de enero de 2023
Valor Final:	\$17.876.740.466,00


Contrato de Interventoría No.	9677-PPAL001-228-2018
Objeto:	<i>Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para la elaboración de estudios, diseños detallados, construcción y dotación de una nueva institución educativa de carácter oficial, en el municipio de Mocoa - departamento de Putumayo.</i>
Contratista:	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
Valor Inicial:	\$594.930.980,00
Plazo Inicial:	11 meses
Fecha de Suscripción:	27 de abril de 2018


Contrato de Interventoría No.	9677-PPAL001-228-2018
Fecha de Inicio:	13 de noviembre de 2018
Fecha de Terminación Inicial:	13 de octubre de 2019
Novedades:	<ul style="list-style-type: none"> ● Otrosí No. 1: Prórroga por 8 meses, hasta 12 de junio de 2020 ● Suspensión No. 1: Por 3 meses, hasta 1 de abril de 2020. ● Suspensión No. 2: Por 3 meses, hasta 1 de julio de 2020. ● Otrosí No. 2: Adición por \$137.329.530,00 y Prórroga por 6 meses hasta 10 de junio de 2021. ● Suspensión No. 3: Por 1 mes, hasta 11 de junio de 2021. ● Suspensión No. 4: Por 2 meses, hasta 11 de agosto de 2021. ● Otrosí No. 3: Adición por \$74.156.040,00 y Prórroga por 3 meses, hasta 30 de octubre de 2021. ● Suspensión No. 5: Por 2 meses, hasta el 19 de diciembre de 2021. ● Otrosí No. 4: Adición por \$469.315.420,00 y Prórroga por 6 meses hasta 30 de junio de 2022. ● Suspensión No. 6: Por 1 mes, hasta 21 de julio de 2022. ● Suspensión No. 7: Por 8 días, hasta 29 de julio de 2022. ● Suspensión No. 8: Por 1 mes, hasta el 3 de septiembre de 2022. ● Otrosí No. 5: Adición por \$102.523.872,00 y Prórroga por 3 meses hasta el 7 de diciembre de 2022. ● Otrosí No. 6: Prórroga por 1 mes, hasta el 7 de enero de 2023.
Fecha de finalización luego de suspensiones y otrosíes:	7 de enero de 2023
Valor Final:	\$1.378.255.842,00

Estado Actual:

La infraestructura se encuentra terminada y dotada al 100%.



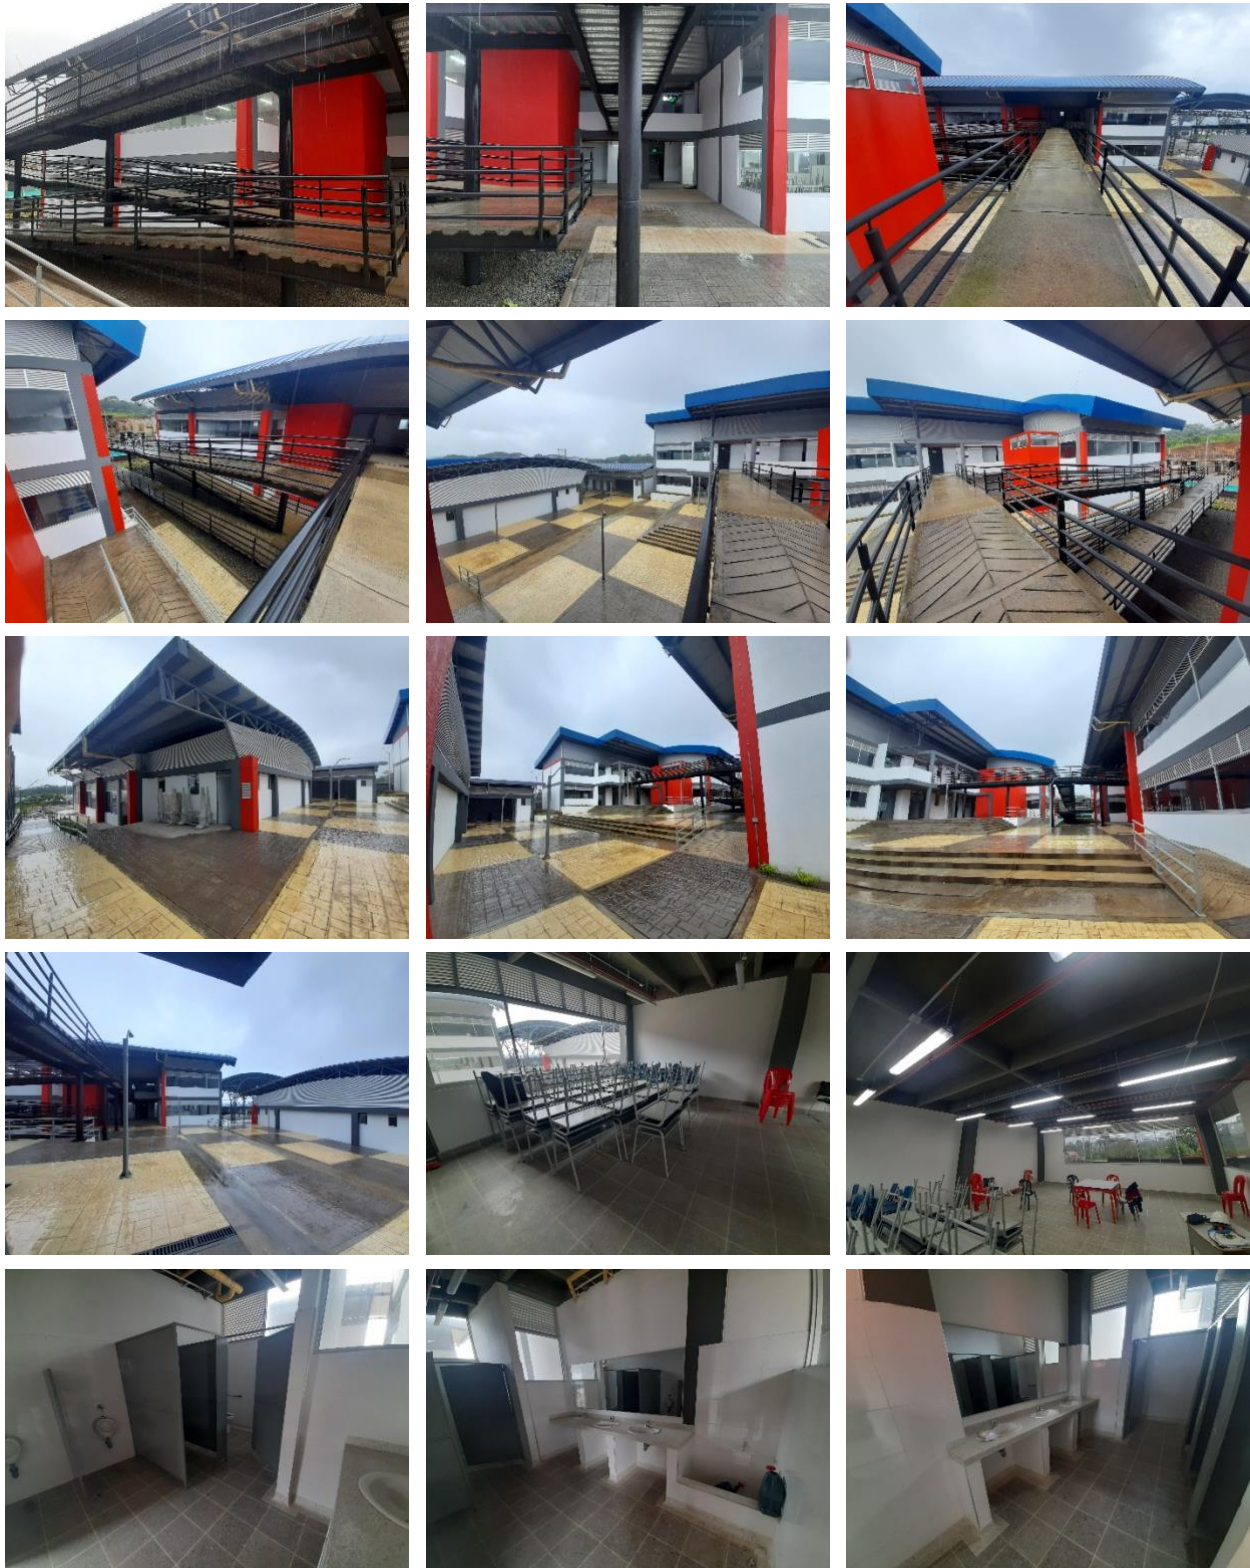

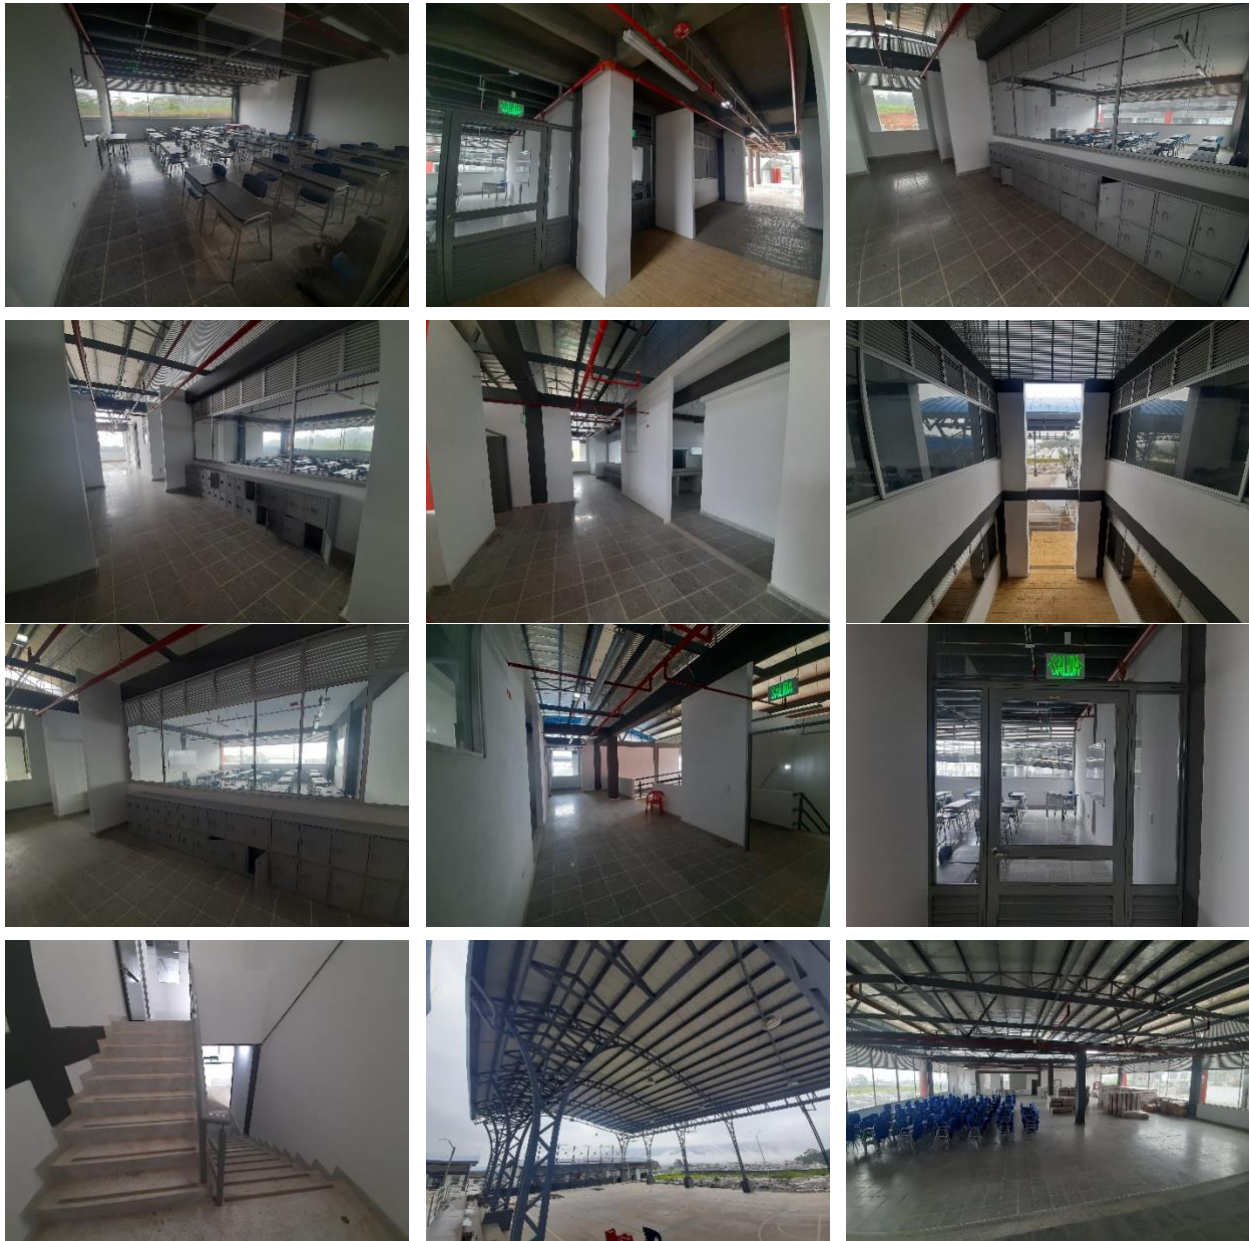

Fotografías 1 a 30. Estado de la obra. Fecha: 28/02/2023

Actividades pendientes:

- Realizar la conexión definitiva a la red de alcantarillado, actividad supeditada a que el contratista encargado de la ejecución del proyecto de vivienda Sauces II finalice un tramo de 120 metros lineales, incluido dentro de su contrato. Se aclara que el megacolegio actualmente se encuentra provisionalmente unido a la red, sin embargo el diámetro de entrega es mayor al de recibo, lo que podría afectar la integridad del sistema, al poner en funcionamiento la unidad educativa.



- A pesar de que el contratista gestionó las respectivas acometidas a nombre de la unidad educativa, se encuentra pendiente la instalación del medidor del servicio de acueducto, por parte del prestador del servicio.

“8. ¿Cuál es el estado actual del proyecto para la reconstrucción del Sistema de Acueducto de Mocoa? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?”

Atendiendo las líneas de acción estratégicas, que comprenden varios sectores administrativos, para su implementación y ejecución concurren varias entidades públicas que atendiendo sus capacidades y competencias participan en el desarrollo del Plan de Acción Específico, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 1523 de 2012.

El proyecto relativo a la “RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO”, que hace parte de la línea “5.3 INFRAESTRUCTURA AGUA, ENERGIA Y GAS”, se encuentra a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dada su misionalidad, funciones y competencias.

Por lo anterior, mediante oficio No. 2023EE03481 del 30 de marzo de 2023, se trasladó por competencia a dicha cartera ministerial este punto de la proposición, para su atención y respuesta directamente a la Mesa Directiva. (Se adjunta oficio).

“9. ¿Cuál es el estado actual del proyecto para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario y Carcelario? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?”

El proyecto concerniente a la construcción del “Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional -ERON de Mocoa”, no fue incluido en el Plan de Acción Específico -PAE, emitido por el Municipio.

A través del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES N° 3904¹, del 31 de octubre de 2017, se emitió concepto en el que se presenta el listado completo de proyectos por cada una de las líneas de acción estratégicas en el que se incluye la reubicación y construcción del establecimiento carcelario del municipio, así:

Desarrollo Institucional	Infraestructura y dotaciones institucionales	Construcción de una nueva morgue en Mocoa	Inst. Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	3.500
		Construcción del Centro Administrativo	Ministerio del Interior	12.000
		Construcción de la Casa de Justicia	Ministerio de Justicia y del Derecho	3.500
		Reubicación y reconstrucción del establecimiento carcelario	USPEC	100.961
		Sub-total		119.961

Dentro de los compromisos adquiridos por la UNGRD, en el taller construyendo País, desarrollado el 10 de mayo del 2019, ante el presidente de la República y la comunidad de Mocoa, se

¹ CONPES 3904: Plan para la reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022, concepto favorable a la nación para contratar un empréstito externo hasta por la suma de USD 30 millones, o su equivalente en otras monedas, para financiar la implementación del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I), y declaración de importancia estratégica del plan maestro de alcantarillado del municipio de Mocoa (Fase I).

encuentra la compra o adquisición del predio para el desarrollo del proyecto de construcción de un nuevo centro carcelario.

En virtud el principio de colaboración y cooperación que rige a las entidades del orden público, mediante oficio con radicado No. 2020EE01538 del 24 de febrero de 2020, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, manifestó al Municipio de Mocoa su interés y compromiso de contribuir con el trámite de adquisición del predio requerido para el desarrollo del proyecto de construcción del establecimiento penitenciario y carcelario en el Municipio de Mocoa, a cargo de la USPEC, siempre y cuando, este espacio cumpliera con las especificaciones y lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC, en el marco de lo establecido en la Ley 1709 del 20 de enero de 2014 y el “Manual de diseño de infraestructura penitenciaria y carcelaria”, expedido por la USPEC. Esta normativa reúne el reglamento técnico, parámetros y lineamientos mínimos exigidos en los procesos constructivos y de diseño que ejecuta esa Unidad, para la formulación y estructuración de proyectos, cumpliendo con los requerimientos legislativos nacionales de la infraestructura penitenciaria y carcelaria del orden nacional.

En el marco de lo establecido en la línea de acción estratégica del CONPES No. 3904, el 26 de agosto de 2021, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-1292-2021, entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, el Municipio de Mocoa y La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD en calidad de Ordenadora del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD, con el objeto de: *“Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para adelantar el proceso de adquisición del predio destinado a la construcción de un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional - ERON- en el municipio de Mocoa, Putumayo, en cumplimiento de los objetivos del SNGRD”*.

En virtud al referido Convenio, se estableció como compromiso del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC la adquisición del predio destinado para la construcción del Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional, mediante cesión a título gratuito efectuado por el Municipio de Mocoa.

La UNGRD se comprometió a aportar los recursos económicos para la adquisición del predio autorizado por las autoridades en el tema (USPEC – INPEC), para ello la UNGRD-FNGRD realizo convenio entre las partes interesadas (Alcaldía Mocoa – UNGRD – USPEC – INPEC).

Todos los trámites que se requerían surtir por parte de la UNGRD-FNGRD ya fueron cumplidos; El valor del convenio es de \$1.310.921.000,00 recursos disponibles a través del FIC No. 001001031616.

Sin embargo, en reunión de seguimiento llevada a cabo el 07 de junio de 2022, INPEC y USPEC manifestaron al Municipio de Mocoa, que no consideran viable la continuidad del convenio, puesto que, pasados casi 8 meses de ejecución, aún no se observaban avances en el proceso de adquisición por parte de la Alcaldía, así como quedaron las obligaciones en el convenio. El día 10 de junio del 2022, USPEC envió a los integrantes del convenio el oficio No. E-2022-013907, comunicando que no viabiliza la prórroga solicitada por el Municipio, y sugiriendo, la liquidación del convenio. Por su parte INPEC el 17 de junio del 2002 se pronuncia mediante oficio



2022EE0104234 sobre la no procedencia de la prórroga solicitada por el municipio. Por lo tanto, se iniciaron los trámites para la liquidación del convenio interadministrativo sin ser posible la compra del predio.

Actualmente está en proceso de liquidación del convenio y a la espera que la Alcaldía Municipal haga la postulación de un nuevo predio aprobado por las autoridades en el tema carcelario y con ello iniciar el proceso de elaborar un nuevo convenio para la compra del predio y con ello poder entregarlo al INPEC y USPEC para que ellos inicien el trámite de estudios y diseños y consecución de recursos para ello hasta la construcción del nuevo ERON

Convenio:	9677-PPAL001-1292-2021
Contratos Derivados:	FIC: 001001031616
Inversión:	1.310.921.000,00
Beneficiarios:	341.513 Habitantes
Tipo de intervención:	FNGRD
Cantidad de intervención:	1
Avance Físico:	100 %
Avance financiero:	100 %
Fecha de finalización:	18/06/2022
Estado:	<p>La UNGRD cumplió con su compromiso de financiación al 100% Traslado con FIC.</p> <p>En proceso de liquidación del convenio por solicitud del INPEC y USPEC, sin haber comprado el predio por parte de la Alcaldía Mocoa.</p>

El plazo establecido para el convenio donde el objeto es comprar el predio para posterior entrega al INPEC y USPEC se estableció en 8 meses, plazo que culminó sin que la Alcaldía procediera a la compra del predio con los recursos entregados por la UNGRD mediante el FIC 001001031616.

Por lo anterior, mediante oficio No. 2023EE03482 del 30 de marzo de 2023, se trasladó por competencia al USPEC este punto de la proposición, para su atención y respuesta directamente a la Mesa Directiva. (Se anexa oficio).

“10. ¿Cuál es el estado actual del proyecto para la construcción, dotación y puesta en funcionamiento del nuevo Hospital José María Hernández? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?”



Atendiendo las líneas de acción estratégicas, que comprenden varios sectores administrativos, para su implementación y ejecución concurren varias entidades públicas que atendiendo sus capacidades y competencias participan en el desarrollo del Plan de Acción Específico, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 1523 de 2012.

El Plan de Acción Específico del proceso de Reconstrucción de Mocoa, contempló entre sus actividades atendiendo la línea 5.4 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, las relativa a 5.4.1 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TERCER NIVEL- JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, y 5.4.2 DOTACIÓN HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ, el cual se encuentra a cargo de la Gobernación de Putumayo.

Por lo anterior, mediante comunicación 2023EE03480 del 30 de marzo de 2023, se trasladó por competencia a la gobernación de Putumayo este punto de la proposición, para su atención y respuesta directamente a la Mesa Directiva. (Se anexa oficio).

“11. ¿La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha ejecutado acciones que tengan como finalidad acelerar el cumplimiento del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del municipio de Mocoa? En caso de que la respuesta sea afirmativa, enuncie y explique dichas acciones”.

En atención a que las actividades del Plan de Acción Específico de Mocoa que se encuentran a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ejecutan a través de convenios y contratos de obra e interventoría; el cumplimiento de dichas actividades depende de los plazos de ejecución pactados en los referidos contratos. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como contratante lleva a cabo labores de seguimiento, control y vigilancia a la ejecución de los proyectos a su cargo, con el fin de que se cumplan los términos contractuales.

“12. ¿Cuál es la cantidad de recursos que se han invertido en la ejecución y/o implementación del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del municipio de Mocoa?”

Según la matriz de seguimiento de la oficina de Mocoa se tiene una inversión total de \$ 1.302.898 Millones (1,30 billones), representados en proyectos finalizados por la UNGRD, proyectos finalizados por otros sectores (Ministerios), Ayudas humanitarias y proyectos en ejecución.

“13. ¿Recientemente se ha realizado algún estudio o emitido concepto sobre el riesgo de desastre actual en el municipio de Mocoa? En caso de respuesta afirmativa, favor remitir el estudio o concepto”.

Se realizó traslado por competencia a la Alcaldía de Mocoa mediante comunicación externa 2023EE03397. (Se adjunta anexo).



“14. ¿Qué medidas correctivas ha tomado la UNGRD frente a las Actuaciones Especiales de Fiscalización realizadas por la Contraloría General de la República, en las que se han determinado hallazgos con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales en las obras de reconstrucción de Mocoa?”

Mediante oficio No. 2022EE0031288 del 25 de febrero de 2022, el Contralor General de la República comunicó a esta Unidad Administrativa pronunciamiento de ADVERTENCIA COMO GESTOR FISCAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD) y del FONDO NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) por los riesgos de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa a los intereses públicos identificados por la Contraloría General de la Republica por la situación del Programa de reconstrucción de Mocoa.

Con fundamento en lo anterior, el organismo de control observa la configuración de riesgo de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa a los intereses públicos, en razón a que a la fecha no se han mitigado los riesgos ni se han concluido los proyectos de infraestructura; por lo cual comunica la función de advertencia para que *“con respeto en la plena autonomía y de forma pronta y adecuada, tanto la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, diseñen e implementen las acciones que consideren necesarias y suficientes para que prontamente se subsanen las no conformidades y para que se impida la materialización de los riesgos identificados”*.

En el marco de la función de advertencia, la Contraloría General de la República adelanta actuaciones especiales de fiscalización, producto de las cuales ha emitido informes que han dado lugar a la formulación de planes de mejoramiento e implementación de acciones, las cuales actualmente se encuentran en ejecución.

El plan de mejoramiento se encuentra reportado en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República.

Agradezco su atención,




DAVID VALDES CRUZ

Jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información

Anexo: Lo enunciado en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1tImDNHIB8j8RI7YViucEYNYUIYolGgKF?usp=sharing>

Elaboró: Carlos Andrés García Murcia – Contratista FNGRD / Comunicación Interna 2023IE01919
Sergio Borda – Contratista FNGRD / Comunicación Interna 2023IE01919
Sol Valencia Santander – Contratista FNGRD / Comunicación Interna 2023IE01919
Lenin Alejandro Rodríguez – Contratista FNGRD / Comunicación Interna 2023IE01919
Revisó: Diana Lorena Gómez Pérez – Contratista FNGRD / Comunicación Interna 2023IE01919
Ana Maria Morales – Contratista FNGRD 
Maria Carolina Morales – Contratista FNGRD 
Aprobó: Oscar Guyeneche Durán – Subdirector General / Comunicación Interna 2023IE01919

