

Al Contestar Cite Radicado UNGRD:



2024EE03874

Fecha: 07/03/2024

Doctora  
**AMPARO YANETH CALDERON PERDOMO**  
Secretaría Comisión Primera Constitucional  
[debatescomisionprimera@camara.gov.co](mailto:debatescomisionprimera@camara.gov.co)  
Ciudad

Doctor  
**OSCAR HERNÁN SÁNCHEZ LEÓN**  
Representante a la cámara  
Presidente Comisión Primera Constitucional  
Ciudad

Doctor  
**OSCAR RODRIGO CAMPO HURTADO**  
Representante a la cámara  
Vicepresidente Comisión Primera Constitucional  
Ciudad

**Asunto:** Actualización respuesta proposición 19 del día miércoles 22 de marzo 2023. con radicados UNGRD 2024ER06489.

Cordial saludo Honorables Representantes,

En atención a su solicitud de información relacionada en el asunto, esta Unidad Administrativa, en el marco de sus competencias procede a dar respuesta, con base en la información suministrada por las áreas misionales a cargo de las funciones relacionadas con los interrogantes planteados, por el órgano de congreso, en los siguientes términos:

**“1. ¿Cuáles fueron las líneas de acción del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del municipio de Mocoa y sus plazos de ejecución?”**

**Respuesta:** El Plan de Acción Específico - PAE del proceso de Reconstrucción de Mocoa contempla actividades que atienden seis líneas de acción estratégicas, a saber: (i) ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo; (ii) infraestructura social; (iii) conectividad e integración regional; (iv) desarrollo económico; (v) desarrollo social, y (vi) desarrollo institucional; actividades en las que concurren diversas entidades del orden nacional, seccional y local, atendiendo su misionalidad, capacidades, funciones y competencias, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, que establece:

“ARTÍCULO 61. Una vez declarada la situación de desastre o calamidad pública, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción específicos para el manejo y recuperación, siendo de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones”.

“ARTÍCULO 62. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES. En el acto administrativo que declare la situación de desastre o calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos que participarán en la ejecución del plan de acción específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a

la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades

en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan”

**“2. ¿Cuál es el estado actual de ejecución y/o implementación del Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del municipio de Mocoa?”**

**Respuesta:** se especifica que la ejecución de los recursos es la respuesta al seguimiento y evaluación del PAE MOCOA del primer semestre del 2023. realizada en el segundo semestre. y que actualmente se está realizando el seguimiento y evaluación al segundo semestre del 2023 ( hasta 31 diciembre) en el cual de las 16 sectores, respondieron seis ( Consejería Presidencial, Defensa civil colombiana, El Departamento del putumayo- Secretaría de infraestructura, Ministerio de Justicia, Ministerio de Vivienda, Prosperidad social ) se identifican en la matriz en archivo Excel la cual se anexa, identificándolas de manera resaltada en color y se está reiterando la solicitud a: Corpoamazonia, DNP, Fiscalía General de la Nación, Invias, Min Agricultura, Min Interior, Min Minas, Min Transporte, Ministerio de Salud, Municipio de Mocoa, Unidad penitenciaria y Carcelaria.

De las 99 actividades del plan se han finalizado 66 actividades y se le está haciendo seguimiento a 27 actividades que están en ejecución y reestructuración.

**“4. ¿Cuál es el estado actual de las obras de mitigación en los cauces de los ríos Mulato y Sangoyaco, así como la quebrada la Taruca y la Taruquita? ¿Cuáles eran los plazos iniciales de ejecución de estos proyectos? ¿A qué se deben los retrasos?”**

**Respuesta:** En el marco de la declaratoria de calamidad pública N° 176 del 12 de agosto de 2018, prorrogada mediante decreto N° 027 del 12 de febrero de 2019, y en desarrollo del plan de acción específico (PAE) establecido en el decreto 141 del 12 de agosto de 2019 de retorno a la normalidad del municipio de Mocoa.

La UNGRD como gerente para la reconstrucción del municipio de Mocoa, tras la avenida torrencial ocurrida en el año 2017, ha adelantado acciones para la reconstrucción del Municipio con base en el Plan de Acción Específico para la recuperación y reconstrucción – PAE.

Para el caso de obras de mitigación del riesgo por avenida torrencial, se han venido haciendo inversiones por valor de \$421.251 millones de pesos, con el fin de implementar 117 obras de infraestructura de la siguiente manera:

Para la cuenca alta, con recursos del FNGRD se ha realizado la suscripción de 22 contratos, 11 de los cuales son de obra, y 11 de interventoría, para la construcción de 33 obras de infraestructura, por valor de \$185.439 millones.

Para la cuenca Media baja, con recursos del Sistema General de Regalías, se viene ejecutando 31 contratos de obras de mitigación por valor de \$175.588 millones de pesos, con 57 intervenciones y 17 contratos para obras de vías y alcantarillado por valor de \$39.480 millones de pesos, con intervención en 24 sectores.

Para el caso de pavimentos, con recursos del Sistema General de Regalías, se ha hecho la contratación de infraestructura de pavimentos por valor de \$39.480 millones de pesos, y para obras de compensación ambiental en la cuenca media baja se han suscrito seis contratos, entre obra e interventoría por valor de \$14.732 millones de pesos

**Tabla No.1. Proyectos de Reconstrucción Mocoa – SRR**

INTERVENCIÓN	OBRA	INTERVENCIÓN	TOTAL	VALOR TOTAL CONTRATADO	ACTAS PARCIALES PAGADAS	SALDOS ANTICIPOS	% EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN FÍSICA
CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	11	11	22	\$ 185.439.764.184,00	\$ -	\$ 4.005.095.106,00	0,00%	0,00%
CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	18	13	31	\$ 175.588.879.053,08	\$ 121.185.848.341,01	\$ 4.831.150.843,63	69,02%	69,02%
PAVIMENTOS	13	4	17	\$ 39.480.435.309,00	\$ 13.577.485.727,33	\$ 2.003.120.836,18	34,39%	64,75%
COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3	3	6	\$ 14.742.676.587,00	\$ -	\$ -	0,00%	34,43%
FAJAS PARALELAS	1	1	2	\$ 5.999.422.108,00	\$ 3.555.727.299,37	\$ -	59,27%	59,27%
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>78</b>	<b>\$ 421.251.177.241,08</b>	<b>\$ 138.319.061.367,71</b>	<b>\$ 10.839.366.785,81</b>	<b>32,84%</b>	<b>45,49%</b>

Fuente: FNGRD Expedientes contractuales

Importante tener presente que se cuentan con un valor de \$10.839 millones pendientes por ser amortizados los anticipos entregados a once contratos de obra.

**Tabla No.2. Anticipos que aún no han terminado de ser amortizados.**

FUENTE DE RECURSOS	No DE CONTRATO	INTERVENCIÓN	TIPO CTO	VALOR CONTRATO (Miles)	EJECUCIÓN FÍSICA [%] FEB-2024	Valor anticipo	ACTAS PARCIALES PAGADAS	SALDO DEL ANTICIPO	SALDO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FINANCIERA REAL [%]	ESTADO ACTUAL FEB-2024
REGALÍAS	9677-PPAL001-1334-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$6.923.961.014,00	42,68%	\$1.384.792.202,80	\$2.430.150.225,02	\$649.778.281,68	\$3.834.902.507,30	35,23%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-201-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$11.323.151.784,00	57,00%	\$2.264.630.356,80	\$6.441.797.800,84	\$654.180.906,34	\$4.227.173.076,62	56,89%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1025-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$4.302.041.977,00	98,50%	\$860.408.275,40	\$2.586.993.073,56	\$36.876.076,81	\$1.618.272.235,63	60,13%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-980-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$5.707.960.037,72	34,68%	\$1.142.139.898,00	\$1.281.549.242,00	\$621.732.557,50	\$3.604.688.238,22	22,45%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1342-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$8.307.462.026,81	16,00%	\$1.661.492.405,36	\$0,00	\$1.661.492.405,36	\$6.645.969.621,45	0,00%	EN EJECUCIÓN
REGALÍAS	9677-PPAL001-636-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$7.838.331.959,00	50,65%	\$1.567.666.394,00	\$3.355.893.389,55	\$350.898.377,14	\$3.921.540.202,31	42,81%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1330-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$1.930.861.194,00	60,50%	\$386.172.238,80	\$0,00	\$386.172.238,80	\$1.544.688.955,20	0,00%	POST CONTRACTUAL
FNGRD	9677-PPAL001-864-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$20.025.475.533,00	0,00%	\$4.005.095.106,00	\$0,00	\$4.005.095.106,00	\$16.020.380.427,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
REGALÍAS	9677-PPAL001-396-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$8.272.681.997,00	36,00%	\$1.654.536.399,40	\$2.229.761.239,42	\$1.208.584.151,52	\$4.834.336.606,06	26,95%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-654-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$2.696.280.990,00	42,95%	\$339.236.192,00	\$1.070.346.911,71	\$209.289.132,60	\$1.416.644.915,69	39,70%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-532-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$4.268.718.305,00	61,86%	\$853.743.661,00	\$1.342.480.544,68	\$885.247.552,06	\$2.340.990.208,26	31,45%	POST CONTRACTUAL
				\$81.506.656.197,53				\$10.839.366.785,81			

Fuente: FNGRD Expedientes contractuales.

**Tabla No.3. Proyectos de Infraestructura obras de Mitigación Mocoa.**

OBRAS DE MITIGACIÓN		
VALOR TOTAL OBRAS DE MITIGACIÓN (millones de pesos)		\$175.588
Números de contratos	Contratos de obra	Contratos de Interventoría
31	18	13
Porcentaje de Avance		69.02%

**Tabla No.2. Proyectos de Infraestructura Vías y Alcantarillado Mocoa**

OBRAS VIAS Y ALCANTARILLADO		
VALOR TOTAL OBRAS VIAS Y ALCANTARILL. (millones de pesos)		\$39.480
Números de contratos	Contratos de obra	Contratos de Interventoría

17	13	4
Porcentaje de Avance		64.75%

Fuente: FNGRD Expedientes contractuales

**1. OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA MEDIA Y BAJA DE LOS RÍOS SANGOYACO, MULATO Y QUEBRADA TARUCA Y TARUQUITA – SGR:** A través del Sistema General de Regalías se asignaron \$185.093 millones en diciembre de 2019, para la financiación de las intervenciones requeridas, contratadas por un valor \$175.588 millones, dando inicio en 2020. Actualmente se cuenta con un porcentaje de avance físico del 69,02% versus 100% programado, lo que evidencia un atraso del 30,98% y un avance financiero de 69,02% correspondiente a pagos de actas parciales por valor de \$121.185.848.341,01.

**Tabla No.4.** Proyectos Obras de Mitigación Mocoa.

FUENTE DE RECURSOS	No DE CONTRATO	INTERVENCIÓN	TIPO CTO	VALOR CONTRATO (Inicial)	EJECUCIÓN FÍSICA [%] FEB-2024	Valor anticipo	ACTAS PARCIALES PAGADAS	SALDO DEL ANTICIPO	SALDO DEL CONTRATO	EJECUCION FINANCIERA REAL [%]	ESTADO ACtual FEB-2024
REGALÍAS	9677-PPAL001-1334-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$6.923.961.014,00	42,68%	\$1.384.792.202,80	\$2.436.190.225,02	\$646.778.281,68	\$3.834.962.507,30	35,23%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-141-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$546.150.500,00	41,68%	\$0,00	\$192.354.206,10	\$0,00	\$353.796.293,90	35,22%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-988-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$10.192.094.882,00	100,00%	\$2.038.418.976,40	\$9.169.698.481,81	\$0,00	\$1.022.396.400,19	89,97%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-115-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$823.079.398,00	71,55%	\$0,00	\$388.934.575,45	\$0,00	\$234.144.822,55	71,55%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-201-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$11.323.151.784,00	57,00%	\$2.254.630.286,80	\$6.441.797.800,84	\$654.180.906,34	\$4.227.173.076,82	36,89%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-344-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$928.830.700,00	57,00%	\$0,00	\$419.653.013,98	\$0,00	\$509.177.686,02	45,18%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1025-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$4.302.041.377,00	98,50%	\$860.408.275,40	\$2.586.893.073,56	\$96.876.076,81	\$1.618.272.226,63	60,13%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1980-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$5.707.990.037,72	34,68%	\$1.142.139.868,00	\$1.281.549.242,00	\$821.752.057,50	\$3.604.688.238,22	22,45%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-136-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$809.421.123,00	98,50%	\$0,00	\$170.513.843,37	\$0,00	\$638.907.279,63	21,07%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1388-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$6.665.699.934,00	73,14%	\$1.333.139.986,80	\$4.875.560.873,30	\$0,00	\$1.790.139.060,70	73,14%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1023-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$6.318.496.572,00	100,00%	\$1.263.699.914,40	\$5.650.572.697,68	\$0,00	\$667.926.874,32	89,43%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1345-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$1.044.310.680,00	81,07%	\$0,00	\$846.610.043,40	\$0,00	\$197.700.636,60	81,07%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-977-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$30.413.014.931,00	81,80%	\$6.082.602.986,20	\$27.371.422.734,79	\$0,00	\$3.041.392.196,21	90,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1365-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$2.425.386.600,00	83,30%	\$0,00	\$1.984.012.401,23	\$0,00	\$441.374.198,77	81,80%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1343-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$8.307.462.026,81	16,00%	\$1.661.462.403,36	\$0,00	\$1.661.462.403,36	\$6.645.999.621,45	0,00%	EN EJECUCIÓN
REGALÍAS	9677-PPAL001-1098-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$673.647.100,00	16,00%	\$0,00	\$0,00	\$673.647.100,00	\$0,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
REGALÍAS	9677-PPAL001-636-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$7.838.331.969,00	50,65%	\$1.567.666.364,00	\$3.335.893.389,55	\$500.868.377,14	\$3.921.540.202,31	42,81%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1311-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$2.723.386.639,00	90,31%	\$544.677.327,80	\$2.375.483.077,04	\$0,00	\$347.903.561,96	87,23%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-110-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$851.659.200,00	60,88%	\$0,00	\$525.729.224,16	\$0,00	\$325.929.975,84	61,73%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1119-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$5.280.966.838,95	85,61%	\$1.056.193.367,79	\$4.174.512.741,90	\$0,00	\$1.106.454.097,05	79,05%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1064-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$15.407.336.784,00	93,23%	\$3.081.467.366,92	\$13.866.467.961,80	\$0,00	\$1.540.868.822,80	90,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-154-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$1.669.791.816,00	91,29%	\$0,00	\$829.436.469,41	\$0,00	\$840.355.346,59	49,67%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1330-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$1.930.861.194,00	60,50%	\$386.172.238,80	\$0,00	\$386.172.238,80	\$1.544.688.955,20	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-323-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$6.196.852.151,00	100,00%	\$1.239.370.430,20	\$5.576.847.937,91	\$0,00	\$620.004.213,09	89,99%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-133-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$660.557.330,00	65,00%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$660.557.330,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-183-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$4.452.771.492,00	3,78%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.452.771.492,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1743-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$363.516.745,00	3,78%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$363.516.745,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1362-2020	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$24.560.158.153,00	90,32%	\$4.912.031.630,60	\$20.576.884.459,71	\$0,00	\$3.983.273.693,29	83,78%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-205-2021	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$1.933.504.000,00	91,33%	\$0,00	\$1.636.707.474,00	\$0,00	\$316.796.526,00	83,78%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-261-2019	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORIA	\$453.207.180,00	100,00%	\$0,00	\$407.886.462,00	\$0,00	\$45.320.718,00	90,00%	LIQUIDADOS
REGALÍAS	9677-PPAL001-1063-2019	CUENCA MEDIA BAJA - OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$3.841.235.901,00	100,00%	\$0,00	\$3.841.235.901,00	\$0,00	\$0,00	100,00%	LIQUIDADOS
				\$175.588.879.653,98							

**2. VÍAS Y ALCANTARILLADO – SGR:** Ejecución de 13 contratos de obra para construcción de vías del municipio, que representan aproximadamente 10,66 km, financiados con recursos de Sistema General de Regalías, por un valor \$39.480 millones en diciembre de 2019. Actualmente, se presenta un avance físico ejecutado del 64,75% versus 100% programado, lo que evidencia un atraso del 35,25%.

**Tabla No.5.** Proyectos Obras Vías y Alcantarillado Mocoa.

FUENTE DE RECURSOS	No DE CONTRATO	INTERVENCIÓN	TIPO CTO	VALOR CONTRATO (Inicial)	EJECUCIÓN FÍSICA [%] FEB-2024	Valor anticipo	ACTAS PARCIALES PAGADAS	SALDO DEL ANTIPO	SALDO DEL CONTRATO	EJECUCION FINANCIERA REAL [%]	ESTADO ACTUAL FEB-2024
REGALÍAS	9677-PPAL001-366-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$6.272.681.997,00	36,00%	\$1.654.536.399,40	\$2.229.761.239,42	\$1.208.584.151,52	\$4.834.336.606,06	26,95%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-555-2021	PAVIMENTOS	INTERVENTORÍA	\$567.850.150,00	36,00%		\$0,00	\$0,00	\$567.850.150,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-378-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$1.258.851.707,00	95,11%	\$251.770.341,40	\$1.120.478.442,00	\$0,00	\$138.373.265,00	89,01%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-398-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$2.320.900.325,00	97,30%	\$464.180.065,00	\$1.674.932.379,41	\$0,00	\$645.907.945,59	72,17%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-407-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$1.017.638.395,00	100,00%	\$203.531.679,00	\$896.078.421,00	\$0,00	\$121.579.974,00	88,05%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-492-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$2.824.604.874,00	15,45%	\$0,00	\$432.142.326,98	\$0,00	\$2.392.462.547,02	15,30%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-518-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$1.206.210.066,00	100,00%	\$241.242.013,20	\$1.085.589.059,00	\$0,00	\$120.621.007,00	90,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-548-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$1.830.025.649,00	100,00%	\$386.005.129,80	\$1.629.365.779,39	\$0,00	\$200.659.869,61	89,04%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-554-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$2.696.280.960,00	42,95%	\$539.256.192,00	\$1.070.346.911,71	\$209.289.132,60	\$1.416.644.915,69	39,70%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-636-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$1.253.593.696,00	97,54%	\$250.718.739,20	\$1.050.996.471,94	\$0,00	\$202.597.224,06	83,84%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-551-2021	PAVIMENTOS	INTERVENTORÍA	\$1.023.899.800,00	74,65%		\$0,00	\$0,00	\$1.023.899.800,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-532-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$4.268.718.305,00	61,86%	\$853.743.861,00	\$1.342.480.544,68	\$585.247.552,06	\$2.340.980.208,26	31,45%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-1113-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$2.435.079.371,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$2.435.079.371,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-774-2021	PAVIMENTOS	INTERVENTORÍA	\$495.382.720,00	61,86%		\$0,00	\$0,00	\$495.382.720,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-550-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$1.282.799.166,00	90,00%	\$256.559.833,20	\$1.045.254.151,80	\$0,00	\$237.545.014,20	81,46%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-800-2021	PAVIMENTOS	OBRA	\$6.240.520.933,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$6.240.520.933,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
REGALÍAS	9677-PPAL001-868-2021	PAVIMENTOS	INTERVENTORÍA	\$485.377.195,00	91,87%		\$0,00	\$0,00	\$485.377.195,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
				\$39.480.435.309,00							

Fuente: FNGRD Expedientes contractuales

**3. OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA DE LOS RÍOS SANGOYACO, MULATO Y QUEBRADA TARUCA Y TARUQUITA – FNGRD:** con recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD se asignaron \$185.439 millones en marzo de 2022, para la financiación de las intervenciones requeridas, contratadas por un valor \$185.439 millones, dando inicio en 2022. Actualmente se cuenta con un porcentaje de avance físico del 0,00% esto teniendo en cuenta que hacen falta permisos de ocupación de cauce los cuales aún no han sido otorgados por CORPOAMAZONIA, para lo cual se tienen en el momento 22 contratos para cuenca alta, de los cuales son 11 contratos de obra y 11 contratos de interventorías, de los 22 contratos 2 se encuentran en estado Post Contractual, 14 en ejecución, 2 sin acta de inicio y 4 suspendidos.

Los contratistas demás de realizar las gestiones para el permiso de ocupación de cauce han venido realizando la actualización de ajustes de diseño conforme a la condición actual de la cuenca, los cuales deberán ser avalados por la interventoría con previo visto bueno de CORPOAMAZONIA.

Adicionalmente, se requiere que las obras sean socializadas a la comunidad en compañía de la Alcaldía Municipal, CORPOAMAZONIA, los contratistas de obra e interventoría y la

UNGRD; toda vez que la comunidad ha venido manifestando su inconformidad con relación a la implementación de las obras ya que gran parte de ellos dependen económicamente de la extracción de material del río y se verían afectados si esta situación no es considerada en la implementación de las obras, y así mismo se deben definir aspectos relacionados con las servidumbres para el ingreso de la maquinaria a la zona de las obras.

También es importante mencionar que a la fecha no hay claridad respecto a las compensaciones que se deben realizar la UNGRD como requisito para la expedición de los permisos de ocupación de cauce.

**Tabla No.6.** Proyectos obras de mitigación cuenca alta – FNGRD.

FUENTE DE RECURSOS	No DE CONTRATO	INTERVENCIÓN	TIPO CTO	VALOR CONTRATO (Inicial)	EJECUCIÓN FÍSICA [%] FEB-2024	Valor anticipo	ACTAS PARCIALES PAGADAS	SALDO DEL ANTIPO	SALDO DEL CONTRATO	EJECUCION FINANCIERA REAL [%]	ESTADO ACTUAL FEB-2024
FNGRD	9677-PPAL001-875-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$20.890.947.716,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$20.890.947.716,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
FNGRD	9677-PPAL001-1053-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$1.361.407.600,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$1.361.407.600,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
FNGRD	9677-PPAL001-864-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$20.025.475.533,00	0,00%	\$4.005.095.106,00	\$0,00	\$4.005.095.106,00	\$16.020.380.427,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-873-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$1.197.782.600,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$1.197.782.600,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-912-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$15.227.534.149,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$15.227.534.149,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-891-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$856.100.362,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$856.100.362,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-844-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$18.671.888.439,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$18.671.888.439,00	0,00%	SUSPENDIDO
FNGRD	9677-PPAL001-1054-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$1.074.830.043,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$1.074.830.043,00	0,00%	SUSPENDIDO
FNGRD	9677-PPAL001-881-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$9.918.758.995,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$9.918.758.995,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1135-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$735.659.785,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$735.659.785,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-854-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$14.313.804.411,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$14.313.804.411,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1534-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$870.222.724,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$870.222.724,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1302-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$14.004.018.791,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$14.004.018.791,00	0,00%	SUSPENDIDO
FNGRD	9677-PPAL001-1299-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$816.887.400,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$816.887.400,00	0,00%	SUSPENDIDO
FNGRD	9677-PPAL001-865-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$18.725.650.013,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$18.725.650.013,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1261-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$1.197.858.998,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$1.197.858.998,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1102-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$12.950.952.781,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$12.950.952.781,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1260-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$860.587.770,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$860.587.770,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-866-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$12.565.435.725,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$12.565.435.725,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1142-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$860.507.088,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$860.507.088,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
FNGRD	9677-PPAL001-1484-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	OBRA	\$17.256.802.876,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$17.256.802.876,00	0,00%	SIN ACTA DE INICIO
FNGRD	9677-PPAL001-1421-2022	CUENCA ALTA OBRAS DE MITIGACIÓN	INTERVENTORÍA	\$1.056.650.385,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$1.056.650.385,00	0,00%	SIN ACTA DE INICIO
				\$185.439.764.184,00							

Fuente: FNGRD Expedientes contractuales

**4. OBRAS COMPENSACIÓN AMBIENTAL:** con recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD se asignaron \$7.548 millones en el 2022, para la financiación de dos contratos de compensación ambiental, uno de obra y uno de

interventoría contratadas por un valor \$7.548 millones, dando inicio en 2022. Actualmente se cuenta con un porcentaje de avance físico del 100,00% y avance financiero del 0,00%.

También se destinaron recursos del Sistema General de Regalías asignados y contratados por valor de \$7.194 millones, para cuatro contratos dos de obra y dos de interventorías, de los cuales de los cuales dos contratos se encuentran en ejecución con un porcentaje de avance físico del 3,30% y avance financiero del 0,00% y otros dos contratos que a la fecha no tienen suscrita el acta de inicio.

**Tabla No.7.** Proyectos de compensación ambiental – FNGRD.

FUENTE DE RECURSOS	No DE CONTRATO	INTERVENCIÓN	TIPO CTO	VALOR CONTRATO (Inicial)	EJECUCIÓN FÍSICA [%] FEB-2024	Valor anticipo	ACTAS PARCIALES PAGADAS	SALDO DEL ANTICIPO	SALDO DEL CONTRATO	EJECUCION FINANCIERA REAL [%]	ESTADO ACTUAL FEB-2024
REGALÍAS	9677-PPAL001-679-2022	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OBRA	\$5.442.344.231,00	3,30%		\$0,00	\$0,00	\$5.442.344.231,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
REGALÍAS	9677-PPAL001-1056-2022	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	\$380.181.200,00	3,30%		\$0,00	\$0,00	\$380.181.200,00	0,00%	EN EJECUCIÓN
REGALÍAS	9677-PPAL001-737-2022	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OBRA	\$1.282.752.633,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$1.282.752.633,00	0,00%	SIN ACTA DE INICIO
REGALÍAS	9677-PPAL001-987-2022	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	\$89.257.140,00	0,00%		\$0,00	\$0,00	\$89.257.140,00	0,00%	SIN ACTA DE INICIO
FNGRD	9677-PPAL001-1368-2022	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OBRA	\$7.055.707.483,00	100,00%		\$0,00	\$0,00	\$7.055.707.483,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
FNGRD	9677-PPAL001-1383-2022	COMPENSACIÓN AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	\$492.433.900,00	100,00%		\$0,00	\$0,00	\$492.433.900,00	0,00%	POST CONTRACTUAL
				\$14.742.676.587,00							

### Estado Actual de los contratos

El proyecto de Reconstrucción Mocoa encargado a la Subdirección para la Reducción del Riesgo cuenta con 78 contratos de los cuales, 46 son contratos de obra y 32 son interventorías, los cuales presentan los siguientes estados:

**Tabla No.8.** Estado de los Contratos.

CONSOLIDADO DE CONTRATOS OBRAS DE MITIGACIÓN								
CONTRATOS	# DE CONTRATOS			ESTADOS DE LOS CONTRATOS				
	# TOTAL DE CONTRATO	# CONTRATOS DE OBRA	# CONTRATOS DE INTERV.	CONTRATOS POST CONTRACTUAL	CONTRATOS EN EJECUCIÓN	CONTRATOS LIQUIDADOS	CONTRATOS SUSPENDIDOS	CONTRATOS SIN ACTA DE INICIO
CUENCA MEDIA Y BAJA – OBRAS DE MITIGACION	31	18	13	27	2	2	0	0
CUENCA ALTA – OBRAS DE MITIGACION	22	11	11	2	12	0	6	2
PAVIMENTOS	17	13	4	17	0	0	0	0
FAJAS PARALELAS	2	1	1	2	0	0	0	0
COMPENSACION	6	3	3	2	2	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>46</b>	<b>32</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Actualmente se están adelantando en SRR a la oficina asesora Jurídica de la entidad, informes para evaluar presuntos incumplimientos por parte de los contratistas de obras e interventorías que tienen ejecución física menor al 80%.

## FICHAS CONTRATOS DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO MOCOA CUENCA ALTA

ESTRUCTURA	SECTOR	OBRA	INTERVENTORÍA
DIQUE ABIERTO 07 AZUD 01 AZUD 02	QDA TARUCA QDA TARUQUITA	9677-PPAL001-875-2022	9677-PPAL001-1053-2022

ESTRUCTURA	SECTOR	OBRA	INTERVENTORÍA
AZUD 03			
AZUD 04			
DIQUE ABIERTO 01	QDA TARUQUITA	9677-PPAL001-864-2022	9677-PPAL001-873-2022
DIQUE ABIERTO 02			
DIQUE ABIERTO 03			
AZUD 09	QDA TARUCA	9677-PPAL001-912-2022	9677-PPAL001-891-2022
AZUD 10			
AZUD 11			
AZUD 12			
AZUD 02	RIO MULATO	9677-PPAL001-844-2022	9677-PPAL001-1054-2022
AZUD 03			
AZUD 04		9677-PPAL001-881-2022	9677-PPAL001-1135-2022
AZUD 05			
AZUD 06		9677-PPAL001-854-2022	9677-PPAL001-1534-2022
OBRAS DE BIOINGENIERÍA			
AZUD 13	QDA TARUCA	9677-PPAL001-854-2022	9677-PPAL001-1534-2022
AZUD 14			
MURO DE ESTABILIZACIÓN TARUCA JUNÍN	QDA TARUCA - QDA TARUQUITA	9677-PPAL001-1302-2022	9677-PPL001-1299-2022
AZUD 05			
AZUD 06			
AZUD 07			
AZUD 08	QDA TARUCA	9677-PPAL001-865-2022	9677-PPAL001-1261-2022
DIQUE ABIERTO 04			
DIQUE ABIERTO 05			
DIQUE ABIERTO 06	RIO MULATO	9677-PPAL001-1102-2022	9677-PPAL001-1260-2022
DIQUE ABIERTO 01		9677-PPAL001-866-2022	9677-PPAL001-1142-2022
DIQUE ABIERTO 02		9677-PPAL001-1484-2022	9677-PPAL001-1421-2022
DIQUE ABIERTO 03			
AZUD 01	MULATO-SANGOYACO-TARUCA	9677-PPAL001-1368-2022	9677-PPAL001-1383-2022
COMPENSACION AMBIENTAL			
PANTALLAS ANCLADAS	BARRIO MODELO	9677-PPAL001-063-2019	9677-PPAL001-261-2019

### CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-875-2022

PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA		
1	MUNICIPIO	MOCOA - PUTUMAYO
2	ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-875-2022</b>		

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 07 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA Y AZUD 1, AZUD 2, AZUD 3, AZUD 4 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUQUITA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 07 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA Y AZUD 1, AZUD 2, AZUD 3, AZUD 4 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUQUITA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 19053 de 16/08/2022 CDP No. 220672 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 20.890.947.716,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 20.890.947.716,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	29/3/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	29/1/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	29/1/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	UNIÓN TEMPORAL DIQUES MOCOA 2022
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL DIQUES MOCOA 2022
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	VENCIDO
18	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato se encuentra vencido debido a la falta de trazabilidad del trámite de permisos de ocupación de cauce y falta actividades de ajustes de los estudios y diseños.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1053-2022</b>		
19	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER TARUCA
20	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20629 de 30/12/2022 CDP No. 220684 de 15/03/2022
21	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 1.361.407.600,00</b>

	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 1.361.407.600,00</b>
22	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	29/3/2023
23	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
24	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
25	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	29/2/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	29/2/2024
26	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
27	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
28	<b>ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	VENCIDO
29	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato se encuentra vencido debido a la falta de trazabilidad del trámite de permisos de ocupación de cauce y falta actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-864-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-864-2022</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 01, DIQUE ABIERTO 02 Y DIQUE ABIERTO 03 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUQUITA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO,
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 01, DIQUE ABIERTO 02 Y DIQUE ABIERTO 03 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUQUITA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 19018 de 11/08/2022 CDP No. 220671 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 20.025.475.533,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 20.025.475.533,00</b>

7	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/3/2023
8	No. PRORROGAS	PRORROGA No 1 DESDE EL 30/01/2024 HASTA EL 29/11/2024
9	No. SUSPENSIONES	N.A.
10	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	29/1/2024
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	29/11/2024
11	EJECUTOR	CONSORCIO MITIGACIÓN PUTUMAYO
12	CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	CONTRATISTA	CONSORCIO MITIGACIÓN PUTUMAYO
14	AVANCE FISICO	0,00%
15	VALOR PAGADO	\$ 4.005.095.106,00
16	AVANCE FINANCIERO	20,00%
17	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN
18	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños. El avance financiero corresponde al desembolso del anticipo.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-873-2022</b>		
19	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	INCOLTA INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S.
20	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	RC No. 20637 de 30/12/2022 CDP No. 220682 de 15/03/2022
21	VALOR INICIAL	\$ 1.197.782.600,00
	VALOR ADICIÓN	N.A.
	VALOR FINAL	\$ 1.197.782.600,00
22	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/3/2023
23	No. PRORROGAS	PRORROGA No 1 DESDE EL 01/3/2024 HASTA EL 29/12/2024
24	No. SUSPENSIONES	N.A.
25	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	29/2/2024
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	29/12/2024
26	VALOR PAGADO	\$ -
27	AVANCE FINANCIERO	0,00%
28	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN
29	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños. El avance financiero corresponde al desembolso del anticipo.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-912-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-912-2022</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 9, AZUD 10, AZUD 11 Y AZUD 12 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 9, AZUD 10, AZUD 11 Y AZUD 12 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20633 de 30/12/2022 CDP No. 220665 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 15.227.534.149,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 15.227.534.149,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	5/12/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	4/6/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	4/6/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO MITIGACIÓN MOCOA 2022
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO MITIGACIÓN MOCOA 2022
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%

17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	EN EJECUCIÓN
18	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-891-2022</b>		
19	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO AZUD MOCOA
20	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 19016 de 11/08/2022 CDP No. 220686 de 15/03/2022
21	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 856.100.362,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 856.100.362,00</b>
22	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	5/12/2023
23	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
24	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
25	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	4/7/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	4/7/2024
26	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
27	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
28	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	EN EJECUCIÓN
29	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-844-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-844-2022</b>		

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 2, AZUD 3, AZUD 4 Y AZUD 5 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 2, AZUD 3, AZUD 4 Y AZUD 5 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 19017 de 11/08/2022 CDP No. 220669 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 18.671.888.439,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 18.671.888.439,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	4/4/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>SUSPENSION No 1 DESDE EL 4/12/2023 HASTA 3/04/2024</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	4/12/2023
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	4/4/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO PUTUMAYO 2022
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO PUTUMAYO 2022
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	SUSPENDIDO
18	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1054-2022</b>		
19	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	HIDRO OCCIDENTE S.A
20	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20640 de 30/12/2022 CDP No. 220680 de 15/03/2022
21	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 1.074.830.043,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>

	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 1.074.830.043,00</b>
22	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	4/4/2023
23	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
24	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>SUSPENSION No 1 DESDE EL 4/12/2023 HASTA 3/04/2024</b>
25	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	4/1/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	4/5/2024
26	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
27	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
28	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	SUSPENDIDO
29	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-881-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-881-2022</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 6 Y OBRAS DE BIOINGENIERÍA EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 6 Y OBRAS DE BIOINGENIERÍA EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20636 de 30/12/2022 CDP No. 220670 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 9.918.758.995,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 9.918.758.995,00</b>

7	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15/8/2023
8	No. PRORROGAS	N.A.
9	No. SUSPENSIONES	SUSPENSION No 1 DESDE EL 26/02/2024 HASTA 26/05/2024
10	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	15/6/2024
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	15/9/2024
11	EJECUTOR	CONSORCIO RÍO MULATO PUTUMAYO 2022
12	CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	CONTRATISTA	CONSORCIO RÍO MULATO PUTUMAYO 2022
14	AVANCE FISICO	0,00%
15	VALOR PAGADO	\$ -
16	AVANCE FINANCIERO	0,00%
17	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	SUSPENDIDO
18	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1135-2022</b>		
19	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA MOCOA
20	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	RC No. 20644 de 30/12/2022 CDP No. 220681 de 15/03/2022
21	VALOR INICIAL	\$ 735.659.785,00
	VALOR ADICIÓN	N.A.
	VALOR FINAL	\$ 735.659.785,00
22	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15/8/2023
23	No. PRORROGAS	N.A.
24	No. SUSPENSIONES	N.A.
25	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	15/7/2024
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	15/10/2024
26	VALOR PAGADO	\$ -
27	AVANCE FINANCIERO	0,00%
28	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	SUSPENDIDO
29	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-854-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA – PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-854-2022</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 13, AZUD 14 QUEBRADA TARUCA, Y MURO DE ESTABILIZACIÓN TARUCA JUNÍN EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 13, AZUD 14 QUEBRADA TARUCA, Y MURO DE ESTABILIZACIÓN TARUCA JUNÍN EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 19019 de 11/08/2022 CDP No. 220675 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 14.313.804.411,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 14.313.804.411,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	6/12/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	5/6/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	5/6/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS MOCOA
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS MOCOA
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%

15	VALOR PAGADO	\$ -
16	AVANCE FINANCIERO	0,00%
17	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN
18	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1534-2022</b>		
19	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA MOCOA
20	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	RC No. 23146 de 5/12/2023 CDP No. 220687 de 15/03/2022
21	VALOR INICIAL	\$ 870.222.724,00
	VALOR ADICIÓN	N.A.
	VALOR FINAL	\$ 870.222.724,00
22	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	6/12/2023
23	No. PRORROGAS	N.A.
24	No. SUSPENSIONES	N.A.
25	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	5/7/2024
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	5/7/2024
26	VALOR PAGADO	\$ -
27	AVANCE FINANCIERO	0,00%
28	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN
29	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1302-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	MUNICIPIO	MOCOA - PUTUMAYO
2	ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-1302-2022</b>		

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 5 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUQUITA Y AZUD 6, AZUD 7, AZUD 8 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL AZUD 5 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUQUITA Y AZUD 6, AZUD 7, AZUD 8 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20631 de 30/12/2022 CDP No. 220673 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 14.004.018.791,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 14.004.018.791,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/5/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>SUSPENSION No 1 DESDE EL 16/11/2023 HASTA EL 15/02/2024; SUSPENSION No 2 DESDE EL 16/02/2024 HASTA EL 16/05/2024</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	16/11/2023
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	17/5/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO INGEOBRAS MITIGACIÓN
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO INGEOBRAS MITIGACIÓN
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	SUSPENDIDO
18	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños. El mismo se encuentra suspendido.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1299-2022</b>		
19	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER-MITIGACION MOCOA
20	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20632 de 30/12/2022 CDP No. 220685 de 15/03/2022

21	VALOR INICIAL	\$ 816.887.400,00
	VALOR ADICIÓN	N.A.
	VALOR FINAL	\$ 816.887.400,00
22	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	16/5/2023
23	No. PRORROGAS	N.A.
24	No. SUSPENSIONES	SUSPENSION No 1 DESDE EL 16/11/2023 HASTA EL 15/02/2024; SUSPENSION No 2 DESDE EL 16/02/2024 HASTA EL 16/05/2024
25	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	16/12/2023
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	11/6/2024
26	VALOR PAGADO	\$ -
27	AVANCE FINANCIERO	0,00%
28	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	SUSPENDIDO
29	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños. El mismo se encuentra suspendido.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-865-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	MUNICIPIO	MOCOA – PUTUMAYO
2	ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-865-2022</b>		
3	OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 04, DIQUE ABIERTO 05 Y DIQUE ABIERTO 06 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
4	ALCANCE (Breve Descripción)	LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 04, DIQUE ABIERTO 05 Y DIQUE ABIERTO 06 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA TARUCA

5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20634 de 30/12/2022 CDP No. 220674 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 18.725.650.013,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 18.725.650.013,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	2/6/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	2/4/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	2/4/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO RETORNO MOCOA
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO RETORNO MOCOA
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	EN EJECUCIÓN
18	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1261-2022</b>		
19	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERDIQUES TARUCA
20	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 21404 de 9/06/2023 CDP No. 220683 de 15/03/2022
21	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 1.197.858.998,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 1.197.858.998,00</b>
22	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	2/6/2023
23	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
24	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
25	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	2/5/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	2/5/2024
26	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
27	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
28	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	EN EJECUCIÓN

29	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.
----	---------------------------------	--

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1102-2022**

**PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA – PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-1102-2022**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 01 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 01 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20635 de 30/12/2022 CDP No. 220666 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 12.950.952.781,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 12.950.952.781,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	1/6/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	1/8/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	1/8/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	UNION TEMPORAL SIC OBRAS MOCOA
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL SIC OBRAS MOCOA

14	AVANCE FISICO	0,00%
15	VALOR PAGADO	\$ -
16	AVANCE FINANCIERO	0,00%
17	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN
18	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1260-2022</b>		
19	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO RSA
20	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	RC No. 23081 de 23/11/2023 CDP No. 220676 de 15/03/2022
21	VALOR INICIAL	\$ 860.587.770,00
	VALOR ADICIÓN	N.A.
	VALOR FINAL	\$ 860.587.770,00
22	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	1/6/2023
23	No. PRORROGAS	N.A.
24	No. SUSPENSIONES	N.A.
25	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	1/9/2024
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	1/9/2024
26	VALOR PAGADO	\$ -
27	AVANCE FINANCIERO	0,00%
28	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN
29	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-866-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	MUNICIPIO	MOCOA – PUTUMAYO
2	ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-866-2022**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 02 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 02 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20628 de 30/12/2022 CDP No. 220667 de 14/03/2022
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 12.565.435.725,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N.A.
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 12.565.435.725,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	29/3/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	N.A.
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	N.A.
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	29/5/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	29/5/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO DIQUE MULATO
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO DIQUE MULATO
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	EN EJECUCIÓN
18	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1142-2022**

19	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERCUENCA MULATO
20	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC No. 20639 de 30/12/2022 CDP No. 220677 de 15/03/2022

21	VALOR INICIAL	\$ 860.507.088,00
	VALOR ADICIÓN	N.A.
	VALOR FINAL	\$ 860.507.088,00
22	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/3/2023
23	No. PRORROGAS	N.A.
24	No. SUSPENSIONES	N.A.
25	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	29/6/2024
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	29/6/2024
26	VALOR PAGADO	\$ -
27	AVANCE FINANCIERO	0,00%
28	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN
29	OBSERVACIONES RELEVANTES	El contrato no presenta avance físico toda vez que se están tramitando los permisos de ocupación de cauce y adelantado las actividades de ajustes de los estudios y diseños.

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1484-2022**

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACIÓN CUENCA ALTA</b>		
1	MUNICIPIO	MOCOA – PUTUMAYO
2	ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-1484-2022</b>		
3	OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 03, AZUD 01 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
4	ALCANCE (Breve Descripción)	LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE ABIERTO 03, AZUD 01 EN EL SECTOR ALTO DE LA CUENCA DEL RIO MULATO
5	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	CDP No. 22-0668 del 14 de marzo de 2022
6	VALOR INICIAL	\$ 17.256.802.876,00
	VALOR ADICIÓN	N.A.

	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 17.256.802.876,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	SIN ACTA DE INICIO
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	SIN ACTA DE INICIO
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	SIN ACTA DE INICIO
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO MULATO 2022
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO MULATO 2022
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	SIN INICIAR
18	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato está pendiente por iniciar.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1421-2022</b>		
19	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO MOCOYA – MULATO
20	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP No. 22-0679 del 15 de marzo de 2022
21	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 1.056.650.385,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>N.A.</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 1.056.650.385,00</b>
22	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	SIN ACTA DE INICIO
23	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>N.A.</b>
24	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>N.A.</b>
25	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	SIN ACTA DE INICIO
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	SIN ACTA DE INICIO
26	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ -</b>
27	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
28	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	SIN INICIAR
29	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	El contrato está pendiente por iniciar.

**PROYECTOS DE MITIGACION CUENCA MEDIA- BAJA  
CUENCA MEDIA BAJA (BPIN 2019860010001)**

ESTRUCTURA	SECTOR	OBRA	INTERVENTORÍA
AZUD 03	QDA TARUCA	9677-PPAL001-1342-2020	9677-PPAL001-098-2021
AZUD 04			
AZUD 07			
AZUD 08	RIO SANGOYACO		
MURO 01			
AZUD 09	RIO SANGOYACO	9677-PPAL001-639-2021	9677-PPAL001-110-2021
MURO 03			
AZUD 05	QDA TARUCA	9677-PPAL001-311-2021	
AZUD 06			
MURO 02	RIO SANGOYACO	9677-PPAL001-1119-2020	9677-PPAL001-154-2021
AZUD 10			
AZUD 11			
MURO 04			
MURO 05			
ESTABILIZACIÓN DE JARILLON 02			
AZUD 12			
AZUD 13			
AZUD 14			
MURO 06			
MURO 07			
AZUD 15			
MURO 09			
AZUD 16			
AZUD 17			
MURO GAVION 10	QDA TARUCA	9677-PPAL001-1330-2020	9677-PPAL001-133-2021
DIQUE ABIERTO 01			
DIQUE ABIERTO 2			
ESTABILIZACIÓN DE JARILLON 01	RIO SANGOYACO QDA TARUCA	9677-PPAL001-183-2021	9677-PPAL001-743-2021
OBRAS DE DRENAJE			
DIQUE ABIERTO 01	RIO MULATO	9677-PPAL001-1334-2020	9677-PPAL001-141-2021
DIQUE ABIERTO 02			
DIQUE ABIERTO 03			
MURO 01			
AZUD 05			
MURO 02			
AZUD 04			
MURO 03			
AZUD 06			
MURO 04			
AZUD 07			
MURO 05			
MURO 09			
AZUD 11			
MURO 08			
MURO 10			
AZUD 12			
OBRAS DE DRENAJE	RIO MOCOYA	9677-PPAL001-201-2021	9677-PPAL001-344-2021
MURO 06			
ESPOLON 01			
ESPOLON 02	RIO MOCOYA	9677-PPAL001-1025-2020	9677-PPAL001-139-2021
AZUD 08			
AZUD 09	RIO MOCOYA	9677-PPAL001-980-2020	9677-PPAL001-139-2021
AZUD 10			
MURO 07	RIO MOCOYA	9677-PPAL001-1382-2020	9677-PPAL001-205-2021
JARILLON			
ESPOLONES			

COMPENSACION AMBIENTAL	NA	9677-PPAL001-679-2022	9677-PPAL001-1056-2022
COMPENSACION AMBIENTAL	RÍOS MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA	9677-PPAL001-737-2022	9677-PPAL001-987-2022

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1025-2020**

<b>RECONSTRUCCION MOCOA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.


<b>CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-1025-2020</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO 6, ESPOLON 01, ESPOLON 02 Y AZUD 08, SECTOR RÍO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE MURO 06 , ESPOLON 01, ESPOLON 02 Y AZUD 08, SECTOR RÍO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP-20576-RP14071 FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$4.302.041.377
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ -
	<b>VALOR FINAL</b>	\$4.302.041.377
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	12/2/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (4 Meses) (01/04/2022 al 30/07/2022)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	11/4/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	11/12/2021
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S. A
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO RECUPERACIÓN MOCOA LH 2020
14	<b>AVANCE FISICO</b>	98,50%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 2.586.893.073,56

16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	60,13%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	45.589
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-139-2020**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO HECAD VIAL
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N° 21-0192 de fecha 13 de enero de 2020,
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$809.421.123,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ -
	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	12/2/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (4 Meses) (01/04/2022 al 30/07/2022)
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	11/4/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	9/08/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 170.513.843,37
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	21.07%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

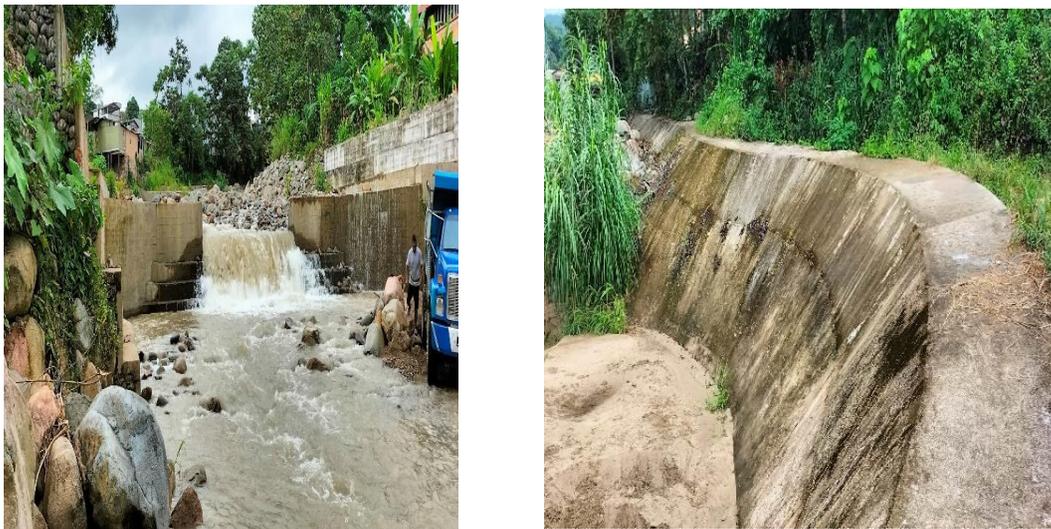29		
----	--	--

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1064-2020**

<b>RECONSTRUCCION MOCOCA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOCA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
<b>CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-1064-2020</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE JARILLON 02, CONSTRUCCIÓN DE AZUD 12, MURO 06, AZUD 13, AZUD 14 Y MURO 07, SECTOR RÍO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE JARILLON 02, AZUD 12, AZUD 13, AZUD 14, MURO 6, MURO 7, SECTOR RIO SANGOYACO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	(CDP 20-0561 -200564-200565)de fecha 06 de abril de 2020)- (RP 2221-2321-2421) - FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOCA
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$15.407.336.785
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$1.793.570.539,88
	<b>VALOR FINAL</b>	
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/3/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	15/9/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	15/09/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL OBRAS RIO SANGOYACO 2020
14	<b>AVANCE FISICO</b>	93,23%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 10.912.116.502
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	90%

17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRATUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	SE EVIDENCIA APROBACION DE ADICION TANTO EN TIEMPO COMO EN VALOR DE PARTE DE INTERVENTORIA Y SUPERVISION NO SE EVIDENCIA APROBACION DE FIDUPREVISORTA NI OTROSI

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-154-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	No. CDP 21-0198 de fecha 13 de enero de 2021,
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$1.669.791.816,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/3/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	15/9/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	15/9/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 829.436.499,41
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	49,67%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

29	
----	--

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1119-2021**

<b>RECONSTRUCCION MOCOCA</b>		
<b>1</b>	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOCA
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
<b>CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-1119-2021</b>		
<b>3</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 11, MURO 04 Y MURO 05, SECTOR RÍO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
<b>4</b>	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 11, MURO 04 Y MURO 05, SECTOR RÍO SANGOYACO
<b>5</b>	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	RC 14070 - RP No 2521 (FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOCA)
<b>6</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	\$5.280.966.839
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	\$5.280.966.839
<b>7</b>	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/3/2021
<b>8</b>	<b>No. PRORROGAS</b>	
<b>9</b>	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
<b>10</b>	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	15/9/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	15/9/2022
<b>11</b>	<b>EJECUTOR</b>	A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
<b>12</b>	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
<b>13</b>	<b>CONTRATISTA</b>	A&A CONSULTORIA E INGENIERIA SAS
<b>14</b>	<b>AVANCE FISICO</b>	85,62%
<b>15</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 3.796.976.230,90
<b>16</b>	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	79,05%
<b>17</b>	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRACTUAL

18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-154-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORES DDA MOCOA
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	No. CDP 21-0198 de fecha 13 de enero de 2021, (RC15894 ) (RP10821) ((FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA)
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$1.669.791.816,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/3/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	15/9/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	15/12/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 829.436.499,41
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	49,67%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

29		
----	--	--

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1330-2020**

**RECONSTRUCCION MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
---	------------------	-------

2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
<b>CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-1330-2020</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 15, MURO 09, SECTOR RÍO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 15, MURO 09, SECTOR RÍO SANGOYACO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N° 20-0567 del 06 de abril de 2020-EI CDP N° 21-0204 del 13 de enero de 2021 ( FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOYA)
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$1.930.861.194
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	\$1.930.861.194
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	15/4/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	14/10/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	14/10/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO OBRAS POR COLOMBIA
14	<b>AVANCE FISICO</b>	60.50%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 386.172.238,80
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	45.589
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-133-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER – MOCOA 2020
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	N° 20-0549 del 6 de abril de 2020 , -21-0199 del 13 de enero de 2021- FNGRD – UNGRD-SGR- MUNICIPIO DE MOCOA
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$660.557.330,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	15/4/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	14/10/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	14/10/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 0,00
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

29		
----	--	--

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-323-2021**

**RECONSTRUCCION MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

**CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-323-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 16, AZUD 17 Y MURO GAVION 10, SECTOR RIO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 16, AZUD 17 Y MURO GAVION 10, SECTOR RIO SANGOYACO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP 20-0568 del 6 de abril de 2020,CDP 210205 13-01-2021 - (cdp N°1523-16-01-2023)RC 14832 (FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOYA)
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$6.196.852.151
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	15/4/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (3 Meses) (19/07/2021 al 18/10/2021)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	14/10/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	14/01/2023
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO EVI5
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO EVI5
14	<b>AVANCE FISICO</b>	100%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 2.391.533.655,75
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	90%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	45.589
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-133-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER – MOCOYA 2020
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	(CDP N° 20-0549 del 6 de abril de 2020) CDP N° 21-0199 del 13 de enero de 2021,(FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOYA
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$660.557.330,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	

	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	15/4/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	14/10/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 0,00
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0%

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1382-2020

#### RECONSTRUCCION MOCOA

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

#### CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-1382-2020

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE JARILLON Y ESPOLONES, SECTOR RÍO MOCOA, INSPECCIÓN DE POLICÍA DE PUERTO LIMÓN, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)
---	----------------------------	--

		DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON Y ESPOLONES, SECTOR RÍO MOCOA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP 210186 13 DE ENERO DE 2021 (FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA)
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$24.560.158.153
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	28/4/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	27/10/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO DRAGADO MOCOA 2020
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO DRAGADO MOCOA 2020
14	<b>AVANCE FISICO</b>	97%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 18.509.200.625,71
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	83,78%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-205-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERDRAGADO MOCOA
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N° 20-00551 del 6 de abril de 2020- Certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP 21-0202 de fecha 13 de enero de 202 ,FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$1.953.504.000,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	28/4/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	

26	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	27/10/2022
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	
27	VALOR PAGADO	\$ 1.636.707.474,0
28	AVANCE FINANCIERO	83,78%

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

29		
----	--	---

### CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-311-2021

#### RECONSTRUCCION MOCOA

1	MUNICIPIO	MOCOA
2	ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

#### CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-311-2021

3	OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 10, SECTOR RÍO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
---	---------------------	---

		ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE JARILLON Y ESPOLONES, SECTOR RÍO MOCOYA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	certificado de Disponibilidad presupuestal N° 21-0203 de fecha 13 de enero de 2021,( FNGRD – UNGRD-SGR- MUNICIPIO DE MOCOYA)
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$2.723.386.639
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	3/5/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	2/11/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	2/11/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO MIRAVALLE
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO MIRAVALLE
14	<b>AVANCE FISICO</b>	90,31%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 2.160.520.783,04
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	87,23%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-154-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA PUTUMAYO 2020
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP 21-0198 de fecha 13 de enero de 2021, (FNGRD – UNGRD-SGR- MUNICIPIO DE MOCOYA
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$1.669.791.816
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/3/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	1 (2-11-2022 al 01-12-2022)
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	15/9/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	

27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 829.436.499,41
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	49.67%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

29		
----	--	--

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1023-2020**

**RECONSTRUCCION MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

**CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-1023-2020**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 02, SECTOR QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 2, SECTOR QUEBRADA LA TARUCA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	(CDP N° 20-0554 del 06 de abril de 2020) - certificado de disponibilidad presupuestal:• CDP N° 21-0196 del 13 de enero

		de 2021 FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA
6	VALOR INICIAL	\$6.318.499.572
	VALOR ADICIÓN	
	VALOR FINAL	\$6.318.499.572
7	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12/3/2021
8	No. PRORROGAS	
9	No. SUSPENSIONES	
10	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	11/9/2022
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	11/9/2022
11	EJECUTOR	CONSORCIO MURO RIO MOCOA
12	CONTRATANTE	FIDUPREVISORA S.A
13	CONTRATISTA	CONSORCIO MURO RIO MOCOA
14	AVANCE FISICO	100%
15	VALOR PAGADO	\$ 5.083.023.307,68
16	AVANCE FINANCIERO	89,43%
17	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	POST CONTRACTUAL
18	No. POBLACION BENEFICIARIA	45.589
19	OBSERVACIONES RELEVANTES	
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-345-2021</b>		
20	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORÍA MOCOA 2020
21	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	(CDP N° 20-0543 del 6 de abril de 2020)- (Certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP 21-0194 de fecha 13 de enero de 2021),(FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA)
22	VALOR INICIAL	\$1.044.310.680,00
	VALOR ADICIÓN	
	VALOR FINAL	
23	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	12/3/2021
24	No. PRORROGAS	
25	No. SUSPENSIONES	
26	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	11/9/2022
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	11/9/2022
27	VALOR PAGADO	\$ 846.610.043,4
28	AVANCE FINANCIERO	81.07%
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		



**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-1388-2020**

**RECONSTRUCCION MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

**CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-1388-2020**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 01, SECTOR QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 01, SECTOR QUEBRADA TARUCA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP No. 200553 de 6 de abril de 2020, • CDP N° 21-0193 del 13 de enero de 2021 FNGRD – UNGRD-SGR- MUNICIPIO DE MOCOA
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$6.665.699.934
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	12/3/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	

9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (4 Meses) (09/09/2022 al 8/01/2023)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	11/9/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	11/01/2023
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO DIQUE 1
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO DIQUE 1
14	<b>AVANCE FISICO</b>	73,14%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 4.320.576.958,30
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	73,14%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	POST CONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-345-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA MOCOA 2020
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	(CDP N° 20-0543 del 6 de abril de 2020)-(disponibilidad presupuestal No. CDP 21-0194 de fecha 13 de enero de 2021), (FNGRD – UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$1.044.310.680,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	12/3/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	11/9/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 846.610.043,4
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	81,07%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001-977-2020**


<b>RECONSTRUCCION MOCOA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

**CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-977-2020**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE JARILLON 01, SECTOR QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE JARILLON 01,SECTOR QUEBRADA TARUCA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	(CDP N°200555 de fecha 6 de abril de 2020,)(FNGRD – UNGRD-SGR) MUNICIPIO DE MOCOA
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$30.413.014.931
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	15/12/2020
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (4 meses) (24/12/2021 al 23/04/2022) SUSPENSION 02 (4 Meses) (24/04/2022 al 23/08/2022) SUSPENSION 03 (4 Meses) (02/09/2022 al 01/01/2023)

10	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	15/6/2022
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	15/06/2023
11	EJECUTOR	INGECON S.A
12	CONTRATANTE	FIDUPREVISORA S.A
13	CONTRATISTA	INGECON S.A
14	AVANCE FISICO	81.8%
15	VALOR PAGADO	\$ 22.384.831.744,79
16	AVANCE FINANCIERO	90%
17	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	POST CONTRACTUAL
18	No. POBLACION BENEFICIARIA	58.000
19	OBSERVACIONES RELEVANTES	
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-1365-2020</b>		
20	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER JARILLON 2020
21	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	Afectación Presupuestal No. 20-0544 del 6 de abril de 2020 FNGRD – (instrucción No. GGC-CR-1150-2020 – 2020EE10110 del 02 de diciembre de 2020) ,(RC14085 RP 3321)- (UNGRD-SGR-MUNICIPIO DE MOCOA)
22	VALOR INICIAL	\$2.425.386.600,00
	VALOR ADICIÓN	
	VALOR FINAL	\$2.425.386.600,00
23	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	15/12/2020
24	No. PRORROGAS	
25	No. SUSPENSIONES	SUSPENSION 01 (4 meses) (24/12/2021 al 23/04/2022) SUSPENSION 02 (4 Meses) (24/04/2022 al 23/08/2022) SUSPENSION 03 (66 Dias) (28/10/2022 al 01/01/2023)
26	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	15/6/2022
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	20/04/2023
27	VALOR PAGADO	\$ 1.984.012.401,23
28	AVANCE FINANCIERO	81.80%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

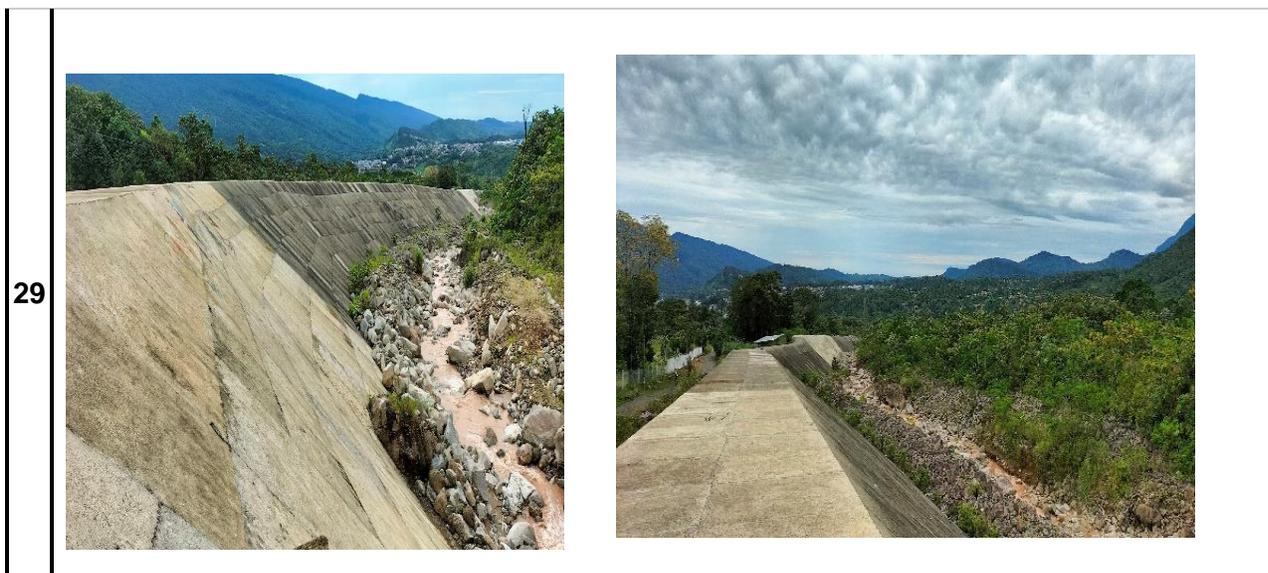

**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001- 639-2021**

**PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOCA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOCA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-639-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 09 Y MURO 03, SECTOR RIO SANGOYACO, AZUD 05, AZUD 06 Y MURO 02 SECTOR QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 09 Y MURO 03, SECTOR RIO SANGOYACO, AZUD 05, AZUD 06 Y MURO 02 SECTOR QUEBRADA TARUCA DEL MUNICIPIO DE MOCOCA.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 21-0201
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$7.838.331.969,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>\$0,00</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 7.838.331.969,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>26/08/2021</b>
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>SUSPENSIÓN 01 (1 Mes) (02/11/2022 al 01/12/2022)</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	<b>25/02/2023</b>

	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	<b>25/04/2023</b>
<b>11</b>	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
<b>12</b>	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
<b>13</b>	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO CONSTRUOBRAS MOCOA
<b>14</b>	<b>AVANCE FISICO</b>	50,65%
<b>15</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 3.916.791.766,69</b>
<b>16</b>	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	42,81%
<b>17</b>	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
<b>19</b>	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES (ACTUAL)</b>	Azud 5: Terminado Fuera de cauce, revisar ubicación Azud 6: terminado Se evidencia paso de agua bajo la estructura, revisar margen izq aguas abajo en gaviones Muro 2: terminado Azud 9: No se evidencia obra Muro 3: Mantenimiento, perdida de alineación, abs 34 volcamiento de base, muro por debajo del nivel de lámina de agua. Se encuentra en trámite Informe de Incumplimiento a los contratistas.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-110-2021</b>		
<b>20</b>	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA PUTUMAYO 2020
<b>21</b>	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS.
<b>22</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 851.659.200,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	NA
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 851.659.200,00</b>
<b>23</b>	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	3/05/2021
<b>24</b>	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>SUSPENSION 01 (1 Mes) (02/11/2022 al 01/12/2022)</b>
<b>26</b>	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	2/11/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	3/11/2022
<b>27</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 525.729.224,16</b>
<b>28</b>	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	61,7%
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		

29



**CONTRATO DE OBRA No 9677-PPAL001- 183-2021**

**PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-183-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, SECTOR QUEBRADA LA TARUCA - RIO SANGOYACO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, SECTOR QUEBRADA LA TARUCA - RIO SANGOYACO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 21-0206/20-0569 RP:9021
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$4.452.771.492,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 4.452.771.492,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>11/04/2022</b>
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	

10	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	10/04/2023
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	10/04/2023
11	EJECUTOR	UNGRD
12	CONTRATANTE	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	CONTRATISTA	CONSTRUVAL INGENIERIA
14	AVANCE FISICO	3,8%
15	VALOR PAGADO	0%
16	AVANCE FINANCIERO	0%
17	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	No. POBLACION BENEFICIARIA	58.000
19	OBSERVACIONES RELEVANTES	Se evidencia canal en concreto de sección trapezoidal paralelo al rio margen derecho aguas arriba del azud 12. Se encuentra en trámite de Informe de incumplimiento para los contratistas.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-743-2021</b>		
20	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERIA DE MITIGACIÓN
21	FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)	REGALIAS. CDP:21-0207 RP: 8521
22	VALOR INICIAL	\$ 363.516.745,00
	VALOR ADICIÓN	\$ -
	VALOR FINAL	\$ 363.516.745,00
23	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11/04/2022
24	No. PRORROGAS	0
25	No. SUSPENSIONES	0
26	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	10/04/2023
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	10/04/2023
27	VALOR PAGADO	\$ 0,00
28	AVANCE FINANCIERO	0,0%
29	SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		

29



**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-1342-2020**

**PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-1342-2020**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 03, AZUD 04, AZUD 07, AZUD 08 Y MURO 01 SECTOR QUEBRADA TARUCA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 03, AZUD 04, AZUD 07, AZUD 08 Y MURO 01 SECTOR QUEBRADA TARUCA.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 5321 RP: 122
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$8.307.462.026,81</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>\$0,00</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 8.307.462.026,81</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	11/11/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	1
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	10/05/2023
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	2/09/2024


11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO AZUD MOCOYA 520
14	<b>AVANCE FISICO</b>	16,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 1.661.492.405,36 (Anticipo)</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	EN EJECUCIÓN
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	Se encuentran en trámite Informe de Incumplimiento al contrato de Interventoría. Azud 3: No se evidencia obra Azud 4: Finalizado Azud 7: No se evidencia obra Azud 8: No se evidencia obra Muro 1: No se evidencia obra

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-098-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA MUROS MOCOYA 2020
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP:210195
22	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 673.647.100,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>NA</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 673.647.100,00</b>
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	11/11/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	1
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	10/05/2023
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	2/09/2024
27	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 0,00</b>
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,0%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

29

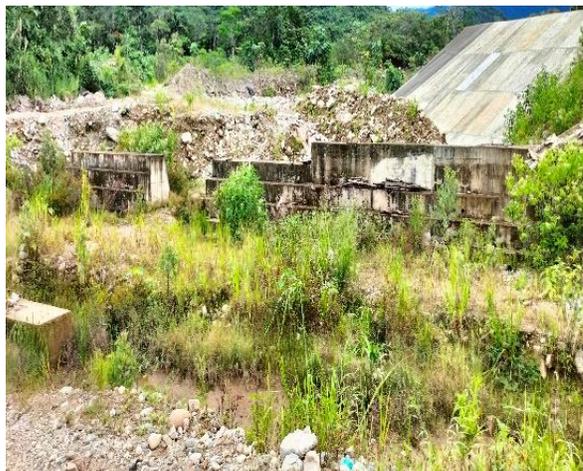

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-980-2020**

<b>PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE
<b>CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-980-2020</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 09, AZUD 10 Y MURO 7, SECTOR RÍO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 09, AZUD 10 Y MURO 7, SECTOR RÍO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 20-0577 RP:2721
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$5.710.699.340,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 5.710.699.340,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	12/02/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (20 Días) (27/05/2021 al 15/06/2021)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	11/04/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	29/08/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD

12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	<b>CONTRATISTA</b>	HAROLD MUÑOZ MUÑOZ
14	<b>AVANCE FISICO</b>	34,68%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 1.142.139.868 (Anticipo)</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,0%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	Se encuentra en trámite Informe de incumplimiento para los contratistas. AZUD 09: sin terminar, aprox físico 30%, afectación critica por desvío de cauce en margen izq. aguas abajo que compromete viviendas y base de puente. AZUD 10: no se evidencia obra. MURO 07: no se encuentra ejecutado en su totalidad, no empalma con azud 9 revisar diseños, afectado, con pérdida de mallas y material de llenado, pérdida de alineamiento en algunos sectores/secciones.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-139-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO HECAD VIAL
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 21-0192 RP: 8121
22	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 363.516.745,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ -
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 363.516.745,00</b>
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	12/02/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	0
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>SUSPENSION 01 (4 Meses) (01/04/2022 al 30/07/2022)</b>
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	11/04/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	9/08/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 170.513.843,37</b>
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	21,07%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		

29



**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-201-2020**

<b>PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA</b>		
<b>1</b>	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE
<b>CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-201-2020</b>		
<b>3</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AZUD 06, MURO 4, AZUD 07 Y MURO 5, MURO 09, AZUD 11, MURO 8 Y MURO 10, AZUD 12 Y OBRAS DE DRENAJE, SECTOR RÍO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>4</b>	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE AZUD 06, MURO 4, AZUD 07 Y MURO 5, MURO 09, AZUD 11, MURO 8 Y MURO 10, AZUD 12 Y OBRAS DE DRENAJE, SECTOR RÍO MULATO

5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP:210191 RP: 8021
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$11.323.151.748,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 11.323.151.748,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>9/03/2021</b>
8	<b>No. PRORROGAS</b>	
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
1	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	<b>8/09/2022</b>
0	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	<b>8/09/2022</b>
1 1	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
1 2	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
1 3	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO OBRAS DE PROTECCION 2020
1 4	<b>AVANCE FISICO</b>	57,0%
1 5	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$7.095.978.707,18</b>
1 6	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	56,89%
1 7	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
1 8	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
1 9	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	Se encuentra en trámite Informe de incumplimiento para los contratistas. AZUD 06: sin terminar 50% MURO 4: terminado AZUD 07: iniciado, se observan algunos elementos construidos bajo el material del rio, avance aprox 10% MURO 5: Terminado MURO 09: Terminado AZUD 11: No se evidencia obra MURO 8: No se evidencia obra MURO 10: Terminado AZUD 12: Sin terminar, avance aprox 20% OBRAS DE DRENAJE
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-344-2021</b>		
2 0	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO MUROS MOCOA
2 1	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 210190 RP: 9921
	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 928.830.700,00</b>

2	<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ -
2	<b>VALOR FINAL</b>	\$ <b>928.830.700,00</b>
2	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	9/3/2021
3		
2	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
4		
2	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
5		
2	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	8/09/2022
6	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	8/09/2022
2	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 419.653.013,98</b>
7		
2	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	45,18%
8		
2	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO
9		

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-1334-2020**

<b>PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA</b>		
1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE
<b>CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-1334-2020</b>		

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 1 Y DIQUE ABIERTO 2, SECTOR RÍO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 1 Y DIQUE ABIERTO 2, SECTOR RÍO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP:200566 RP: 6321
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$6.923.961.014,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 6.923.961.014,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>8/03/2021</b>
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>0</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	8/09/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	8/09/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO RIO MULATO
14	<b>AVANCE FISICO</b>	42,68%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 3.088.968.506,70
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	35,23%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	Se encuentra en trámite Informe de incumplimiento para los contratistas. DIQUE ABIERTO 1: no se evidencia obra DIQUE ABIERTO 2: terminado, colmatado, hierros expuestos, afectación en predio margen derecha aguas abajo por desbordamiento, colchoneta de salida en gaviones deteriorada, mallas deterioradas
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-141-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA RÍO MULATO
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP:21-0187/20-0538 RP: 11221
22	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 546.150.500,00</b>

	<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ -
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 546.150.500,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	8/03/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	0
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	8/09/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	8/09/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 192.354.206,10
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	35,22%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

29	
----	---

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-988-2020**

**PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-988-2020**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD
---	----------------------------	---

		DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ABIERTO 3 Y MURO1, AZUD 05 Y MURO 2, AZUD 04, MURO 3, SECTOR RÍO MULATO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 20-0571/ 20-0572/ 20-0573 RP: 2821/ 2921/ 3021
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$10.192.094.882,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>\$0</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 10.192.094.882,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>9/03/2021</b>
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>PRORROGA 01 (4 Meses) (9/07/2022 al 8/11/2022)</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	<b>9/03/2021</b>
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	<b>8/11/2022</b>
11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	<b>CONTRATISTA</b>	CFD INGENIERÍA S.A.S
14	<b>AVANCE FISICO</b>	100,0%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$9.169.698.481,81</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	89,97%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	DIQUE ABIERTO 03: terminado, revisar encole por paso de agua a espaldas de muro de gavión aguas arriba margen derecho MURO 1: terminado AZUD 05: terminado, daño grave en descole MURO 2: terminado AZUD 04: terminado, fuera de cauce, revisar ubicación y funcionalidad MURO 3: terminado
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-116-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER DIQUE 2020
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 210188 RP: 8421
22	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 363.516.745,00</b>

	<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$ -
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 363.516.745,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	9/03/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 Meses) (09/07/2022 al 08/11/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	9/07/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	8/11/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$588.934.575,45
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	71,5%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### PROYECTOS COMPENSACIÓN AMBIENTAL

#### PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE

#### CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-679-2022

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN EXIGIDAS POR CORPOAMAZONIA, COMPLEMENTARIAS A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO - CEA, DEL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DE LAS OBRAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DE 2019, CON RETORNO A LA
---	----------------------------	--

		NORMALIDAD MEDIANTE DECRETO No. 141 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO - CEA, DEL MUNICIPIO DE MOCOA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALÍAS. CDP: 21-2184
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 5.442.344.231,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	NA
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 5.442.344.231,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	24/03/2023
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	23/05/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	23/05/2024
11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL MEGAINGENIERÍA 2021
14	<b>AVANCE FISICO</b>	3,3%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	0%
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	EN EJECUCIÓN
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	SE ENCUENTRA EN TRÁMITE INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO A LA INTERVENTORÍA POR DEFICIENTE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1056-2022</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO CEA 2022
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 22-0733
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$380.181.200,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	NA
	<b>VALOR FINAL</b>	\$380.181.200,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	24/03/2023
24	<b>No. PRORROGAS</b>	0

25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	23/05/2024
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	23/05/2024
27	<b>VALOR PAGADO</b>	0%
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

29	 
----	--

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-1368-2022**

**PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE

**CONTRATO OBRA 9677-PPAL001-1368-2022**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN EXIGIDAS POR CORPOAMAZONIA COMPLEMENTARIAS A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, REFORESTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS CUENCAS HÍDRICAS DE LOS RÍOS MULATO, SANGOYACO Y LA QUEBRADA TARUCA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DE LAS OBRAS DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DE 2019, CON RETORNO A LA NORMALIDAD MEDIANTE DECRETO No. 141 DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE).
---	----------------------------	--

4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, REFORESTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS CUENCAS HÍDRICAS DE LOS RÍOS MULATO, SANGOYACO Y LA QUEBRADA TARUCA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	PRESUPUESTO NACIONAL. CDP: 220920
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 7.055.707.483,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>NA</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 7.055.707.483,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>29 DE MARZO DE 2023</b>
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>0</b>
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	<b>28 DE ENERO DE 2024</b>
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	<b>28 DE ENERO DE 2024</b>
11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL OBRAS MOCOA 2022
14	<b>AVANCE FISICO</b>	100%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	0%
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	Se encuentra en trámite de actas parciales No 1 y 2 para pagos. Posteriormente se iniciará etapa de liquidación del contrato.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-1383-2022</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	UNION TEMPORAL INTERMOCOA 2022
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	PRESUPUESTO NACIONAL. CDP: 22-0921
22	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$492.433.900,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>NA</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$492.433.900,00</b>
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	29/03/2023
24	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	<b>0</b>
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	29/03/2023
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	28/01/2024
27	<b>VALOR PAGADO</b>	0%

28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-737-2022**

**PROYECTO RECONSTRUCCIÓN MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA NO.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO NO.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO NO.141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

**CONTRATO DE OBRA 9677-PPAL001-737-2022**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN EXIGIDAS POR CORPOAMAZONIA, COMPLEMENTARIAS A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN RIPIARIA EN LOS RÍOS MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA, DEL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DE 2019, CON RETORNO A LA NORMALIDAD MEDIANTE DECRETO No. 141 DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE)”
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE COMPENSACIÓN EXIGIDAS POR CORPOAMAZONIA, COMPLEMENTARIAS A LAS OBRAS DE MITIGACIÓN MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE LA VEGETACIÓN RIPIARIA EN LOS RÍOS MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA

5	<b>FUENTE DE RECURSOS</b>	REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$1.282.901.636
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	NA
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ -
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	NA
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	NA
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	NA
11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
12	<b>CONTRATANTE</b>	FIDUPREVISORA S.A
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL VERDE
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,0%
	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0%
15	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	SIN INICIAR
16	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000
17	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	NO SE HA SUSCRITO ACTA DE INICIO. NO SE HAN APROBADO PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA 9677-PPAL001-987-2022</b>		
18	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	SAMBINCO SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTALES
19	<b>FUENTE DE RECURSOS</b>	REGALIAS
20	<b>VALOR INICIAL</b>	\$89.257.140,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	NA
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ -
21	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	NA
22	<b>No. PRORROGAS</b>	0
23	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
24	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	NA
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	NA
25	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	NA
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		
29	NA	

**PROYECTO CONSULTORÍA FAJAS PARALELAS**

**CONTRATO CONSULTORIA 9677-PPAL001-606-2021**

**PROYECTO RECONSTRUYENDO MOCOA**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No.176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No.027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-606-2021</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LA IDENTIFICACION DE LOS USOS Y OCUPACIONES DEL SUELO EN LA FAJA PARALELA Y DE RONDA HIDRICA DE LOS RIOS MULATO Y SANGOYACO PARA EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA No176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO No 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE ESTABLECIDO EN EL DECRETO No141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	CONSULTORÍA FAJAS PARALELAS RONDA HÍDRICA RÍOS MULATO Y SANGOYACO
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	REGALIAS. CDP: 210241
6	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$5.519.435.608,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>\$0,00</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 5.519.435.608,00</b>
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>13/09/2021</b>
8	<b>No. PRORROGAS</b>	<b>0</b>
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	<b>12/12/202022</b>
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	<b>12/12/202022</b>
11	<b>EJECUTOR</b>	UNGRD
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL SERVICIONAL CSAL
14	<b>AVANCE FISICO</b>	59,27%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 3.271.264.362,89</b>
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	59,27%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	Se encuentra en trámite Informe de Incumplimiento para los contratistas. El contrato ha tenido varios requerimientos por entes de control.
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-621-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	UNIÓN TEMPORAL MOCOA INTERVENTORIA

21	<b>FUENTE DE RECURSOS</b> (Indicar CDP Y RP)	REGALIAS. CDP: 210241
22	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$479.986.500,00</b>
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>NA</b>
	<b>VALOR FINAL</b>	<b>\$ 479.986.500,00</b>
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	13/09/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	0
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	12/12/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	12/12/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>\$ 284.462.936,48</b>
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	59,26%

### REGISTRO FOTOGRÁFICO



### PROYECTOS DE PAVIMENTOS

BPIN	ESTRUCTURA	SECTOR	OBRA	INTERVENTORÍA
2019860010016	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO OBRERO ETAPA II		
2019860010029	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIOS JARDINES DE BABILONIA Y LA UNION		
2019860010030	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO PRIMERO DE ENERO		
2019860010032	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO SAN ANDRES	9677-PPAL001-366-2021	9677-PPAL001-555-2021
2019860010022	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	CALLE 1A SUR ENTRE CEMENTERIO Y CRA 8 VIA PASTO		
2019860010013	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	CENTRO POBLADO EL PEPINO		
2019860010034	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO VENECIA		
2019860010011	Optimización y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario	Barrios Bajo Cañaveral y Prado Norte	9677-PPAL001-378-2021	9677-PPAL001-551-2021
2019860010037	CANALIZACION EN TUBERIA DE AGUAS	EN EL BARRIO EL CARMEN		

	LLUVIAS Y SANITARIAS			
2019860010021	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO PIÑAYACO	9677-PPAL001-399-2021	
2019860010025	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	BARRO PEÑON ENTRE QUEBRADA LAS PALMAS		
2019860010020	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO EL DORADO	9677-PPAL001-407-2021	
2019860010035	Pavimento rígido	VILLA DIANA		
2019860010039	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	CONDOMINIO NORTE	9677-PPAL001-492-2021	
2019860010026	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	URBANIZACIÓN VILLA CAIMARON QUINTA PAREDES	9677-PPAL001-518-2021	
2019860010040	PAVIMENTACIÓN	NUEVA ESPERANZA: CRUCE VÍA NAL MOCOCA - PITALITO	9677-PPAL001-549-2021	
2019860010017	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	URBANIZACIÓN CAIMARON		
2019860010019	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	BARRIO VILLA DANIELA	9677-PPAL001-554-2021	
2019860010036	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO JARDINES DE BABILONIA		
2019860010002	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	ANILLO VIAL MIRAFLORES - LA LOMA	9677-PPAL001-636-2021	
2019860010033	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO QUINTA PAREDES		
2019860010027	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO JOSE HOMERO Y VILLA DE LEIVA	9677-PPAL001-532-2021	9677-PPAL001-774-2021
2019860010028	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	CIUDELA DEPORTIVA:		
2019860010024	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	URBANIZACIÓN QUINTAS DE LA COLINA	9677-PPAL001-1113-2021	
2019860010031	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO	BARRIO CHIPAROS	9677-PPAL001-550-2021	9677-PPAL001-969-2021
2019860010018	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO	CLL 29 ENTRE VÍA PITALITO Y VARIANTE SAN FRANCISCO	9677-PPAL001-900-2021	
2019860010009	CONSULTORÍA FAJAS PARALELAS RÍOS MULATO Y SANGOYACO	RÍO MULATO / RÍO SANGOYACO	9677-PPAL001-606-2021	9677-PPAL001-621-2021

### PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS

<b>1</b>	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOCA – PUTUMAYO
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-378-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR OBRAS DE RECUPERACION, PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERÍA DE AGUAS LLUVIAS Y SANÍTIARIAS EN EL BARRIO EL CARMEN Y LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA CRA 9 CON LA PROYECCIÓN DE LA CLL 24 BARRIOS BAJO CAÑAVERAL Y PRADO NORTE EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0212 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.258.851.707,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.258.851.707,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (1 Mes) (18/05/2021 al 17/06/2021). SUSPENSION 02 (1 Mes) (18/06/2021 al 17/07/2021)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/08/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/01/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	JAVIER GUSTAVO OSPINA APRAEZ
14	<b>AVANCE FISICO</b>	95,11%

15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.120.478.442,00
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	89,01%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	PENDIENTE POR CONSTRUIR UN POZO INICIAL PENDIENTE APROX 50MS DE TUBERIA Y UNA CAMARA DE INSPECCION EN CARMEN EN CAÑABERAL FALTA UN POZO Y 30 MS DE TUBERIA EL SISTEMA QUEDO FUNCIONADO

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (18/05/2021 al 17/06/2021)
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30



**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-399-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS TRAMOS BARRIO PIÑAYACO EN EL TRAMO DE LA CALLE DE LA ZONA 4 DENOMINADA Z4-2A-28-3-4 Y BARRIO PEÑON EN EL TRAMO DE LA CALLE DE LA ZONA 5 DENOMINADA Z5-1-2B-3 Y LA QUEBRADA LAS PALMAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
---	----------------------------	--

4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0226 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 2.320.900.325,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 2.320.900.325,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	17/07/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (3 meses) (19/01/2022 al 18/04/2022)
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/01/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/04/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO NOMADAS DEL PUTUMAYO
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO NOMADAS DEL PUTUMAYO
14	<b>AVANCE FISICO</b>	97,30%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.674.992.379,41
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	72,17%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	PENDIENTE INTERVENCION DE APROX 50 MS EN ELBARRIO EL PEÑON SE EVIDENCIA EA ZONA CON ADOQUI EN REGULAR ESTADO
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00

	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (18/05/2021 al 17/06/2021)
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

30	
----	--

### PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
---	------------------	------------------

2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-407-2021</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL DORADO EN EL TRAMO DE LA CALLE ZONA 4 DENOMINADA Z4-14-15-16-17-18-19, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCION ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOYA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0226 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.017.658.395,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.017.658.395,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	27/04/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (1 Mes) (18/05/2021 al 17/06/2021) SUSPENSIÓN 02 (1 MES 8 DIAS) (6/12/2021 al 13/01/2022)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	26/09/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	13/01/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
14	<b>AVANCE FISICO</b>	100,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 896.078.421,00
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	88,05%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	PENDIENTE UNICAMENTE SEÑALIZACION VERTICAL SE ENCUENTRAN CONCRETOS EN BUEN ESTADO

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION N° 1 DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30



**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA – PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-492-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIA URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS TRAMOS DE LA ZONA Z5-30 CLL 30 CONDOMINIO NORTE ENTRE CRA 10 Y CRA 13 Y Z5-31 DIAGONAL CLL 30 CONDOMINIO NORTE ENTRE CRA 10 Y CRA 11 Y TRAMO I (CLL 19 ENTRE QUEBRADA LAS PALMAS Y AV. COLOMBIA A), TRAMO IV (CLL 19 ENTRE QUEBRADA LAS PALMAS Y AV. COLOMBIA A), TRAMO V (CRA 7A ENTRE CLL 18 Y CLL 19A), TRAMO VI (CLL 19 ENTRE QUEBRADA LAS PALMAS Y AV. COLOMBIA A) Y TRAMO IX (CLL 20 COMFAMILIAR ENTRE AV. COLOMBIA Y CRA 11A) DE LOS BARRIOS VILLA DIANA Y COMFAMILIAR RESPECTIVAMENTE, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOYA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0220 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 2.824.604.874,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 2.824.604.874,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	6/07/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	5/01/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	5/01/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO VIAS DE MOCOYA
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO VIAS DE MOCOYA
14	<b>AVANCE FISICO</b>	15,45%



15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 432.142.326,98
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	15,30%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	TIENEN 2 PBIN BARRIO VILLA DIANA FALTO SUMIDEROS REALIZARON PAVIMENTO BORDILLO ANDEN CONDOMINIO NORTE NO SE INTERVINO NADA LA ACTIVIDAD ERA REPOSICION DE ALCANTARILLADO, PERO NO HAY ALCANTARILLADO Y NO HAY ITEM DE TUBERIA NUEVA  EN CONDOMINIO NORTE NO HICIERON INTERVENCIONES POR LO MISMO

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION N° 1 DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30

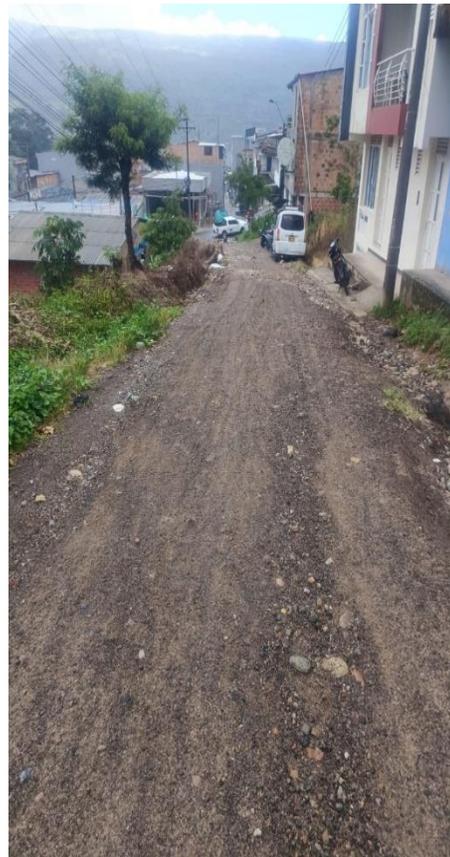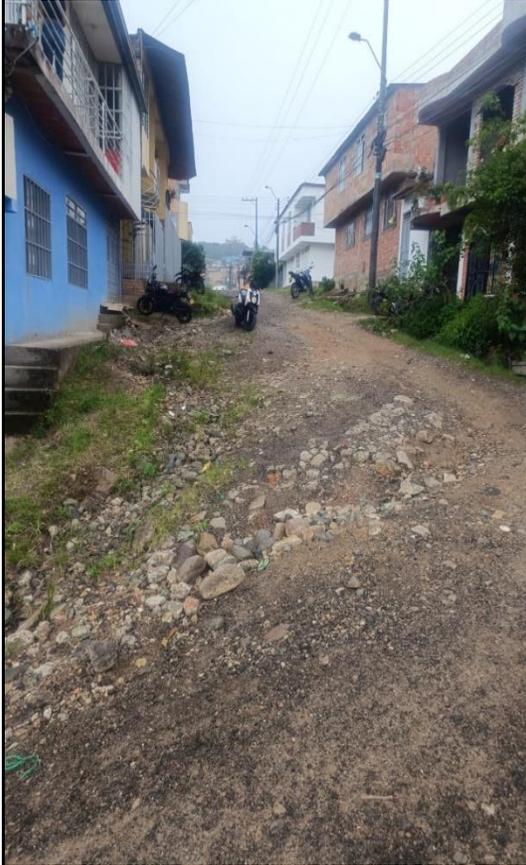

**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

<b>1</b>	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA – PUTUMAYO
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-518-2021**

<b>3</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA URBANIZACIÓN VILLA CAIMARON CLL 15 Y SECTOR QUINTA PAREDES ENTRE CRA 13 Y CRA 17, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
----------	----------------------------	---

4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOYA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0220 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.206.210.066,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.206.210.066,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (1 MES) (18/05/2021 al 17/06/2021)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/11/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/11/2021
11	<b>EJECUTOR</b>	UNION TEMPORAL CAIMARON
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL CAIMARON
14	<b>AVANCE FISICO</b>	100,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.085.589.059,00
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	90,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	SE ENCUENTRA TERMINADO 100% INCLUISA LA SEÑALIZACION
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A

	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION N° 1 DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

30	
----	---

### PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-549-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE VIAS AFECTADAS POR LLUVIA TORRENCIAL MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CRUCE DE VÍA NACIONAL MOCOA - PITALITO ENTRADA A LA VEREDA NUEVA ESPERANZA HASTA FINALIZAR EN LA ABSCISA K1+132,92 DE LA VEREDA NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE AGREDA DE MOCOA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0222 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.830.025.649,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.830.025.649,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	16/07/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	OTROSI N° 1 PRORROGA SESENTA (60) DIAS, DEL 4/12/2021 AL 03/04/2022 OTROSI N° 2 PRORROGA CUARENTA Y CINCO (45) DIFINALIZACION 18/05/2022.
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 01 (1 mes 28 dias) (4/12/2021 al 31/01/2022)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	5/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO MOAC
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora

13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO MOAC
14	<b>AVANCE FISICO</b>	100,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.629.365.779,39
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	89,04%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	SE ENCUENTRA TERMINADO SE ENVIDENCIA FALTA DE MANTENIMIENTO EN CUNETAS

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION N° 1 DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30	
----	--

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS</b>		
<b>1</b>	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOCA – PUTUMAYO
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-554-2021</b>		
<b>3</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS TRAMOS CRA 14 URBANIZACIÓN CAIMARON ENTRE CLL 11 QUEBRADA LOS PINOS Y CLL 12, BARRIO VILLA DANIELA EN EL TRAMO DE LA CALLE ZONA 4 DENOMINADA Z4-7A-7B-8-1011 Y EN LAS ZONAS Z5-27 CRA 18 URBANIZACIÓN JARDINES DE BABILONIA ENTRE CLL 27 Y CLL 28 URBANIZACIÓN JOSÉ E. M. Y Z5-28 CLL 28 URBANIZACIÓN JOSÉ E. M. ENTRE CRA 18 Y AV. SAN FRANCISCO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
<b>4</b>	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOCA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
<b>5</b>	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0223 DE 13/01/2021. REGALIAS
<b>6</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 2.696.280.960,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 2.696.280.960,00
<b>7</b>	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021

8	<b>No. PRORROGAS</b>	OTROSI N° 1 PRORROGA CUATRO (4) MESES, FINALIZACION 18/05/2022.
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 1, UN (1) MES, 18/05/2021 AL 17/06/2021. SUSPENSION 2, UN (1) MES CUTRO (4) DIAS, 10/5/2022 AL 13/06/2022
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	22/06/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO ORC
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO ORC
14	<b>AVANCE FISICO</b>	42,95%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.070.346.911,71
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	39,70%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	ETAPA TIENEN 3 FRENTE DE TRABAJO CADA UNO CON UN BPIN- EN LOS TRAMOS DE JARDINES DE BABILONOAY CAIMARONES 0% POR QUE DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ESTAN HACER LA REPOSIICCOON DE ALCANTARILLADO FLUVIAL Y SANITARIO Y ALLI NO HAY ALCANTARILLADO VILLA DANIELA SE INTERVINO EL 100% VERIFICAR EL PORCENTAJE TOTAL
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION N° 1 DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

<b>1</b>	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-636-2021**

<b>3</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, REQUERIDAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MEDIANTE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN EL ANILLO VIAL MIRAFLORES LA LOMA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
----------	----------------------------	---

4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0223 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.253.593.696,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.253.593.696,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	26/04/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (2 Meses) FINALIZA 09MARZO2022
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 1, UN (1) MES, 18/05/2021 AL 17/06/2021. SUSPENSION 2, QUINCE (15) DIAS, 18/6/2021 AL 2/07/2021
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	25/11/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	9/03/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO PAVIMENTOS CAPITAL
14	<b>AVANCE FISICO</b>	97,54%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.050.996.471,94
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	83,84%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	ETAPA "FALTA SEÑALIZACION SE CAMBIO MURO EN CONCRETO X MURO EN GAVIONES FALTO 25MS DE ANDEN VERIFICAR EL MURO PORQUE LA COMUNIDAD INFORMA QUE FALTO UN TRAMO DE MURO

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-551-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTER 5HG
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.023.899.800,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	19/04/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	PRORROGA 01 (4 meses) (18/01/2022 al 18/05/2022)
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION N° 1 DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	18/12/2021
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	18/05/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30



**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

<b>1</b>	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
<b>2</b>	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-366-2021**

<b>3</b>	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LOS BARRIOS JARDINES DE BABILONIA Y LA UNION EN LAS ZONAS Z5-21 EN CLL 27 ENTRE AV. COLOMBIA Y LOS TRAMOS CLL 1A SUR ENTRE CEMENTERIO Y CRA 8 VÍA PASTO, CRA 18 Y Z5-23 EN LA CRA 11 ENTRE CLL 25 Y CLL 27, CLL 17 ENTRE CRA 14 Y CRA 18 BARRIO PRIMERO DE ENERO, CRA 7 ENTRE CLL 3 Y CLL 1 BARRIO VENECIA, BARRIO OBRERO ETAPA II Z4-30 EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE LA CLL 15 ENTRE CRA 16 Y CRA 17, Y LA CLL 15 ENTRE CRA 15 Y CRA 16 , CRA 12 B ENTRE CLL 3 SUR Y CLL 6 SUR BARRIO SAN ANDRÉS Y LA VÍA DEL CENTRO POBLADO EL PEPINO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
<b>4</b>	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
<b>5</b>	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210210 DE 13/01/2021. REGALIAS
<b>6</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 8.272.681.997,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 8.272.681.997,00

7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	17/06/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 1 UN (1) MES 28/02/2022 AL 27/03/2022. SUSPENSION 2 DOS (2) MESES 12/05/2022 AL 11/07/2022 SUSPENSION 03 (2 Meses) (12/07/2022 al 11/09/2022) SUSPENSION 04 (03 Meses) (12/09/2022 al 11/12/2022) SUSPENSION 05 (04 Meses) (16/12/2022 al 15/04/2023)
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	16/04/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	15/04/2023
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO VÍAS MOCOA 040
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO VÍAS MOCOA 040
14	<b>AVANCE FISICO</b>	36,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 2.229.761.239,42
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	26,95%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITAMNTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-555-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVIAS
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0227 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 567.850.150,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 567.850.150,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	17/06/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	OTROSI No 1 VENCE 18/05/2022
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	SUSPENSION 1, UN (1) MES 28/02/2022 AL 27/03/2022. SUSPENSION 2, DOS (2) MESES 12/05/2022 AL 11/07/2022
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	16/04/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	15/04/2023
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%

29

SUPERVISOR

ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30



**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-532-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS TRAMOS VÍA CIUDADELA DEPORTIVA ENTRE CLL 12 Y CRA 7, Y CRA 6 ENTRE CLL 4 BARRIO JOSE HOMERO Y CLL 7 SUR URBANIZACIÓN VILLA DE LEIVA 11A Y CLL 2 SUR ENTRE CRA 2 COLINAS DEL SUR Y CRA 8, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOYA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0209 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 4.268.718.305,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 4.268.718.305,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	8/07/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	7/03/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	7/03/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOYA
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO PAVIMENTOS MOCOYA
14	<b>AVANCE FISICO</b>	61,86%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.342.480.544,68
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	31,45%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL

18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	ETAPA BARRO JOSE HOMERO NO REALIZO NINGUNA INTERVENCION BARRIO QUITA PAREDES FALTAN SUMIDEROS, BORDILLOS ANDENES ALGUNAS PLACAS SE EVIDENCIA EXCAVACIONES PARA CAJAS CON ACEROS A LA VISTA CON ALTOS RIESGOS DE ACCIDENTES SE EVIDENCIA EXCAVACIONES PARA ALCANTARILLAS SIN TAPAS CON ACERO A LA VISTA EN MITAD DE VIA

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-774-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 495.382.720,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 495.382.720,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	8/07/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	0
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	7/03/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	7/03/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30



**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO 9677-PPAL001-1113-2021**

3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA URBANIZACIÓN QUINTAS DE LA COLIÑA, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
---	----------------------------	---

4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOYA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0209 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 2.435.079.371,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 2.435.079.371,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	SIN ACTA DE INICIO
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	N/A
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	N/A
11	<b>EJECUTOR</b>	MEGACONSTRUCCIONES SAS
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	MEGACONSTRUCCIONES SAS
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 0,00
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	ETAPA NO SE DIO INICIO A ACTIVIDADES, EL CONTRATO REQUIERE DE REPOSICION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FLUVIAL Y SANITARIO Y EL AREA A INTERVENIR NO TIENEN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-774-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS

22	VALOR INICIAL	\$ 495.382.720,00
	VALOR ADICIÓN	N/A
	VALOR FINAL	\$ 495.382.720,00
23	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	8/07/2021
24	No. PRORROGAS	0
25	No. SUSPENSIONES	0
26	FECHA FINALIZACIÓN INICIAL	7/03/2022
	FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL	7/03/2022
27	VALOR PAGADO	\$ -
28	AVANCE FINANCIERO	0,00%
29	SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		
30		

<b>PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS</b>		
1	MUNICIPIO	MOCOA - PUTUMAYO
2	ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-550-2021</b>		
3	OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO CHIPAROS, ZONA COMPRENDIDA EN LA Z5-34A-34B CLL BARRIO LA RESERVA ENTRE VÍA A PITALITO Y LÍMITE DE ZONA 5 (A) , EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0211 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 1.282.799.166,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 1.282.799.166,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	17/09/2021
8	<b>No. PRORROGAS</b>	N/A
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	N/A
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	17/05/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	17/05/2022
11	<b>EJECUTOR</b>	DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora
13	<b>CONTRATISTA</b>	DIEGO DAVID MELO CAMPIÑO
14	<b>AVANCE FISICO</b>	90,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 1.045.254.151,80
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	81,48%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	ETAPA POSTCONTRACTUAL
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	ETAPA SE EVIDENCIA INERVENCIÓN DEL TRAMO ASIGNADO SIN MAYORES NOVEDADES OBJETO TERMINADO
<b>CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-969-2021</b>		
20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA PAVIMENTOS 063
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 485.377.195,00

	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 485.377.195,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	17/09/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	0
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	16/09/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	16/09/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30	
----	--

**PROYECTO OBRAS DE MITIGACION PAVIMIENTOS**

1	<b>MUNICIPIO</b>	MOCOA - PUTUMAYO
---	------------------	------------------

2	<b>ANTECEDENTES QUE DAN ORIGEN AL PROYECTO</b>	MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADO MEDIANTE DECRETO No. 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) DEL DECRETO No. 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
<b>CONTRATO 9677-PPAL001-900-2021</b>		
3	<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CLL 29 ENTRE VÍA PITALITO Y VARIANTE SAN FRANCISCO, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA N° 176 DEL 12 DE AGOSTO DE 2018, PRORROGADA MEDIANTE DECRETO N° 027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2019, Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE) ESTABLECIDO EN EL DECRETO N° 141 DEL 12 DE AGOSTO DE 2019 DE RETORNO A LA NORMALIDAD DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
4	<b>ALCANCE (Breve Descripción)</b>	REALIZAR CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL OBJETO CONTRACTUAL, CUMPLIENDO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA HA ESTABLECIDO PARA TAL FIN Y ACORDE CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CONSULTORÍA NO. 062 DEL 28 DE MARZO DE 2017, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOCOYA Y EL ING. MIGUEL HORACIO ROBLES, CUYO OBJETO FUE ESTUDIOS, DISEÑOS Y AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE MOCOYA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
5	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°21-0211 DE 13/01/2021. REGALIAS
6	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 6.240.520.933,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 6.240.520.933,00
7	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	31/05/2022
8	<b>No. PRORROGAS</b>	0
9	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
10	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	31/05/2023
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	31/05/2023
11	<b>EJECUTOR</b>	CONSORCIO VÍAS 897
12	<b>CONTRATANTE</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal, identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora

13	<b>CONTRATISTA</b>	CONSORCIO VÍAS 897
14	<b>AVANCE FISICO</b>	0,00%
15	<b>VALOR PAGADO</b>	0,00%
16	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
17	<b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>	N/A
18	<b>No. POBLACION BENEFICIARIA</b>	58.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE
19	<b>OBSERVACIONES RELEVANTES</b>	NO SE INICIO EL CONTRATO MANIFIESTAN INCONVENIENTES EN LOS DISEÑOS Y SITUACION PREDIAL NO APROBADA

**CONTRATO INTERVENTORÍA 9677-PPAL001-969-2021**

20	<b>CONTRATISTA INTERVENTORÍA</b>	CONSORCIO INTERVENTORÍA PAVIMENTOS 063
21	<b>FUENTE DE RECURSOS (Indicar CDP Y RP)</b>	CDP N°210232 DE 13/01/2021. REGALIAS
22	<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 485.377.195,00
	<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
	<b>VALOR FINAL</b>	\$ 485.377.195,00
23	<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	17/09/2021
24	<b>No. PRORROGAS</b>	0
25	<b>No. SUSPENSIONES</b>	0
26	<b>FECHA FINALIZACIÓN INICIAL</b>	16/09/2022
	<b>FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL</b>	16/09/2022
27	<b>VALOR PAGADO</b>	\$ -
28	<b>AVANCE FINANCIERO</b>	0,00%
29	<b>SUPERVISOR</b>	ORDENADOR DEL GASTO

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

30		
----	--	--

(...)

**“5. ¿Cuál es el estado actual de los proyectos de vivienda urbana y rural nueva? ¿Cuáles eran los plazos iniciales de ejecución de estos proyectos? ¿A qué se deben los retrasos?”**

**Respuesta:** Referente al estado actual de los proyectos de vivienda urbana y rural contemplados a ejecutar en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, nos permitimos dar respuesta a continuación:

No	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO RESUMEN	NUMERO DE CONVENIO/CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
1	PUTUMAYO	MOCOA	CONSTRUCCION DE 300 VIVIENDAS URBANAS  “SAUCES I”	Convenio: 9677- PPAL001-217-2017  Contrato de obra: 9677-PPAL001-245- 2017  Contrato de Interventoría: 9677- PPAL001-252-2017	12 meses	Vigente  Terminado y entregado
No	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO RESUMEN	NUMERO DE CONVENIO/CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
2	PUTUMAYO	MOCOA	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA URBANA SAUCES II - MOCOA	Convenio: 9677- PPAL001-217-2017  Contrato de obra: 9677-PPAL001-243- 2018  Contrato de Obra: 9677-PPAL001-244- 2018  Contrato de Interventoría:	12 meses	Dificultades: Predio expropiado, Presuntos incumplimientos, sanciones a contratistas de obra, multas, cesiones de los contratos, arreglo directo. Presuntas debilidades en el seguimiento de la interventoría.  CONVENIO EN EJECUCIÓN Y SU CONTRATACIÓN DERIVADA EN LIQUIDACIÓN.  - El convenio se encuentra en trámite de prórroga e incorporación de recursos para impulsar el proyecto.  - La contratación derivada (9677- PPAL001-243- 2018 y 9677- PPAL001-244-

No	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO RESUMEN	NUMERO DE CONVENIO/CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
				9677-PPAL001-277-2018		2018) se encuentra en proceso de cierre y liquidación para la liberación de recursos.
<u>3</u>	PUTUMAYO	MOCOA	CONSTRUCCION 87 UNIDADES DE VIVIENDA URBANA  "SAUCES III"	9677-PPAL001-783-2020	N/A	EN LIQUIDACIÓN  Dificultad: El Municipio No Entregó Predio Para El Proyecto.
No	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO RESUMEN	NUMERO DE CONVENIO/CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
<u>4</u>	PUTUMAYO	MOCOA	CONSTRUCCION 36 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL  PROYECTO DISPERSO	Convenio: 9677-PPAL001-668-2017  Contrato de obra: 9677-PPAL001-1737-2021  Contrato de Interventoría: 9677-PPAL001-1843-2021	8 meses	EN LIQUIDACIÓN  Dificultad: Contratos terminados. Por fenecimiento de su plazo contractual. Doce viviendas terminadas y entregadas. Quedó Pendiente la ejecución de 24 viviendas
<u>5</u>	PUTUMAYO	MOCOA	CONSTRUCCION 216 UNIDADES DE VIVIENDA RURAL  PROYECTO NUCLEADO (PLANADAS)	Convenio: 9677-PPAL001-668-2017  Contrato de obra: 9677-PPAL001-225-2019  Contrato de Interventoría: 9677-PPAL001-270-2019	3 meses	EN LIQUIDACIÓN  Estado actual: Estudios y diseños al 100%.  Dificultad: Predio con asentamientos humanos. El proceso de contratación se fue desierto, no se adjudicó ningún contrato.

No	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	PROYECTO RESUMEN	NUMERO DE CONVENIO/CONTRATO	PLAZO INICIAL	ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

**6. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de estudios, diseños y construcción de la nueva Plaza de Mercado? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?"**

**Respuesta:**

### **PLAZA DE MERCADO**

Para la ejecución de la actividad del PAE denominada: "CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO", el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-812-2017:

<b>Convenio No:</b>	<b>9677-PPAL001-812-2017</b>
<b>Objeto:</b>	"EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (PROSPERIDAD SOCIAL) se comprometen, a: "ARTICULAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MOCOA, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
<b>Convenientes:</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
<b>Valor Inicial:</b>	\$6.000.000.000 Aporte por parte de DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
<b>Valor Final:</b>	\$6.000.000.000

<b>Plazo:</b>	Treinta (30) meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	14 de diciembre de 2017
<b>Fecha de Terminación:</b>	13 de junio de 2020
<b>Estado Actual:</b>	Finalizado por expiración de plazo

El FNGRD en cumplimiento del numeral 1 de la Cláusula Cuarta del convenio, realizó la adquisición por vía de expropiación administrativa del predio con escritura pública número 502 de 2018 y matrícula inmobiliaria número 440-48513 a la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA MONICA por un valor de Cuatrocientos Millones de Pesos M/Cte. (\$400.000.000), con un área de 2 hectáreas.

En cuanto a la contratación derivada del Convenio, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres suscribió los siguientes contratos:

■ **Contratación derivada:**

<b>Contrato de Obra No.:</b>	<b>9677-PPAL001-255-2018</b>
<b>Objeto:</b>	<i>“Realizar los estudios y diseños, así como lo construcción de las obras complementarias de la plaza de mercado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, adelantados en el marco de lo declaratorio de calamidad pública No.056 prorrogado por el Decreto 772 del Municipio de Mocoa y 068 prorrogado por el Decreto 247 de 2017 del Departamento del Putumayo, declaratorio de situación de desastre en el municipio de Mocoa No.599 de 2017 prorrogado mediante Decreto No. 606 de 2018 y en el marco del desarrollo del convenio 9677-PPAL0011-812-2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – Fiduprevisora S.A., y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS-, y conforme con el Anexo técnico Especificaciones técnicas Plaza de Mercado”</i>
<b>Valor Inicial:</b>	\$1.687.684.080
<b>Valor Final:</b>	\$1.687.684.080
<b>Contratista:</b>	TRAIING TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S., representado legalmente por ALEXIS JAVIER MAYORGA.
<b>Plazo:</b>	Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Prórroga de 12 meses y 45 días
<b>Fecha de Inicio:</b>	28 de junio de 2018
<b>Fecha de Terminación:</b>	12 de febrero de 2020
<b>Valor ejecutado</b>	\$1.210.804.103,00

<b>Estado actual:</b>	Finalizado con acta de entrega y recibo final.
-----------------------	--

<b>Contrato de Interventoría No.:</b>	<b>9677-PPAL001-301-2018</b>
<b>Objeto:</b>	<i>“Realizar la Interventoría integral (técnica, administrativa, contable, financiera, ambiental, social y jurídica) al contrato de obra 9677-PPAL001- 255-2018, que tiene por objeto: "Realizar los estudios y diseños, así como lo construcción de las obras complementarias de lo plaza de mercado en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo, adelantados en el marco de lo declaratorio de calamidad pública No.056 prorrogado por el Decreto 772 del Municipio de Mocoa y 068 prorrogado por el Decreto 247 de 2017 del Departamento del Putumayo, declaratorio de situación de desastre en el municipio de Mocoa No.599 de 2017 prorrogado mediante Decreto No. 606 de 2018 y en el marco del desarrollo del convenio 9677-PPAL0011- 812-2017, suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - Fiduprevisora S.A., y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - DPS-, y conforme con el Anexo técnico Especificaciones técnicas Plaza de Mercado”.</i>
<b>Valor Inicial:</b>	\$228.409.063
<b>Valor Final:</b>	\$311.009.478
<b>Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL ROCA - VILLÁN, representado legalmente por LUIS HERNANDO RONDÓN RAMÓN.
<b>Plazo:</b>	Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Prórroga de 12 meses y 45 días
<b>Fecha de Inicio:</b>	28 de junio de 2018
<b>Fecha de Terminación:</b>	12 de febrero de 2020
<b>Valor ejecutado</b>	\$311.009.478
<b>Estado actual</b>	Finalizado con informe final

De acuerdo con el acta de recibo final de fecha 29 de junio de 2020, el estado de ejecución del contrato es el siguiente:

**“ETAPA 1:**

**ESTUDIOS Y DISEÑOS:** *Se realiza el diseño de la nueva plaza de mercado del municipio de Mocoa el cual se implanta en el terreno disponible para la reubicación de la plaza de mercado actual; para lo cual se hizo entrega a la entidad contratante de los siguientes volúmenes:*

**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA GALERÍA:**

**HITO 1:**

- **VOLUMEN I – RECOPIACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.** (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%

**HITO 2:**

- **VOLUMEN II – TOPOGRAFÍA.** (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN III – GEOLOGÍA, GEOTÉCNICA, HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA.** (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN IV – DISEÑO ARQUITECTÓNICO.** (Radicado No. 2019ER10041 de fecha 11 de septiembre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN V – DISEÑO ESTRUCTURAL.** (Radicado No. 2019ER11562 de fecha 21 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN VI – DISEÑO VÍAS.** (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN VII – DISEÑO ELÉCTRICO.** (Radicado No. 2019ER11375 de fecha 15 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN VIII – DISEÑO HIDROSANITARIO.** (Radicado No. 2019ER12063 de fecha 01 de noviembre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN IX – DISEÑO RED DE SUMINISTRO DE GAS.** (Radicado No. 2019ER11376 de fecha 15 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN X – ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE OBRA, PRESUPUESTO DE OBRA Y APUS.** (Radicado No. 2019ER11825 de fecha 28 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN XI – ESTUDIO AMBIENTAL – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO y SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** (Radicado No. 2019ER03923 de fecha 17 de abril de 2019 Y Radicado No. 2019ER09688 de fecha 03 de SEPTIEMBRE de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN XII – CERTIFICADO DE FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO.** (Radicado No. 2019ER09687 de fecha 03 de septiembre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN XIII – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** (Radicado No. 2019ER11378 de fecha 15 de octubre de 2019) - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN XIV – INFORME FINAL.** - EJECUTADO AL 100%
- **VOLUMEN XV – LICENCIAS Y PERMISOS APROBADOS.** (NOTA 1: Se hizo entrega del permiso de vertimientos emitido por CORPOAMAZONIA, del permiso para la acometida de la red eléctrica hasta el sitio emitido por la Empresa de Energía del Putumayo, del permiso de intervención de la vía terciaria emitida por PLANEACIÓN MUNICIPAL DE MOCOYA. NOTA 2: Por causas ajenas a los intervinientes del proceso contractual: a) el permiso de INVIAS no fue posible tramitarlo dado que ésta entidad exigía un alcance de obra por fuera de los estándares presupuestales del proyecto, b) la Licencia de construcción requerida ante el municipio de MOCOYA no fue emitida a pesar del cumplimiento a cada uno de los requerimientos exigidos por ésta entidad. - EJECUTADO AL 100% DE ACUERDO CON EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LA SUPERVISIÓN.

**ETAPA 2:**

**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS:**

- **COMPONENTE I - PROLONGACIÓN DE LA RED EXISTENTE DE ACUEDUCTO HASTA SITIO DE PROYECTO:** *Consistió en la construcción de la red de acueducto desde el punto de conexión frente a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY PLACIDO hasta el sitio del proyecto en una longitud de 758.10m en tubería presión PVC unión mecánica D=3", construcción de un paso elevado, instalación de 4 válvulas ventosas, instalación de 4 válvulas de purga, instalación de 1 hidrante, excavaciones y rellenos con material de sitio y material seleccionado, instalación de colchón de arena y retiro de escombros provenientes de las excavaciones.*
- **COMPONENTE II: SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO:** *Consistió en la construcción de la red de alcantarillado sanitario en tubería NOVAFORT D=8" en una longitud de 171.07m, la construcción de 4 cámaras de inspección entre 2m y 4m altura en diámetros de 1.2m, llegando hasta el punto de conexión de la PTAR según diseño, adicionalmente se realizó la adecuación del terreno hasta niveles arquitectónicos mediante excavaciones mecánicas, se realizó la instalación de rellenos con material del sitio, instalación de colchón de arena y retiro de material sobrante.*
- **COMPONENTE III: SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL:** *Consistió en la construcción de la red de alcantarillado pluvial en tubería NOVAFORT D=12" en una longitud de 99.84m, NOVAFORT D=18" en una longitud de 18.99m, NOVAFORT D=27" en una longitud de 36.52m, NOVAFORT D=30" en una longitud de 96.50m; la construcción de 5 cámaras de inspección entre 2m y 5m en diámetros de 1.2m y 1.5m; la construcción de un cabezal de descarga con dissipador hasta el punto de entrega de la fuente hídrica aledaña al sitio del proyecto por el costado SUR, adicionalmente se realizó la adecuación del terreno hasta niveles arquitectónicos mediante excavaciones mecánicas, se realizó la instalación de rellenos con material del sitio, instalación de colchón de arena y retiro de material sobrante.*
- **COMPONENTE IV: ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RED DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO:** *Consistió en la construcción de la red de media y baja tensión y alumbrado público al servicio del proyecto y la instalación de la red provisional eléctrica según diseños.*
- **COMPONENTE V: CONFORMACIÓN Y ADECUACIÓN DE VÍA ALTERNA (placa en concreto, bordillos y andenes):** *Consistió en la estabilización de la rasante de la vía alterna y bahías; con pedraplén, subbase y base granular estabilizada e imprimada con emulsión RF-1 en una longitud de 115 m por 10 m de ancho.*
- **COMPONENTE VI: PLACA EN CONCRETO Y CORREDOR PEATONAL (anden):** *Consistió en la construcción de andenes, entrada peatona al margen izquierdo de la vía alterna de acceso en una longitud aproximada de 48 m, para ésta actividad se hizo necesaria la conformación del talud aledaño".*

Como resultado de los estudios y diseños contratados por el FNGRD mediante el contrato No. 9677- PPAL001-255-2018, se señaló que el presupuesto requerido para la construcción de la plaza de mercado sería por un valor de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE (\$18.976.637.030), es decir, más de un 68% de lo inicialmente estimado y del presupuesto aportado por el DPS.

En razón a esto y como gestión de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -UNGRD-, en aras de cumplir con el objeto del convenio y sobre todo por el beneficio de la comunidad de Municipio de Mocoa y el Departamento del Putumayo en general y la reactivación económica se remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante radicados del MHCP 1-2021-030179, 1-2021-064109 y 1-2021-085497 la solicitud de recursos con el fin de contar con el cierre financiero de este proyecto, a los cuales el Ministerio respondió de la siguiente forma:

"(...)

*Es de anotar, que una articulación interinstitucional, es de vital importancia para el Plan de Reconstrucción de Mocoa, teniendo en cuenta la diversidad de proyectos, ya que no solo se deben financiar obras de mitigación retención y estabilización, además se solicitan recursos para la ejecución de proyectos de vivienda urbana y rural, megacolegio y plaza de mercado, sumado a estos proyectos, también en la solicitud se incluyen costos equivalentes al 5.25% (\$14.590.491.818) de los recursos solicitados por concepto de: Costos Estructurales UNGRD.*

*Por lo anterior, en el desarrollo de una gestión interinstitucional, con entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) que cuenta con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entre otras, en el presupuesto de cada una de ellas consideren estas necesidades a través de proyectos de inversión, que surta los trámites pertinentes de registro en las herramientas tecnológicas del SUIFP y SPI del Departamento Nacional de Planeación –DNP, con el propósito de viabilizar y financiar proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura, esto según corresponda a la misión sectorial de cada entidad.*

*Igualmente, es importante señalar que, mediante el Decreto No.1805 del 31 de diciembre de 2020, se le asignaron a la UNGRD en el rubro de Atención de Desastres y Emergencias en el Territorio Nacional – Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres una apropiación de \$304.722 millones con recurso 10, para la vigencia fiscal 2021.*

*Así mismo, ante la situación que se ha presentado por la presencia del coronavirus en el territorio colombiano, el gobierno nacional ha tenido que priorizar los recursos del Presupuesto General de la Nación para hacer frente a la situación de crisis. De acuerdo con lo anterior y revisado el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de indicar que en la actualidad no existe apropiación presupuestal disponible que permita atender favorablemente los requerimientos de su entidad”.*

Mediante Resolución 3449 del 28 de diciembre de 2021 expedida por el del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se realizó asignación de presupuesto al FNGRD por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$333.042.560.274), asignados para la construcción de obras de mitigación y reducción de riesgos a nivel nacional, en los cuales se encuentran los proyectos derivados del plan de reconstrucción Mocoa que requieren cierre financiero para finalización de obras, con una asignación de presupuesto por valor de TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$310.861.589.863).

Con la asignación efectuada, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en su calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, el 01 de julio de 2022 designó un comité estructurador de conformidad con la normatividad vigente y el manual de contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD para la celebración de un Convenio Interadministrativo con fundamento en el artículo 95 la Ley 489 de 1998, con el objeto de adelantar la construcción de la plaza de mercado en el Municipio de Mocoa Putumayo.

Fue así como el 15 de julio de 2022, se suscribió con el municipio de Mocoa, el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-1103-2022, a través del cual las entidades aúnan esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para adelantar la construcción de la plaza de mercado en el Municipio de Mocoa Putumayo, el cual se discrimina a continuación:

<b>Convenio No.:</b>	<b>9677-PPAL001-1103-2022</b>
----------------------	-------------------------------

<b>Objeto:</b>	<i>“AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA PUTUMAYO EN CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SNGRD”.</i>
<b>Convenientes:</b>	FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (FNGRD) Y MUNICIPIO DE MOCOYA
<b>Valor Inicial:</b>	\$21.375.332.244,29 Aportados por el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. <ul style="list-style-type: none"> <li>Aporte de predio identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 440-48513 ubicado en la Vereda el Diviso del Municipio de Mocoa, con un área de dos (2) hectáreas por valor de \$400.000.000.</li> </ul>
<b>Valor Final:</b>	\$21.375.332.244,29.
<b>Fecha de Suscripción:</b>	15/07/2022
<b>Plazo:</b>	Veinticuatro (24) meses
<b>Fecha de Inicio:</b>	16/08/2023
<b>Fecha de Terminación:</b>	15/08/2025
<b>Estado actual</b>	En Ejecución

**Actividades Adelantadas:**

- Luego de trece (13) meses, el 16 de agosto de 2023 el alcalde suscribió el acta de inicio del convenio, la cual fue remitida a la UNGRD vía correo electrónico el 5 de septiembre de 2023.

**Pendientes:**

- Generar la contratación derivada de obra e interventoría. Es pertinente indicar, que se desarrollaron sendos procesos de invitación, evaluación y selección en el mes de diciembre de 2023 y se encuentran pendientes de perfeccionar.
- Iniciar y ejecutar las obras.

**Cronograma Plan de Choque:**

- Se encuentra en trámite la contratación de Obra e Interventoría.

***“7. ¿Cuál es el estado actual del proyecto para la construcción del Megacolegio de Mocoa? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?”.***

**MEGACOLEGIO**

Para la ejecución de la actividad del PAE denominada: “CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO CIUDAD MOCOYA”, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Educación Nacional suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 9677-PPAL001-512-2017:

<b>Convenio No.:</b>	<b>9677-PPAL001-512-2017 (FNGRD)</b> <b>1303-2017 (MEN)</b>
<b>Objeto:</b>	<i>Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD y el Ministerio de Educación Nacional - MEN, para adelantar los estudios, diseños, construcción y dotación de la infraestructura educativa de carácter oficial en el marco de las Declaratorias de situación de Calamidad Pública Municipal y Departamental, mediante los Decretos 0056 del 01 de abril de 2017 y 0068 de 2017, respectivamente.</i>
<b>Convenientes:</b>	Ministerio de Educación Nacional - MEN Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FNGRD
<b>Inversión:</b>	\$19.255.065.328,00
<b>Beneficiarios:</b>	1.200 Estudiantes
<b>Tipo de intervención:</b>	Infraestructura Educativa
<b>Cantidad de Intervención:</b>	Una infraestructura educativa y su mobiliario, compuesta de las siguientes áreas: Bloques administrativo, de preescolar, primaria y bachillerato, laboratorios, comedor, portería, biblioteca, rampas y tanque de almacenamiento, completamente funcional.
<b>Avance Físico:</b>	100,00%
<b>Avance Financiero:</b>	68,39%
<b>Fecha de Terminación:</b>	07/04/2023
<b>Estado:</b>	Terminado

■ **Contratación derivada:**

<b>Contrato de Obra No.:</b>	<b>9677-PPAL001-225-2018</b>
<b>Objeto:</b>	<i>El contratista se obliga para con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FONDO a realizar la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DETALLADOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER OFICIAL, EN EL MUNICIPIO DE MOCOYA - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, acorde a los estudios</i>

	<i>previos, pliegos, anexos, oferta presentada por el contratista y demás documentos que hacen parte integral del contrato.</i>
<b>Contratista:</b>	CONSORCIO COLEGIO MOCOA
<b>Valor Inicial:</b>	\$8.500.000.000,00
<b>Plazo Inicial:</b>	11 meses: Preconstrucción: 3 meses Construcción y Dotación: 8 meses
<b>Fecha de Suscripción:</b>	25 de abril de 2018
<b>Fecha de Inicio:</b>	13 de noviembre de 2018
<b>Fecha de Terminación Inicial:</b>	12 de octubre de 2019
<b>Novedades:</b>	<p>Otrosí No. 1: Prórroga por 8 meses, hasta 12 de junio de 2020</p> <p>Suspensión No. 1: Por 3 meses, hasta 2 de abril de 2020.</p> <p>Suspensión No. 2: Por 3 meses, hasta 2 de julio de 2020.</p> <p>Otrosí No. 2: Adición por \$1.962.078.032,00 y Prórroga por 6 meses hasta 10 de junio de 2021.</p> <p>Suspensión No. 3: Por 1 mes, hasta 11 de junio de 2021.</p> <p>Suspensión No. 4: Por 2 meses, hasta 11 de agosto de 2021.</p> <p>Otrosí No. 3: Prórroga por 3 meses, hasta 30 de octubre de 2021.</p> <p>Suspensión No. 5: Por 2 meses, hasta el 19 de diciembre de 2021.</p> <p>Otrosí No. 4: Adición por \$6.714.662.434,00 y Prórroga por 6 meses hasta 30 de junio de 2022.</p> <p>Suspensión No. 6: Por 1 mes, hasta 22 de julio de 2022.</p> <p>Suspensión No. 7: Por 8 días, hasta 29 de julio de 2022.</p> <p>Suspensión No. 8: Por 1 mes, hasta el 3 de septiembre de 2022.</p> <p>Otrosí No. 5: Adición por \$700.000.000,00 y Prórroga por 3 meses hasta el 7 de diciembre de 2022.</p> <p>Otrosí No. 6: Prórroga por 1 mes, hasta el 7 de enero de 2023.</p>
<b>Fecha de Terminación Actualizada:</b>	7 de enero de 2023

<b>Valor Final:</b>	\$17.876.740.466,00
<b>Estado:</b>	En Liquidación

<b>Contrato de Interventoría No.:</b>	<b>9677-PPAL001-228-2018</b>
<b>Objeto:</b>	<i>INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DETALLADOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER OFICIAL, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA - DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.</i>
<b>Contratista:</b>	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.
<b>Valor Inicial:</b>	\$594.930.980,00
<b>Plazo Inicial:</b>	11 meses: Preconstrucción: 3 meses Construcción y Dotación: 8 meses
<b>Fecha de Suscripción:</b>	27 de abril de 2018
<b>Fecha de Inicio:</b>	13 de noviembre de 2018
<b>Fecha de Terminación Inicial:</b>	13 de octubre de 2019
<b>Novedades:</b>	<p>Otrosí No. 1: Prórroga por 8 meses, hasta 12 de junio de 2020</p> <p>Suspensión No. 1: Por 3 meses, hasta 1 de abril de 2020.</p> <p>Suspensión No. 2: Por 3 meses, hasta 1 de julio de 2020.</p> <p>Otrosí No. 2: Adición por \$137.329.530,00 y Prórroga por 6 meses hasta 10 de junio de 2021.</p> <p>Suspensión No. 3: Por 1 mes, hasta 11 de junio de 2021.</p> <p>Suspensión No. 4: Por 2 meses, hasta 11 de agosto de 2021.</p> <p>Otrosí No. 3: Adición por \$74.156.040,00 y Prórroga por 3 meses, hasta 30 de octubre de 2021.</p> <p>Suspensión No. 5: Por 2 meses, hasta el 19 de diciembre de 2021.</p> <p>Otrosí No. 4: Adición por \$469.315.420,00 y Prórroga por 6 meses hasta 30 de junio de 2022.</p>

	<p>Suspensión No. 6: Por 1 mes, hasta 21 de julio de 2022.</p> <p>Suspensión No. 7: Por 8 días, hasta 29 de julio de 2022.</p> <p>Suspensión No. 8: Por 1 mes, hasta el 3 de septiembre de 2022.</p> <p>Otrosí No. 5: Adición por \$102.523.872,00 y Prórroga por 3 meses hasta el 7 de diciembre de 2022.</p> <p>Otrosí No. 6: Prórroga por 1 mes, hasta el 7 de enero de 2023.</p>
<b>Fecha de Terminación Actualizada:</b>	7 de enero de 2023
<b>Valor Final:</b>	\$1.378.255.842,00
<b>Estado:</b>	En Liquidación

■ **Estado Actual:**

- ✓ La infraestructura se terminó y dotó al 100%.
- ✓ El 11 de diciembre de 2023 se suscribió el acta de entrega y recibo entre el MEN, municipio y FNGRD / UNGRD.
- ✓ El 5 de febrero de 2024 la Institución Educativa Ciudad Mocoa asumió la operación de la infraestructura educativa, de conformidad con la asignación que le hiciera la Secretaría Departamental de Educación, como ente certificado por el Ministerio de Educación Nacional, por lo que se encuentra al servicio de la comunidad estudiantil, en las modalidades de preescolar, primaria y secundaria, según se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico:







**“9. ¿Cuál es el estado actual del proyecto para la construcción de un nuevo Centro Penitenciario y Carcelario? ¿Cuál era el plazo inicial de ejecución de este proyecto? ¿A qué se deben los retrasos?”**

**CÁRCEL**

<b>Convenio No:</b>	<b>9677-PPAL001-1292-2021</b>
<b>Objeto:</b>	<i>Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para adelantar el proceso de adquisición del predio destinado a la construcción de un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional - ERON en el municipio de Mocoa, Putumayo, en cumplimiento de los objetivos del SNGRD.</i>
<b>PARTES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES QUIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A., EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA.</li> <li>● UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC.</li> <li>● INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.</li> <li>● MUNICIPIO DE MOCOA</li> </ul>
<b>Valor Inicial:</b>	\$1.529.258.925,00
<b>Aportes de las Partes del Convenio:</b>	<p>Clausula OCTAVA - APORTES DE LAS PARTES: Los aportes de las partes para la ejecución del convenio se realizarán de la siguiente manera:</p> <p><b>1. EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REPRESENTADO POR FIDUPREVISORA EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA</b></p>

**DEL REFERIDO PATRIMONIO** efectuará un aporte económico así:

**a) MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS M/CTE (\$1.257.921,000,00)**, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 21-0467 del 05 de febrero de 2021, los cuales deberán ser destinados de forma exclusiva a la compra del predio.

**b) CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$53.000.000,00)** de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 21-1163 del 02 de junio de 2021, los cuales serán destinados para los trámites de escrituración y registro de la adquisición y cesión del predio.

**2. LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC** efectuará un aporte en especie correspondiente a brindar apoyo logístico, técnico y administrativo, según su objeto institucional en la evaluación y cumplimiento de la normatividad penitenciaria y carcelaria para la ejecución del objeto del convenio; así como el acompañamiento requerido por el INPEC a fin de realizar la construcción efectiva del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional -ERON- en el municipio de Mocoa, Putumayo, posterior al proceso de cesión que el municipio de Mocoa realice a favor del INPEC.

**3. EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC** efectuará un aporte en especie de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE (\$214.437.925,00), será quien adquiera la titularidad del predio denominado “El Naranjito” mediante cesión a título gratuito llevada a cabo por el Municipio de Mocoa, el aporte en especie correspondiente a actividades técnicas, logísticas, jurídicas, financieras y administrativas en la ejecución del convenio por medio de profesionales calificados, en marcadas al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y la normatividad penitenciaria y carcelaria.

**4. EL MUNICIPIO DE MOCOA:** efectuara un aporte en especie por valor de tres millones novecientos mil pesos M/CTE (\$3.900.000,00), será quien realice la compra del predio destinado para la construcción del Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional, previa viabilidad remitida por el INPEC y USPEC, en desarrollo del proyecto, una vez superados los trámites administrativos de notariado y registro del predio denominado “El Naranjito”, el municipio de Mocoa realizará una cesión a título gratuito del predio en

	<p>mención a favor del INPEC. Además, efectuará un aporte inicial en especie correspondiente a actividades técnicas, logísticas, jurídicas, financieras, administrativas, de gestión y de supervisión en la ejecución del convenio por medio de profesionales calificados.</p> <p><b>NOTA:</b> <i>En caso de requerirse afectación presupuestal para el cumplimiento del convenio, se realizarán las gestiones financieras y presupuestales correspondientes para contribuir a la ejecución de este.</i></p>
<b>Fecha de Suscripción:</b>	26 de agosto de 2021
<b>Fecha de Inicio:</b>	19 de octubre de 2021
<b>Fecha de Terminación:</b>	18 de junio de 2022
<b>Estado Actual:</b>	En Liquidación

### Pendientes:

- Finalizar la liquidación del convenio, trámite que se adelanta desde el grupo de liquidaciones de la SRR.
- Se debe establecer la viabilidad de suscribir un nuevo convenio, con base en la manifestación del municipio, de que se cuenta con un predio propiedad del USPEC, en el cual es posible desarrollar el proyecto.

En mérito de lo anterior, la UNGRD da respuesta de fondo al requerimiento en el marco de las competencias establecidas para la Entidad, quedando atentos a cualquier inquietud que surja sobre el particular.

Cordialmente,

**ANA MARÍA CASTAÑO ÁLVAREZ**  
Jefe Oficina Asesora Planeación e Información

Anexo: Archivo Excel con PAE MOCO.A.  
Informe de Seguimiento y evaluación Plan de Acciones Especifico para la Reconstrucción de Mocoa - OAPI

Elaboró: Rodrigo Astros/ Contratista SRR – Correo electrónico 05 de marzo 2024  
Víctor Jiménez/ Contratista SRR– Correo electrónico 05 de marzo 2024  
Carlos Bautista/ Contratista SRR – Correo electrónico 05 de marzo 2024  
Carlos García/ Contratista SRR – Correo electrónico 05 de marzo 2024  
Alba Rocío Vargas Medica— Correo electrónico 05 de marzo 2024  
María del Pilar Cicua Pérez – Contratista FNGRD- SDG- comunicación 2024IE01531  
Soporte técnico:  
Ing. Carlos Mogollón - comunicación 2024IE01531  
Luisa Gómez - comunicación 2024IE01531

Revisó Jorge Buelvas / Profesional especializado SRR– Correo electrónico 05 de marzo 2024

Carlos García /Contratista SRR – Correo electrónico 05 de marzo 2024  
Yerky Garavito/ Contratista SRR. – Correo electrónico 05 de marzo 2024  
Gustavo Alonso Pérez – Asesor Jurídico SDG - comunicación 2024IE01531  
Consolidó: Adrián Felipe Palacios / Contratista OAPI  
Jenny Gaona /Contratista SRR– Correo electrónico 05 de marzo 2024  
Aprobó: Jesús Miguel García– Asesor Jurídico SDG - comunicación 2024IE01531  
Sneyder Pinilla Alvares. Subdirector General (E) - comunicación 2024IE01531
