

INVERSIONES INFRAESTRUCTURA SRR EN MAGDALENA

Noviembre 23 de 2022



GOBIERNO DE COLOMBIA



UNGRD

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

16

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA



TOTAL PROYECTOS

30

INVERSIÓN TOTAL

\$545.107 Millones

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

20

PROYECTOS EN
PERFECCIONAMIENTO

3

PROYECTOS TERMINADOS

7

POBLACIÓN BENEFICIADA

502.778

CONVENIOS INCLUIDOS EN
TOTAL DE PROYECTOS

2



MUNICIPIOS

16.1	Algarrobo	\$15.196
16.2	Algarrobo	\$23.749
16.3	Aracataca (Buenos Aires y Sampués Fase I)	\$6.830
16.4	Aracataca (Buenos aires y Sampués)	\$9.500
16.5	Aracataca (Buenos Aires y Sampués Fase II y III)	\$29.927
16.6	Aracataca (Cuenca media y baja)	\$42.748
16.7	Ariguani (Zona Urbana)	\$18.670
16.8	Ariguani (San José de Ariguani)	\$16.932
16.9	Cerro San Antonio (Fase I)	\$52.610
16.10	Cienaga	\$10.021
16.11	El Banco	\$15.199
16.12	El Reten Fase IV	\$17.667
16.13	El Reten Fase V y VI	\$18.980
16.14	El Reten Fase VI	\$18.725
16.15	Fundación*	\$9.499
16.16	Fundación Fase IV	\$6.510

16

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

MUNICIPIOS



16.17	Fundación (Caño el Riito)	\$12.000
16.18	Nueva Granada	\$14.226
16.19	Pijiño del Carmen	\$19.508
16.20	Pivijay	\$14.241
16.21	Plato	\$13.869
16.22	Salamina	\$28.500
16.23	Santa Bárbara de Pinto	\$4.700
16.24	Santa Marta	\$34.661
16.25	San Zenón	\$13.300
16.26	Sitionuevo*	\$9.878
16.27	Tenerife (Paño Real del Obispo Fase I)	\$4.749
16.28	Tenerife (Paño Real del Obispo Fase II)	\$23.595
16.29	Zona Bananera	\$19.761
16.30	Zona Bananera	\$19.356

* Convenio incluido en total de proyectos

16.1

ADECUACIÓN DE LA SECCION HIDRÁULICA DEL RIO ARIGUANI, COMO MEDIDA DE CONTROL DE INUNDACIONES

Municipio de Algarrobo, departamento de Magdalena

Obras de control de inundación

Proyecto Finalizado



Antes

En **desarrollo del proyecto** se realizó la ejecución de 472.730,50 m³ de excavación con maquinaria y 408.406,07 m³ de construcción de diques compactados, suministro e instalación de geocontenedores rellenos con material del sitio de 4 niveles en los rompederos según el análisis de la curvatura del cauce del Río Ariguani con una cantidad de 817 unidades, alineado con un Manto antisocavación Le=10,00 m, Incluye Lastre, que es un geotextil de características mecánicas, hidráulicas y de alta resistencia a procesos de socavación de los suelos que se encuentran en los fondos de los cuerpos de agua, se instalaron 5.446,67 m².
Empleos directos: **65** Empleos indirectos: **143**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-854-2019

Valor: \$ 14.201.256.952,00

Nombre del Contratista:

CONSORCIO DRAGADO RIO ARIGUANÍ

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-936-2019

Valor: \$994.304.500,60

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO ARIGUANI 2020



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 20 - FEB - 2020

Fecha de terminación: 20- MAY - 2021

Avance financiero: 91,87%

Avance físico: 100%



INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 15.195.561.452,60



POBLACIÓN BENEFICIADA

12.800



16.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN SOBRE LAS MÁRGENES DEL RÍO ARIGUANÍ EN EL MUNICIPIO DE ALGARROBO, MAGDALENA

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD: \$ 23.749.389.803


Valor total del proyecto
\$ 23.749.389.803

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría


Plazo: VEINTICUATRO (24) MESES
Fecha de suscripción: 09 – JUN - 2022
Fecha acta de inicio: 24 – JUN - 2022
Fecha de terminación: 24 – JUN - 2024



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Obras de control de inundación y erosión

IMPACTO
Dique ataguía y excavación mecánica. Construcción de Muro en Gavión

Población beneficiada **10.918** 



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-758-2022 Valor: \$ 22.196.239.883,00 Nombre del Contratista: CONSORCIO GAVIONES ALGARROBO	Contrato de Interventoría 9677-PPAL001-795-2022 Valor: \$1.553.149.920,00 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER-ARIGUANI 22
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado - SRR	



ESTADO ACTUAL:

En ejecución, Etapa de Construcción.

- Recorridos de inspección en las zonas de intervención del dragado y de construcción de muro en gaviones.
- Verificación del monitoreo de los niveles de lámina de agua en el Río Ariguani.
- Arribo de maquinaria y gestión de materiales para actividades extracontractuales solicitadas por la Alcaldía.

16.3

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR LA BOCATOMA DEL RÍO FUNDACIÓN

Municipio de Aracataca, departamento de Magdalena

Obras de control de inundación

Proyecto Finalizado



En **desarrollo del proyecto** se realizó la instalación de geocontenedores, instalación del terratrac, geotextil, compactación con material del sitio para conformación de terraplén y la construcción de una alcantarilla. El avance lineal en geocontenedores fue de 750 ml.

Empleos directos: **32** Empleos indirectos: **70**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-586-2021

Valor: \$ 6.383.747.743

Nombre del Contratista:

Consortio Protección Aracataca

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-058-2020

Valor: \$ 446.411.840

Nombre de la Interventoría:

Consortio Aracataca Interventores.



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 18 - MAY - 2021

Fecha de terminación: 18- ENE - 2022

Avance financiero: 89,68%

Avance físico: 100%



INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 6.830.159.583



POBLACIÓN BENEFICIADA

8.339



16.4 PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUÉS DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, MAGDALENA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 9.499.888.581,00

Valor total del proyecto
\$ 9.499.888.581,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: ONCE (11) MESES
Fecha de suscripción: 28 - AGO – 2021
Fecha acta de inicio: 20 - OCT - 2021
Fecha de finalización: 20 - DIC - 2022


TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de erosión y/o inundación en cuerpos de agua

IMPACTO

125 mil m³ de dragado mecánico. Y 700 m de Muros en Geocontenedores para protección de orillas.

Población beneficiada **8.339**



Contrato de Obra No. 9677- PPAL001-1359-2021 Valor: \$ 8.878.393.262,00 Nombre del Contratista: CONSORCIO PROTECCIÓN MAGDALENA	Contrato de Interventoría No. 9677- PPAL001-1360-2021 Valor: \$ 621.495.319 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER- FUNDACIÓN 21
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado – SRR	



ESTADO ACTUAL:

- Monitoreo de la cota de la lámina de agua.

Los altos niveles del río dificultan el desplazamiento de la maquinaria hacia el punto donde se deben ejecutar las labores. Debido a lo anterior, se reportan avances de ejecución mínimos.

16.5

OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN DERECHA DEL RIO FUNDACION PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES Y SAMPUES DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, MAGDALENA.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 29.927.418.546,00

Valor total del proyecto
\$ 29.927.418.546,00

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: VEINTE (20) MESES
 Fecha de suscripción: 21 - DIC – 2021
 Fecha acta de inicio: 21 - ENE - 2022
 Fecha de terminación: 21 - SEP - 2023


TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de control de inundaciones y erosión

IMPACTO

Aprox, 300 mil m3 de dragado mecánico y 2.5 km de muros en geocontenedores para protección de orillas.

Población beneficiada **8.399**



Contrato de Obra No. 9677- PPAL001-1835-2021 Valor: \$ 28.233.572.546,00 Nombre del Contratista: UNIÓN TEMPORAL PROTECCIÓN MACONDO	Contrato de Interventoría No. 9677- PPAL001-1829-2021 Valor: \$ 1.693.846.000,00 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTOR 2021
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado– SRR	



ESTADO ACTUAL:

Instalación de manto para control de erosión en cuarto nivel de muro en geocontenedores entre las abscisas K3+335 y K3+260.

Los altos niveles del río dificultan el desplazamiento de la maquinaria hacia el punto donde se deben ejecutar las labores.

16.6

OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES HÍDRICAS DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO ARACATACA, MAGDALENA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 42.748.431.128

Valor total del proyecto
\$ 42.748.431.128

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: VEINTICUATRO (24) MESES
Fecha de suscripción: 31 – MAY - 2022
Fecha acta de inicio: 28 – JUN - 2022
Fecha de terminación: 28 – JUN - 2024

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de control de inundación y socavación

IMPACTO

Excavación mecánica (Dragado) longitud 9km aprox.
Construcción de Muro en Geocontenedores

Población beneficiada **24.986**

EMPLEOS

10 DIRECTOS

22 INDIRECTOS

0,0% AVANCE FINANCIERO

1,84% AVANCE FÍSICO

Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-814-2022 Valor: \$ 39.952.378.568,00 Nombre del Contratista: CONSORCIO PROTECCIÓN RÍO ARACATACA	Contrato de Interventoría 9677-PPAL001-861-2022 Valor: \$2.796.052.560,00 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTOR ARACATACA
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado - SRR	



ESTADO ACTUAL:

En ejecución, Etapa de Construcción.

- Excavación mecánica entre las abscisas K4+150 y K4+125
- Construcción de muro en geocontenedores, ensamblado en situ; primer nivel entre las abscisas K4+210 - K4+248
- Instalación de manto para control de erosión, primer nivel de geocontenedores entre las abscisas K4+210 - K4+248
- Instalación de geotextil tejido en poliéster, primer nivel de geocontenedores entre las abscisas K4+210 - K4+248
- Instalación de manto antisocavación y lastre inferior, primer nivel de geocontenedores entre las abscisas K4+210 - K4+248
- Conformación de dique ataguía para encauzamiento temporal del cauce entre las abscisas K4+210 - K4+248

16.7

CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS SECTORES DE ALFONSO LOPEZ, EL RETIRO, LAS MELINAS, SAN ANDRES Y LOS TRES NEGRITOS, EN EL SUELO URBANO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 18.669.860.345

Valor total del proyecto
\$ 18.669.860.345

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: CATORCE (14) MESES
 Fecha de suscripción: 27 – ABR - 2022
 Fecha acta de inicio: 16 – MAY - 2022
 Fecha de terminación: 15 – JUL - 2023


TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación y socavación

IMPACTO

Canalización de 5 arroyos: Canal Los 3 Negritos: 654,78m, Arroyo El Retiro: 386 ml, Arroyo San Andrés: 160ml, Arroyo Alfonso López: 232ml, Arroyo las Melinas: 290,72.

Población beneficiada **20.584**



Contrato de Obra 9677-PPAL001- 691-2022 Valor: \$ 17.621.696.345,00 Nombre del Contratista: CONSORCIO CANALES ARIGUANI	Contrato de Interventoría 9677-PPAL001- 676-2022 Valor: \$ 1.057.586.567 Nombre de la Interventoría: ESTUDIOS, CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.
Supervisor Interventoría UNGRD Jimmy Buitrago– SRR	



ESTADO ACTUAL:

El Consorcio Canales Ariguaní, se encuentra suspendido, debido a que se han presentado fuertes lluvias, que han provocado altos niveles de lámina de agua en los arroyos.

16.8

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RIO ARIGUANÍ EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ARIGUANÍ DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 16.931.793.197

Valor total del proyecto
\$ 16.931.793.197

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría


Plazo: DOCE (12) MESES
 Fecha de suscripción: 4 – ENE – 2022
 Fecha acta de inicio: 16 – MAY – 2022
 Fecha de terminación: 15 – MAY – 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación y socavación

IMPACTO

Recuperación hidráulica de 4,88 km de río y obras de contención **Población beneficiada 650**



Contrato de Obra 9677-PPAL001-1840-2021 Valor: \$ 15.964.257.197,00 Nombre del Contratista: CONSORCIO DRAGADOS ARIGUANÍ 2021	Contrato de Interventoría 9677-PPAL001-676- 2022 Valor: \$ 967.536.000 Nombre de la Interventoría: ESTUDIOS, CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.
Supervisor Interventoría UNGRD Jimmy Buitrago– SRR	



ESTADO ACTUAL:

La ejecución del proyecto se encuentra temporalmente suspendido en el corregimiento de San José de Ariguaní, a raíz al estado de emergencia que se tiene por su vulnerabilidad de inundación que se tiene a causa de la temporada invernal.

16.9

OBRAS EN LA RIBERA DEL RÍO MAGDALENA Y EN EL CAÑO DE CERRO DE SAN ANTONIO PARA LA REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 52.610.210.396

Valor total del proyecto
\$52.610.210.396

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra e Interventoría

Plazo: TREINTA Y TRES (33) MESES
Fecha de suscripción: 19 - AGO - 2021
Fecha acta de inicio: 6 - OCT - 2021
Fecha de terminación: 6- DIC - 2023


TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación y socavación

IMPACTO

Dragado mecánico 9140 ml al caño del cerro San Antonio extracción 482.267 m3, dique ataguía 1013 m3, Muros de contención en geocontenedores hechos in situ 1049 ml y obras de niveles y de peatonal y vehicular .

Población beneficiada **9.941**








Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1311-2021 Valor: \$ 49.532.515.776 Nombre del Contratista: CFD INGENIERIA S.A.S	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1357-2021 Valor: \$ 3.077.694.620 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERCERRO 21
Supervisor Interventoría UNGRD Sandra Milena Tafur Guzmán - SRR	



ESTADO ACTUAL:


El 29 de septiembre de 2022, se realizó una visita a obra por parte del equipo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), el equipo del contratista de obra e interventoría, en la cual se llevó a cabo una reunión en el colegio Blanco, con la finalidad de contextualizar a la comunidad en general, incluyendo los gremios de pescadores, agricultores y demás, acerca de las consecuencias generadas debido a la abertura del dique y socializar el ítem de la construcción de las compuertas. Así mismo, encontrar posibles soluciones a la problemática de inundaciones en el municipio y los corregimientos alrededor.

16.10 RESTAURACIÓN MORFOLOGICA DE UN TRAMO DEL RÍO RIOFRIO, CORREGIMIENTO DE SEVILLANO, MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA.

 ACTORES E INVERSIÓN	 EJECUTOR	 TIPO DE INTERVENCIÓN
<p>FNGRD – UNGRD: \$ 10.021.385.200</p> <p>Valor total del proyecto \$ 10.021.385.200</p>	<p>FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría</p> <p>Plazo: CATORCE (14) MESES Fecha de suscripción: Pendiente Fecha acta de inicio: Pendiente Fecha de terminación: Pendiente</p> 	<p>Control de inundaciones</p> <p>IMPACTO</p> <p>Construcción de Geocontenedor 605 m. Población beneficiada 520 </p>

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN un muro de protección en geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster para el control de erosión permanente. Así como material del sitio para conformación de terraplenes

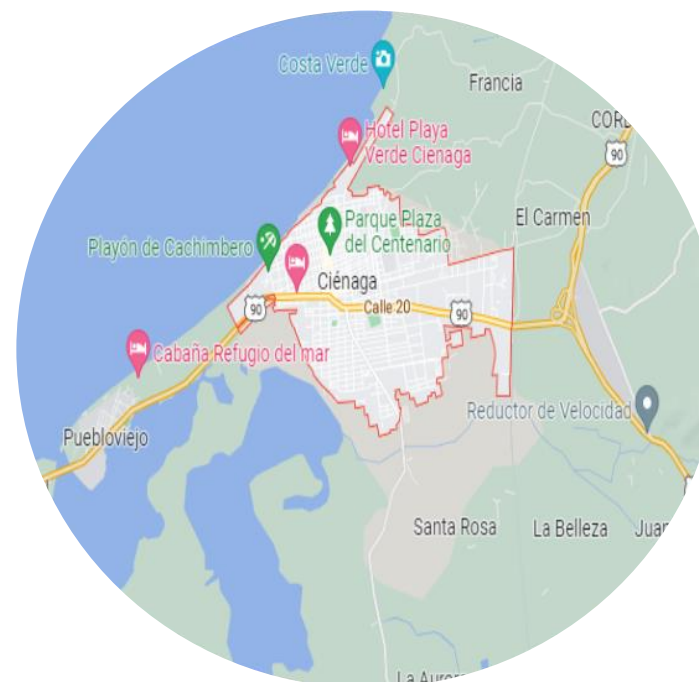

ESTADO ACTUAL:

En contratación

16.11 CONSTRUCCIÓN DE DIQUE Y MURO EN EL RÍO CESAR (CIÉNAGA INACICA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BANCO, MAGDALENA.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD: \$ 15.199.196.512

Valor total del proyecto
\$ 15.199.196.512

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DOCE (12) MESES
Fecha de suscripción: 28 – MAY - 2022
Fecha acta de inicio: 04 – OCT – 2022
Fecha de terminación: 04 – OCT - 2023



**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Control de inundaciones y erosión

IMPACTO

Construcción de Dique de 1.600 m.
Población beneficiada **42.860** 



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-802-2022 Valor: \$ 14.205.422.752 Nombre del Contratista: CFD INGENIERIA S.A.S	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1199-2022 Valor: \$ 993.773.760 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO ID BANCO 2022
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado- SRR	



ESTADO ACTUAL:

- Seguimiento al informe preliminar del diseño del componente hidráulico.

16.12 CONTROL DE INUNDACIÓN EN EL RIO FUNDACIÓN FASE IV

Municipio El Retén, departamento de Magdalena

Obras de control de inundación y erosión

Proyecto Finalizado



Antes

En el **desarrollo del proyecto** se realizó la ampliación y adecuación de la capacidad hidráulica del Río Fundación: 8,00 Km Dragado y Conformación de Dique.

Empleos directos: **45** Empleos indirectos: **99**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-896-2020

Valor: \$ 16.822.616.782,30

Nombre del Contratista:

Consortio RIO Fundación Fase 4

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1354-2020

Valor: \$844.519.200,00

Nombre de la Interventoría:

Consortio Interventoría Dragado
Fase 4



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 11 - DIC - 2020

Fecha de terminación: 10 - MAR - 2022

Avance financiero: 90%

Avance físico: 100%



INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 17.667.135.982,3



POBLACIÓN BENEFICIADA

20.981




16.13 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RÍO FUNDACIÓN, MUNICIPIO DE EL RETÉN, MAGDALENA. FASE V

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD: \$ 18,979,996,822

**Valor total del proyecto**
\$ 18.979.996.822

**EJECUTOR**


FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría


Plazo: DIECIOCHO (18) MESES

Fecha de suscripción: 17- DIC- 2021

Fecha acta de inicio: 07- FEB- 2022

Fecha de terminación: 07- AGO - 2023





**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Control de inundaciones

IMPACTO

14 Km de adecuación del cauce y construcción de dique perimetral y 1km en Geocontenedores

Población beneficiada **20.981** 



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1773-2021 Valor: \$ 17.738.386.522,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1774-2021 Valor: \$ 1.241.610.300,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO FUNDACION 2021	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA FASE VI
Supervisor Interventoría UNGRD Fernando Zuleta – SRR	



ESTADO ACTUAL:

Se viene adelantando las actividades de dragado y conformación de dique sobre los costados del río Fundación, de conformidad a lo señalado en la parte contractual.

16.14 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RÍO FUNDACIÓN, FASE VI, EN EL MUNICIPIO DE EL RETÉN, MAGDALENA.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD: \$ 18.724.547.206

**Valor total del proyecto**
\$ 18.724.547.206

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: CATORCE (14) MESES
Fecha de suscripción: 16 – FEB - 2022
Fecha acta de inicio: 25 – MAR -2022
Fecha de terminación: 25 – MAY - 2023




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Control de inundación y socavación

IMPACTO
Dragado mecánico de 7,16 km del río Fundación, conformación de terraplén con material proveniente del dragado.

Población beneficiada 20.981 



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-640-2022 Valor: \$ 17.664.721.306 Nombre del Contratista: CONSORCIO RIO FUNDACIÓN FASE VI	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-629-2022 Valor: \$ 1.059.825.900 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO EL RETÉN INTERVENTORES 2021
Supervisor Interventoría UNGRD Fernando Zuleta - SRR	



ESTADO ACTUAL:

Se adelantan actividades de dragado Mecánico de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Anfibia Brazo Largo (18mts de alcance horizontal min.) y Explanación Lateral del Material Dragado. Incluye: Seguimiento y Control Topográfico. Conformación de Terraplén con Material proveniente del Dragado.

16.15

CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN EN EL RIO FUNDACIÓN

Municipio de Fundación, departamento de Magdalena

Obras de control de inundación y protección

Proyecto Finalizado



Antes

En **desarrollo del proyecto** se realizó la construcción de obras de control de inundación en el río Fundación en donde se realizó 1,630 ml de Geocontenedores y 104,441,35 m3 de dragado

Empleos directos: **45** Empleos indirectos: **99**

Contrato de Obra
No. 9677-PPAL001-867-2019
Valor: \$ 8.878.250.506
Nombre del Contratista:
M&M EMPRESARIOS S.A.S.

Contrato de Interventoría
No. 9677-PPAL001-933-2019
Valor: \$620.942.000
Nombre de la Interventoría:
CONSORCIO FUNDACIÓN
INTERVENTORES



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio convenio: 13 - AGO - 2019
Fecha de terminación convenio: 13 - AGO - 2021
Fecha acta de inicio obra: 06 - FEB - 2020
Fecha de terminación obra: 07- JUL - 2021
Avance financiero: 91,74%
Avance físico: 100%



INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 9.499.192.506
FNGRD-UNGRD: Obra e interventoría




POBLACIÓN BENEFICIADA

6.300



16.16 CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA FINAL DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL RÍO FUNDACIÓN HASTA EL CAÑO EL RIITO, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA








Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1542-2021 Valor: \$ 4.215.351.676,00 Adición: \$1.999.442.051 Total: \$6.214.793.727 Nombre del Contratista: M&M EMPRESARIOS S.A.S	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1600-2021 Valor: \$ 295.088.108,00 Nombre de la Interventoría: CONSORCIO PROTECCION INTERVENTORES 2021
Supervisor UNGRD Raúl Aranguren Martínez– SRR	



ESTADO ACTUAL:

Etapa de armado de geocontenedores para construcción de la estructura de contención, se adelantan actividades de topografía, localización y replanteo de la estructura a fin de verificar cotas y trazado del proyecto.

16.17 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES OCASIONADAS POR EL CAÑO RIITO, EN EL MUNICIPIO DE FUNDACIÓN, MAGDALENA

 ACTORES E INVERSIÓN	 EJECUTOR	 TIPO DE INTERVENCIÓN
FNGRD – UNGRD: \$ 12.000.000.000 Valor total del proyecto \$ 12.000.000.000	FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría Plazo: CATORCE (14) MESES Fecha de suscripción: Pendiente Fecha acta de inicio: Pendiente Fecha de terminación: Pendiente 	Control de inundación IMPACTO Adecuación de 4.3 km de sección hidráulica y 40.320m2 de colchacreto. Población beneficiada 21.112 

DESCRIPCIÓN

ADECUACIÓN de 4.3 Km de sección hidráulica mediante el dragado mecánico del Caño y la canalización por medio de estructuras articulada para mitigar los fenómenos de socavación o asentamiento en el suelo de soporte del caño. Se realizarán actividades de excavación a maquina bajo el agua para la adecuación del cauce (incluyendo repaleo, cargue, transporte y disposición hasta una distancia no mayor a 2 Km) en un volumen de 110792 m3. Por otra parte, se suministrará e instalará 40320 m2 de Colchacreto Articulado con concreto de agregado fino.



ESTADO ACTUAL:

En contratación

16.18 MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACION Y SOCAVACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CANALES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA , MAGDALENA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 14.225.533.709

Valor total del proyecto

\$ 14.225.533.709

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 8 – ABR - 2022

Fecha acta de inicio: 2 - MAY - 2022

Fecha de terminación: 2 – MAY - 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de control de inundaciones

IMPACTO

Canalización de 4 arroyos en la zona urbana para un total de 2.316ml

Población beneficiada **8.000**

EMPLEOS

25

DIRECTOS

55

INDIRECTOS

0%

AVANCE FINANCIERO

17,73%

AVANCE FÍSICO



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-686-2022 Valor: \$ 13.295.533.709,00 Nombre del Contratista: CONSORCIO CANALES GRANADA 2021	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-700-2022 Valor: \$ 930.000.000,00 Nombre de la Interventoría: BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.
Supervisor Interventoría UNGRD Tatiana Gil – SRR	



ESTADO ACTUAL:

- Durante la semana el contratista ejecuto las siguientes actividades:
- - 124 ml de solado de 2500PSI
- - 230,4 m3 de concreto Imperm. de 3500PSI para canal abierto.
- - Fundida de Losa inferior de concreto impermeable de 4000PSI para Box Couvert. tipo de (3,5X2,15) K0+167- K0+173
- ACTIVIDADES DESARROLLADAS ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO :
- Las charlas e inducciones tienen una duración de 5 a 15 min:
- - 31-oct-22 Uso de los elementos de protección
- - 1-nov-22 Protección del ecosistema sensible
- - 2-nov-22 Ojos y mente en la tarea
- - 3-nov-22 Autocuidado
- - 4-nov-22 Manejo de materiales (escombros, residuos reciclables y residuos ordinarios)
- - 5-nov-22 Vigila tus pasos ACTIVIDADES DESARROLLADAS ÁREA AMBIENTAL:
- - Clasificación de residuos sólidos generados en la obra.
- - Limpieza y aseo al termino de la jornada laboral.

16.19

CONTROL DE INUNDACIÓN OCASIONADAS POR EL INCREMENTO DEL NIVEL DE LA CIÉNAGA DE PIJIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL

Municipio de Pijiño, departamento de Magdalena

Control de erosión y/o inundación en cuerpos de agua

Proyecto Finalizado



Antes

Se realizó la construcción de dique perimetral de protección contra inundación de 3.690 ml de longitud con la utilización de 172,500 m3 de material seleccionado, se construyeron 6 pozos con sus casetas de bomba para evacuar aguas lluvias y 2 alcantarilla con sistema de chapaletas para manejo de aguas lluvias.

Empleos directos: **64** Empleos indirectos: **141**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-920-2019
 Valor: \$ 12.427.081.834,00
 Adición 1: \$ 5.838.549.365,00
 Total: \$ 18.265.631.199,00

Nombre del Contratista:

Consorcio Dique Pijiño

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-058-2020
 Valor: \$ 868.112.140,00
 Adición 1: \$ 374.229.375,00
 Total: \$ 1.242.341.515,00

Nombre de la Interventoría:

Consorcio OA Ciénaga de Pijiño 2019



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 8 - JUL- 2020
 Fecha de terminación: 7- MAY - 2022
 Avance financiero: 61,25%
 Avance físico: 100%



INVERSIÓN

Valor total del proyecto
\$ 19.507.972.714



POBLACIÓN BENEFICIADA

5.964



16.20 OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, MAGDALENA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 14.240.946.129

Valor total del proyecto

\$ 14.240.946.129

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DOCE (12) MESES

Fecha de suscripción: 21 – JUL - 2022

Fecha acta de inicio: 08 – AGO – 2022

Fecha de terminación: 08 – AGO – 2023

TIPO DE INTERVENCIÓN

Obras de control de inundación y socavación

IMPACTO

Dragado mecánico de 318.965,24 M3 Aprox, Conformación de dique atagua: 9.380 M3, 460 m de muros en geocontenedores

Población beneficiada **1.156**

EMPLEOS

22

DIRECTOS

48

INDIRECTOS

0%

AVANCE FINANCIERO

0,72%

AVANCE FÍSICO



<p>Contrato de Obra</p> <p>No. 9677-PPAL001-1062-2022</p> <p>Valor: \$ 13.309.318.929,00</p> <p>Nombre del Contratista:</p> <p>CONSORCIO INTERVENCIÓN PIVIJAY 2022</p>	<p>Contrato de Interventoría</p> <p>No. 9677-PPAL001-989-2022</p> <p>Valor: \$ 931.627.200,00</p> <p>Nombre de la Interventoría:</p> <p>CONSORCIO INTER PIVIJAY 2022</p>
<p>Supervisor Interventoría UNGRD</p> <p>Astrid Delgado – SRR</p>	



ESTADO ACTUAL:

En la semana 12 se finaliza la localización y replanteo del tramo 1 del proyecto. Se materializan los puntos de las estaciones donde se ejecutará el control topo batimétrico del movimiento de tierras y construcción de zonas duras del proyecto. Se observa niveles del río altos, teniendo el flujo un comportamiento caudaloso y turbulento en el canal. Se proyecta el inicio de las actividades de localización y replanteo para el tramo 2 en la semana 13 del proyecto. Se programa socialización con la comunidad el día 01 de Octubre de 2022.

16.21 RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO ZARATE, PARA MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE PLATO, MAGDALENA



ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 13.869.487.602,00

**Valor total del proyecto**
\$ 13.869.487.602,00




EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo Total: VEINTE (20) MESES
Prórroga 1: SEIS (6) MESES
Fecha de suscripción: 10 - FEB – 2021
Fecha acta de inicio: 26 - MAR - 2021
Fecha de terminación: 28 - FEB - 2023







TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de erosión y/o inundación en cuerpos de agua

IMPACTO

Dragado mecánico en aproximadamente 10 Km y construcción de una estructura para regulación de niveles entre el Rio Magdalena y El Caño Zárate

Población beneficiada 47.468 



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1395-2020 Valor: \$ 12.962.277.417,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-262-2021 Valor: \$ 907.210.185,00
Nombre del Contratista: CFD INGENIERIA SAS	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER-ZARATE
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado – SRR	



ESTADO ACTUAL:


Suspendido: Proyecto suspendido desde el 21 de octubre hasta el 20 de enero de 2023.

16.22 OBRAS DE CONTROL SOBRE EL RIO MAGDALENA EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE GUAIMARO, MUNICIPIO DE SALAMINA, MAGDALENA.

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD: \$ 28.499.940.731

Valor total del proyecto
\$ 28.499.940.731

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DIECINUEVE (19) MESES
Fecha de suscripción: 11 - MAR – 2021
Prórroga No 1: TRES (3) MESES
Fecha acta de inicio: 14 - ABR - 2021
Fecha de terminación: 17 - MAR – 2023




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Control de erosión e inundación

IMPACTO

Hincado de pilotes para protección de orilla en el margen derecho del Río Magdalena con 320 pilotes de 20" e=3/8"

Población beneficiada **2.959** 



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-240-2021 Valor: \$ 26.635.455.662	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-435-2021 Valor: \$ 1.864.485.069
Nombre del Contratista: CONSORCIO GUAIMARO	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTERSA
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado – SRR	




ESTADO ACTUAL:

Suspendido: Proyecto suspendido desde el 21 de octubre hasta el 20 de febrero de 2023.

16.23

OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA REQUERIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAUCE DEL BRAZO DE MOMPÓS DEL RÍO MAGDALENA, UBICADO EN EL PUNTO CRÍTICO EN LA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SANTA BÁRBARA DE PINTO Y SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA BARBA DE PINTO, MAGDALENA



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001 -647-2022 Valor: \$ 4.433.291.479,00	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-706-2022 Valor: \$ 266.355.130,00
Nombre del Contratista: CONSORCIO MITIGACIÓN	Nombre de la Interventoría: CONSORCIO INTER SANTA BÁRBARA DE PINTO
Supervisor Interventoría UNGRD Víctor Parra – SRR	



ESTADO ACTUAL:


Remisión de Presupuesto y Cronograma de Obra y aprobación y validación de los resultados de la etapa de ajustes y diseños.

16.24 REDUCCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL CORREGIMIENTO DE GUACHACA, DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA

**ACTORES E INVERSIÓN**


FNGRD – UNGRD: \$ 34.660.951.991


Valor total del proyecto
\$ 34.660.951.991

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: VEINTIDÓS (22) MESES
Fecha de suscripción Obra: 18 - NOV– 2021
Fecha de suscripción Interv.: 13 -DIC – 2021
Fecha acta de inicio: 28 - DIC - 2021
Fecha de terminación: 28 - OCT - 2023





**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Control de inundación

IMPACTO

424.446 m3 de Excavación mecánica y 2370 m de muros en Geocontenedores aproximadamente.

Población beneficiada **2.578** 



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1614-2021 Valor: \$ 32.394.418.491 Nombre del Contratista: Consortio Unión Temporal Guachaca 2021	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1704-2021 Valor: \$ 2.266.533.500 Nombre de la Interventoría: Consortio Guachaca 2021
Supervisor Interventoría UNGRD Astrid Delgado Amaya– SRR	



ESTADO ACTUAL:

Durante la presente semana, se realizaron las siguientes actividades: **RIO GUACHACA:** Construcción de muro en Geo-contenedores ensamblado in situ con tensores internos en geotextil de poliéster K1+300 (Niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6) en la margen derecha de la Río Guachaca. Excavación Mecánica bajo cualquier condición de humedad mediante el uso de excavadora sobre orugas hasta la abscisa K1+300 - para instalación de Geocontenedores- Margen derecha. Excavación Mecánica bajo cualquier condición de humedad mediante el uso de excavadora sobre orugas hasta la abscisa K1+300 para la conformación de Dique ataguía para encauzamiento temporal de la corriente Instalación de manto Anti socavación, Manto para el Control de Erosión permanente y Geotextil Tejido de Poliéster hasta abscisa K1+300. Relleno con Material del Sitio para Conformación de Terraplenes hasta la abscisa K1+300.

Se realizó recorrido a la ejecución de las obras en compañía de la supervisora de la UNGRD, Interventoría y Contratista de obra.

16.25 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA DEL RÍO MAGDALENA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN ZENÓN, MAGDALENA

**ACTORES E INVERSIÓN**

FNGRD – UNGRD: \$ 13.299.844.142


Valor total del proyecto
\$ 13.299.844.142

**EJECUTOR**

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: DIECISÉIS (16) MESES
Fecha de suscripción: 11 – ENE - 2022
Fecha acta de inicio: 14 - FEB - 2022
Fecha de terminación: 14 – JUN - 2023




**TIPO DE INTERVENCIÓN**

Control de inundaciones y socavación

IMPACTO


Construcción de un muro de contención 600 ml
Población beneficiada **1.792**




**EMPLEOS**

**15**
DIRECTOS

**33**
INDIRECTOS

**0%**
AVANCE FINANCIERO

**26,87%**
AVANCE FÍSICO



Contrato de Obra No. 9677-PPAL001-1790-2021 Valor: \$ 12.429.906.542 Nombre del Contratista: Consorcio Obras de Protección SZM	Contrato de Interventoría No. 9677-PPAL001-1699-2021 Valor: \$ 869.937.600 Nombre de la Interventoría: Caez Ingeniería y Arquitecturas S.A.S.
Supervisor Interventoría UNGRD Tatiana Gil – SRR	

ESTADO ACTUAL:

En esta semana no se laboró por motivos de lluvias permanentes y continuas en la zona de trabajo. Las lluvias diarias caídas desde horas de la noche que son constantes hasta el medio día del día siguiente, impiden realizar cualquier tipo de labor.

16.26

CONVENIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$ 9.877.990.891
 Plazo: DOCE (12) MESES
 Fecha acta de inicio convenio: 8 – SEP - 2022
 Fecha de terminación convenio: 7 – SEP - 2023

Valor total del proyecto
\$ 9.877.990.891

EJECUTOR

Municipio de Sitionuevo: Obra, Interventoría

Plazo:
 Fecha de suscripción: Pendiente
 Fecha acta de inicio: Pendiente
 Fecha de terminación: Pendiente

TIPO DE INTERVENCIÓN


Control de inundación

IMPACTO

Construcción muros de contención 534,67 ml
 Población beneficiada **27.128**

DESCRIPCIÓN	VALOR
OBRA	\$9.231.767.188
INTERVENTORÍA	\$646.223.703
TOTAL	\$9.877.990.891

Contrato de Obra	Contrato de Interventoría
En proceso de contratación por parte del municipio	En proceso de contratación por parte del municipio
Convenio No. 9677-PPAL001-1381-2022 Camila Barreto- SRR	

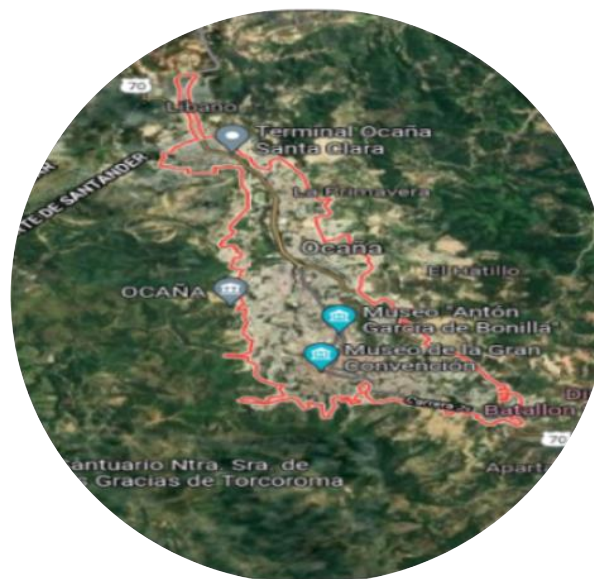

ESTADO ACTUAL:

Convenio en ejecución,
derivados en contratación

16.27

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL CAÑO REAL DEL OBISPO

Municipio de Tenerife, departamento de Magdalena

Obras de control de inundación

Proyecto Finalizado



En **desarrollo del proyecto** se realizó la ejecución de 3,02 km de adecuación de la sección hidráulica del Caño Real el Obispo y conformación de terraplén.

Empleos directos: **65** Empleos indirectos: **143**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-655-2021

Valor: \$ 4.438.739.847

Nombre del Contratista:

Consorcio Dragado Tenerife

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-624-2021

Valor: \$310.710.000,00

Nombre de la Interventoría:

CONSORCIO GARCIA 2021



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 09 – AGO – 2021

Fecha de terminación: 10- JUL - 2022

Avance financiero: 89,88%

Avance físico: 100%



INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 4.749.449.847



POBLACIÓN BENEFICIADA

3.500



16.28

INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN ANTE LA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA

Municipio de Tenerife, departamento de Magdalena

Obras de control de inundación y socavación

Proyecto Finalizado



Antes

En **desarrollo del proyecto** se realizó la ejecución de 750 ml de adecuación de la sección hidráulica del río Magdalena

Empleos directos: **75** Empleos indirectos: **165**

Contrato de Obra

No. 9677-PPAL001-1091-2021

Valor: \$ 22.051.872.491

Nombre del Contratista:

Consorcio Tenerife 21

Contrato de Interventoría

No. 9677-PPAL001-1148-2021

Valor: \$1.543.311.000

Nombre de la Interventoría:

Consorcio Inter - Tenerife



ESTADO TERMINADO

Fecha acta de inicio: 06 -OCT- 2021

Fecha de terminación: 24- JUL - 2022

Avance financiero: 19,69%

Avance físico: 100%



INVERSIÓN

Valor total del proyecto

\$ 23.595.183.491



POBLACIÓN BENEFICIADA

3.500



16.29 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE ORILLA Y RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DEL RÍO FRÍO, PARA MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN EN EL MUNICIPIO DE, ZONA BANANERA, MAGDALENA.

ACTORES E INVERSIÓN

FNGRD – UNGRD: \$19.761.238.994

Valor total del proyecto

\$19.761.238.994

EJECUTOR

FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría

Plazo: TRECE (13) MESES

Fecha de suscripción: 14 – MAY - 2021

Fecha acta de inicio: 02 – JUL – 2021

Fecha de terminación: 02– ENE – 2023


TIPO DE INTERVENCIÓN

Control de inundación y socavación

IMPACTO

Dragado mecánico de 462.527 M3 Aprox, Conformación de terraplén: 5306 M, 1200 m de muros en geo contenedores.

Población beneficiada **62.312**








<p>Contrato de Obra</p> <p>No. 9677-PPAL001-694-2021</p> <p>Valor: \$ 18.468.641.954,00</p> <p>Nombre del Contratista:</p> <p>Consortio Rio Frio Magdalena</p> <p>2021</p>	<p>Contrato de Interventoría</p> <p>No. 9677-PPAL001-719-2021</p> <p>Valor: \$ 1.292.597.040,00</p> <p>Nombre de la Interventoría:</p> <p>Consortio Interventoría UGR</p> <p>2021</p>
<p>Supervisor Interventoría UNGRD</p> <p>Astrid Delgado– SRR</p>	



ESTADO ACTUAL:

Se presentan precipitaciones días Lunes 17/10/22, 18/10/22 y 19/10/22,, y niveles altos del río lo que impide la reanudación de las actividades de obra. Los niveles altos presentados, han ocasionado daños notorios en bordas del río. Las lluvias continúan con precipitaciones por encima de la media normal. IDEAM anuncia extensión de las lluvias durante lo que resta del mes de octubre, noviembre y diciembre. No se ejecutan trabajos con maquinaria por el riesgo que implica la operación bajo estas condiciones. e presentó creciente que desbordo en el margen derecho del río en inmediaciones de la zona de los predios de las abscisas K2+670 – K2+875

16.30 RECUPERACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO SEVILLA ENTRE LAS ABSCISAS K5+100 HASTA EL K9+124.69 (K13+086.63 AL K17+086,63) DESDE LA C.G.S.M. COMO MITIGACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, MAGDALENA

 ACTORES E INVERSIÓN	 EJECUTOR	 TIPO DE INTERVENCIÓN
<p>FNGRD – UNGRD: \$ 19.356.032.953</p> <p>Valor total del proyecto \$19.356.032.953</p>	<p>FNGRD – UNGRD : Obra, Interventoría</p> <p>Plazo: OCHO (8) MESES Fecha de suscripción: Pendiente Fecha acta de inicio: Pendiente Fecha de terminación: Pendiente</p> 	<p>Control de inundaciones</p> <p>IMPACTO</p> <p>Construcción de diques. Población beneficiada 60.941 </p>

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN de diques de contención en las secciones críticas, utilizando el material de excavación. Profundidad media del cauce: 2.5m, altura media de los terraplenes de confinamiento: 2.0 m, Ancho de corona de los terraplenes: 3 m, Ancho de solera. 30 m y actividades de dragado.



ESTADO ACTUAL:

En contratación



GOBIERNO DE COLOMBIA

¡GRACIAS!



@GestionUNGRD



@UNGRD



@ungrd_oficial



UNGRD Gestión del
Riesgo de Desastres
