



FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA

SUCRE

Abril 23 de 2012



INFORME

Teléfono (57 1) 7053420 - Calle 98 No. 9A - 54 Torre 3 Piso 11- Bogotá - Colombia
www.colombiahumanitaria.gov.co





1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN.

Departamento: **SUCRE**

RUBROS		NACIONAL	%	SUCRE	% Vr. x Departamento
Atención Humanitaria	Vr. Transferencia	724.605.580.394	100%	29.235.108.000	4,0%
	Pagos interventorias	13.565.602.794		589.061.826	4,3%
	Pagos Otros Gastos Operativos	7.285.259.579		0	0,0%
	Total Atención Humanitaria	745.456.442.767		29.824.169.826	4,0%
Obras	Vr. Aprobado	1.652.850.246.834	100%	58.736.082.738	3,6%
	No. De Obras	4.283		120	2,8%
Convenios	Vr. Distribuido Convenios	2.676.498.018.888	100%	100.726.970.846	3,8%
	No. Proyectos y subproyectos	3.769		210	5,6%
TOTAL OBRAS Y PROYECTOS		8.052	100%	330	4,1%
SUBTOTAL INVERSIÓN		5.074.804.708.490	100%	189.287.223.409	3,7%
Provisiones (Ayuda Humanitaria - Alojamientos Temporales)		212.789.405.207			
Componente Social		18.548.000.000			
Acompañamiento, seguimiento y Control-Auditoria		50.686.000.000			
Gastos de Operación		20.000.000.000			
TOTAL NACIONAL		5.376.828.113.697			

Fecha de corte Fidupervisora: 9 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA GOBERNACIÓN DE SUCRE

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SUCRE y COMFASUCRE**

Entregas de Mercados y Aseo por familia en 7 municipios

Valor transferencia a Gobernación (Mercados y Aseo) \$ **20.209.077.000**

No. Solicitudes aprobadas 2



56.842

mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	28.421	28.421	100,0
Segunda Entrega	28.421	28.421	100,0
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo
aproximadamente:

1.989

Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 17 de Abril de 2012

ASISTENCIA HUMANITARIA ALCALDIA CAPITAL DE SINCELEJO

Operador: **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SUCRE**

Valor transferencia a Alcaldía Capital (Mercados y Aseo) \$ **721.056.000**

No. Solicitudes aprobadas 2



1.325 mercados y kit de aseo entregados



	Familias a beneficiar	Familias beneficiadas	% Avance
Primer Entrega	750	750	100,0
Segunda Entrega	1.150	575	50,0
Tercera Entrega	-	-	-



Toneladas entregadas en mercados y aseo aproximadamente: **46**


Nota: Los recursos aprobados y desembolsados no incluyen pagos a interventorias ni Otros gastos Operativos.

Fecha de corte Fiduprevisora: 9 de Abril de 2012

Fecha de corte informes de avance: 17 de Abril de 2012




ALOJAMIENTOS TEMPORALES GOBERNACIÓN DE SUCRE

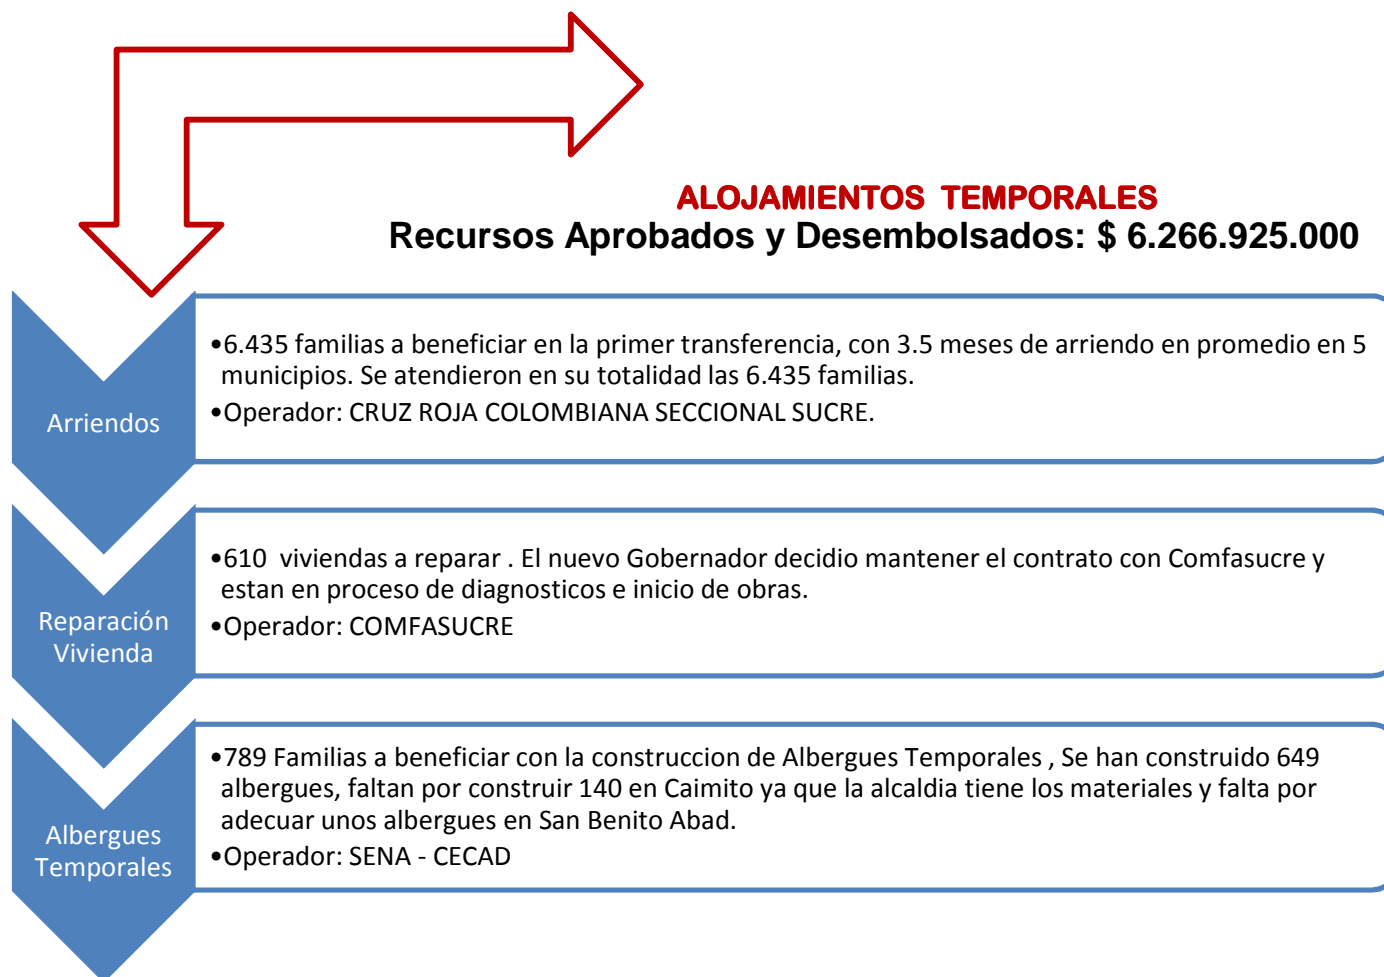



ALOJAMIENTOS TEMPORALES ALCALDIA DE SINCELEJO



ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Recursos Aprobados y Desembolsados: \$ 2.038.050.000

Arriendos

- 35 familias a beneficiar en la primer transferencia, con 3.5 meses de arriendo en promedio. No se ha recibido un informe de la alcaldia mostrando avance en la entrega de estos arriendos.
- Operador: CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL SUCRE.

Reparación Vivienda

- 810 viviendas a reparar. Realizaron el proceso de contratacion publicando en su pagina de la alcaldia, saliendo como opcionado el contratista JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ.
- Operador: Operador JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ



ASISTENCIA HUMANITARIA, ARRIENDOS Y ALBERGUES SUCRE

MPIO	AYUDA HUMANITARIA				ARRIENDOS		ALBERGUES	
	Familias atendidas mercados y aseo (Primer Giro)	Valor total de las ayudas entregadas en mercados y aseo (Primer Giro)	Familias atendidas mercados y aseo (Segundo Giro)	Valor total de las ayudas entregadas en mercados y aseo (Segundo Giro)	Familias atendidas Arriendos (Primer Giro)	Valor de las Ayudas Entregadas en arriendos (Primer Giro)	Unidades Habitacionales a construir (FASE I y II)	Unidades habitaciones construidas (FASE I y II)
Sincelejo	750	269.133.835	575	208.175.000				
Buenavista								
Caimito	1.439	487.245.400	1.400	474.038.600	195	136.500.000	140	
Coloso								
Corozal								
Coveñas								
Chalán								
El Roble								
Galeras	440	148.984.000	477	161.511.723				
Guaranda	1.128	381.940.800	1.118	378.553.682				
La Unión								
Los Palmitos								
Majagual	7.428	2.515.120.800	7.204	2.439.267.196	34	23.800.000		
Morroa								
Ovejas								
Palmito								
Sampués								
San Benito Abad	5.330	1.804.738.000	5.589	1.892.429.811	2.392	1.674.400.000	390	390
San Juan de Betulia								
San Marcos	5.102	1.727.537.200	5.100	1.726.854.900	417	291.900.000	50	50
San Onofre								
San Pedro								
San Luis de Sincé								
Sucre	7.554	2.557.784.400	7.532	2.550.327.668	3.397	2.377.900.000	209	209
Santiago de Tolú								
Tolú Viejo								
TOTAL	29.171	9.892.484.435	28.995	9.831.158.580	6.435	4.504.500.000	789	649



REPARACIÓN DE VIVIENDA SUCRE

MUNICIPIOS	OPERADOR	No DE VIVIENDAS A REPARAR (SOLICITADO A C.H.)	No DE VIVIENDAS A REPARAR (REGISTRO INICIAL)	VIVIENDAS DIAGNOSTICAD AS APLICAN PARA REPARACION	No VIVIENDAS REPARADAS	NO VIABLES A REPARAR POR DAÑO MAYOR O SIN DAÑO
SINCELEJO	JORGE ENRIQUE ALVAREZ DIAZ	810	810			
1		810	810			
Caimito	COMFASUCRE	610	100			
Galeras	COMFASUCRE		41			
San Benito Abad	COMFASUCRE		200			
San Marcos	COMFASUCRE		100			
Sucre	COMFASUCRE		200			
5		610	641			



OBRAS MAYORES - MENORES Y CONTENCIÓN DE CUERPOS DE AGUA APROBADAS DEPARTAMENTO DE SUCRE

TOTAL INVERSIÓN

\$ 58.736.082.738

TOTAL OBRAS APROBADAS

120


PORCENTAJE DE OBRAS INICIADAS

100%

MUNICIPIOS ATENDIDOS

26 de 26

**DISTRIBUCIÓN POR
TIPO DE OBRA**

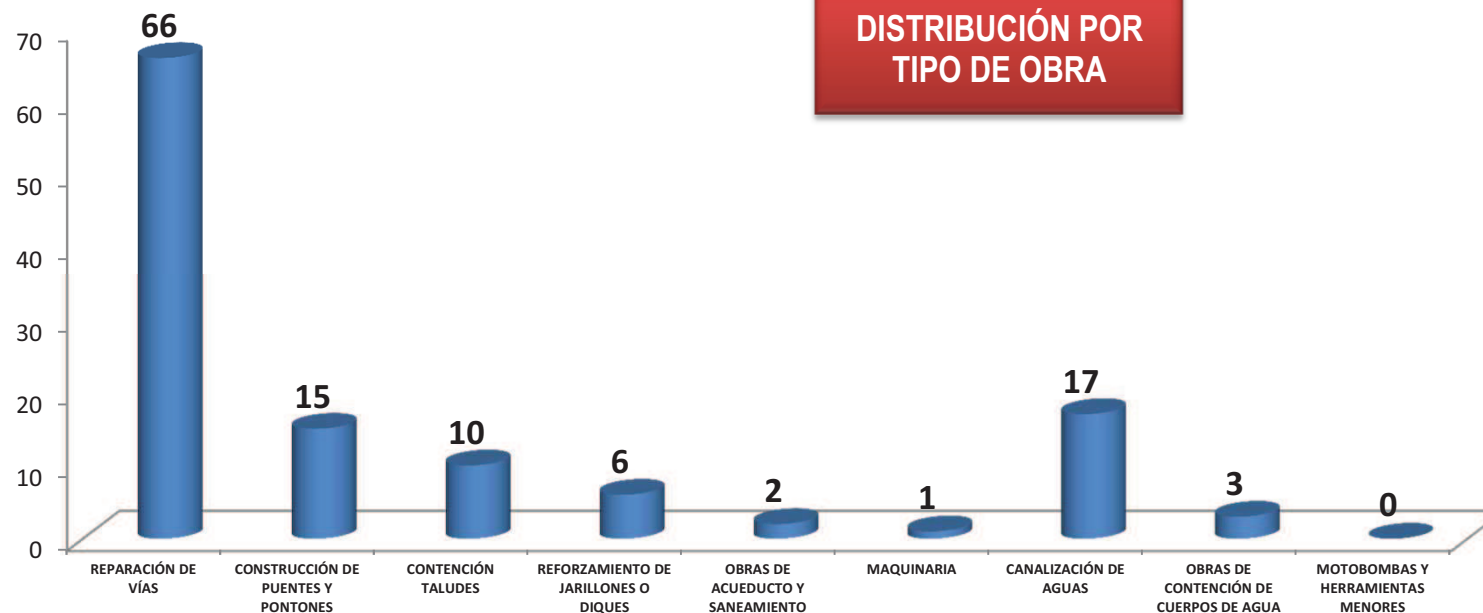

Fuente: Colombia Humanitaria :12/04/2012



OBRAS APROBADAS VS. OBRAS TERMINADAS DEPARTAMENTO DE SUCRE

Obras Menores


37 Obras Terminadas de 91 Aprobadas

Obras Mayores

17 Obras Terminadas de 26 Aprobadas


Contención de Cuerpos de Agua

2 Obras Terminadas de 3 Aprobadas

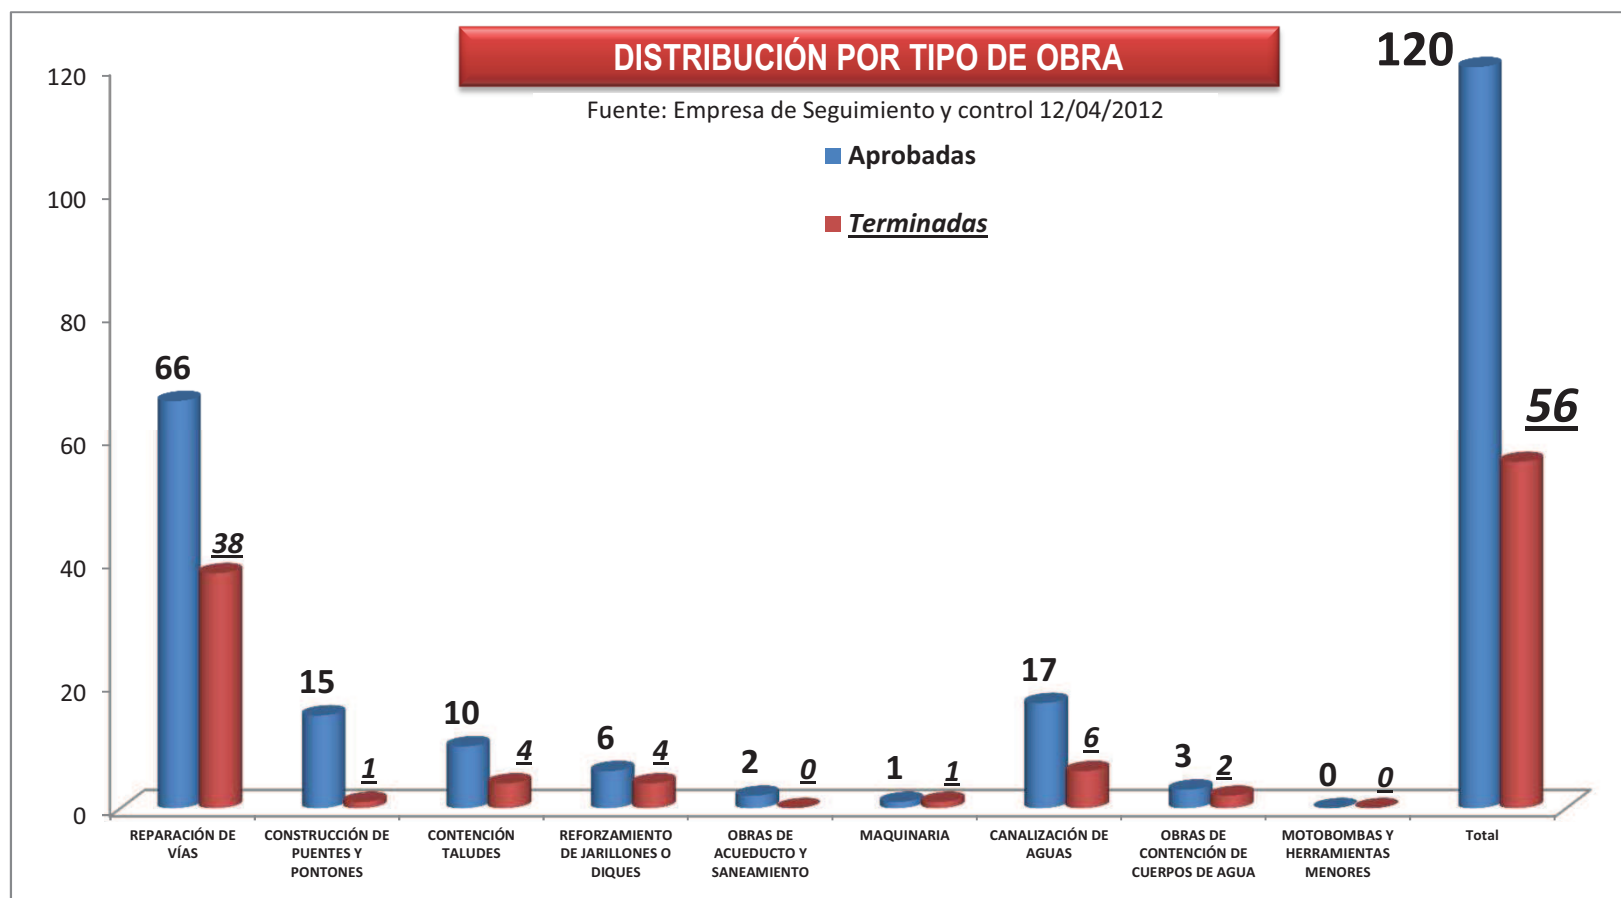




PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO PROMEDIO POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE SUCRE

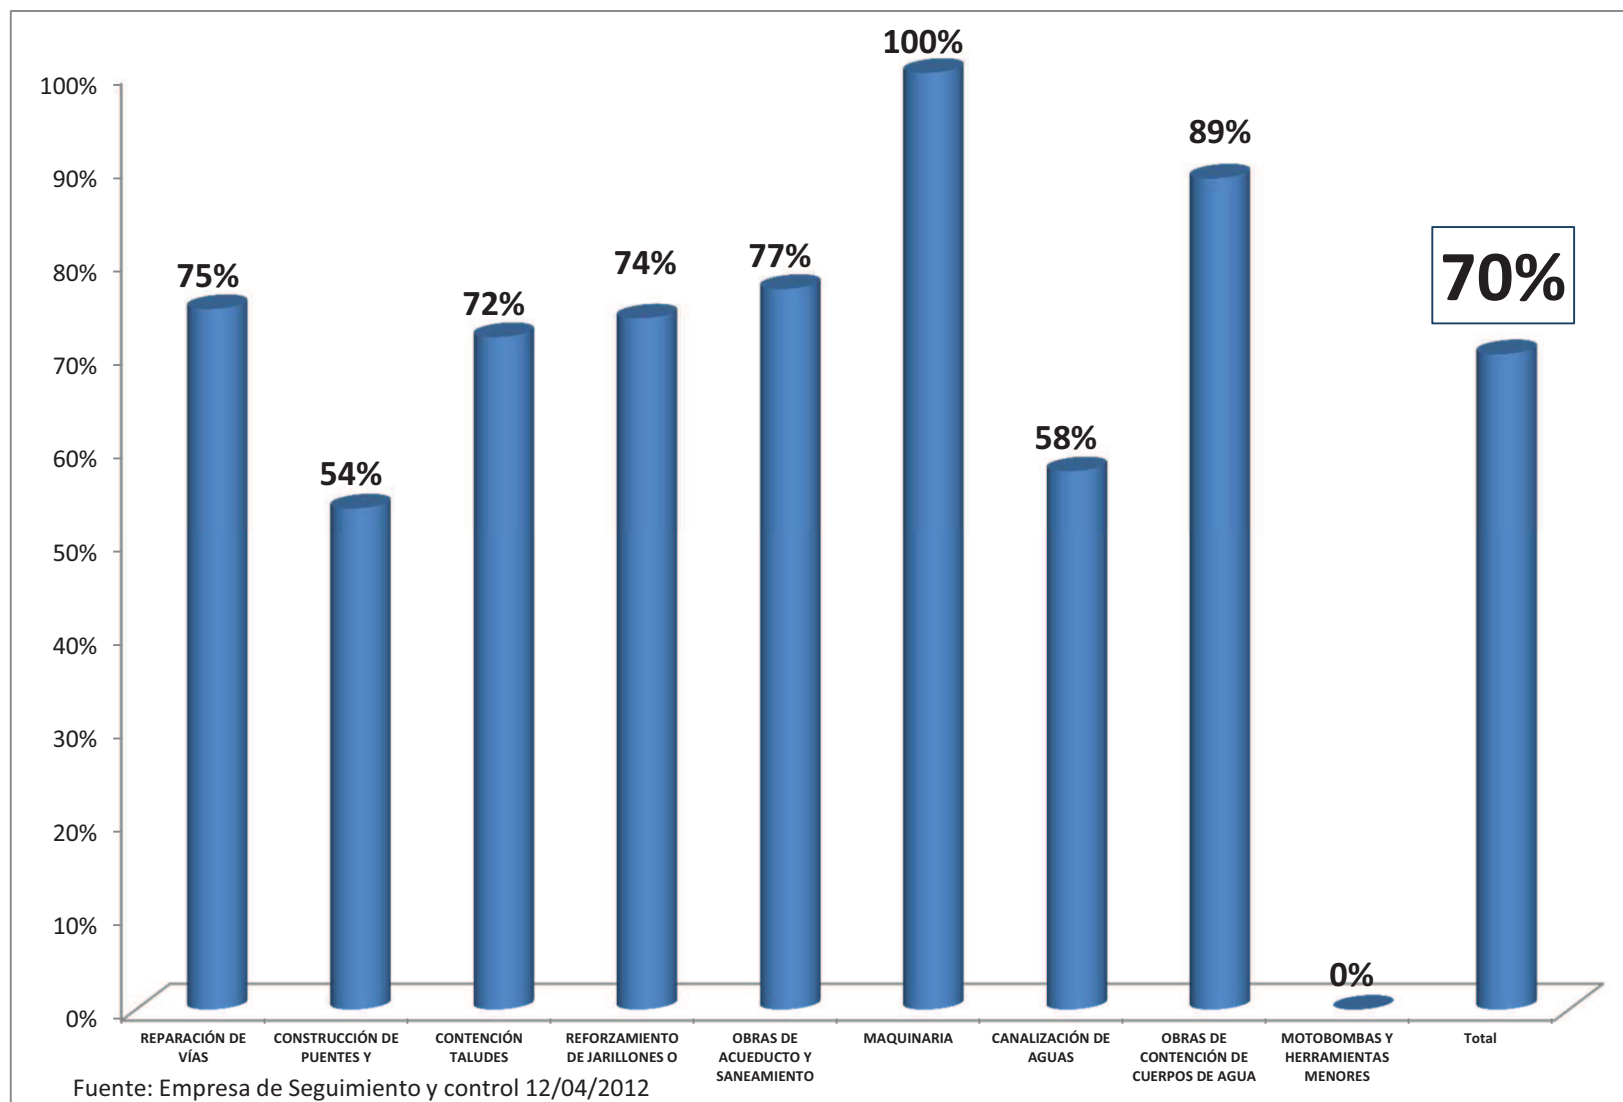



CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DE SUCRE

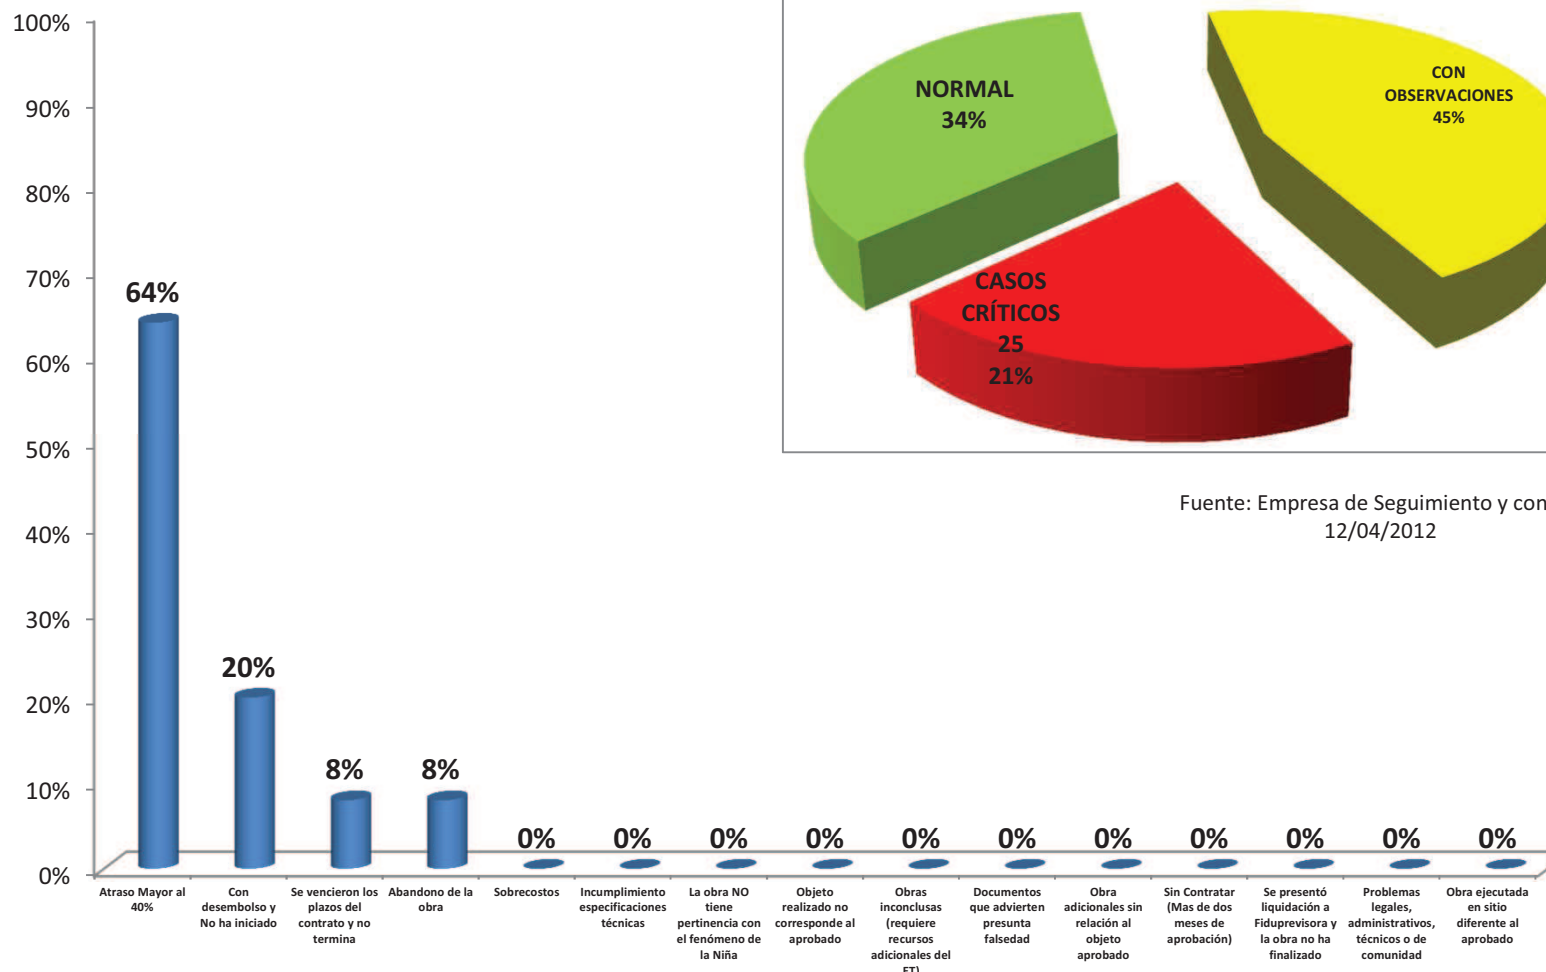

Fuente: Empresa de Seguimiento y control
12/04/2012

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL CASOS CRÍTICOS DE ACUERDO AL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO


Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012

25 OBRAS CRÍTICAS DE 120 OBRAS APROBADAS (21 %)

INFORME




OBRAS APROBADAS - CON CARTERA ABIERTA Y TERMINADAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE SUCRE

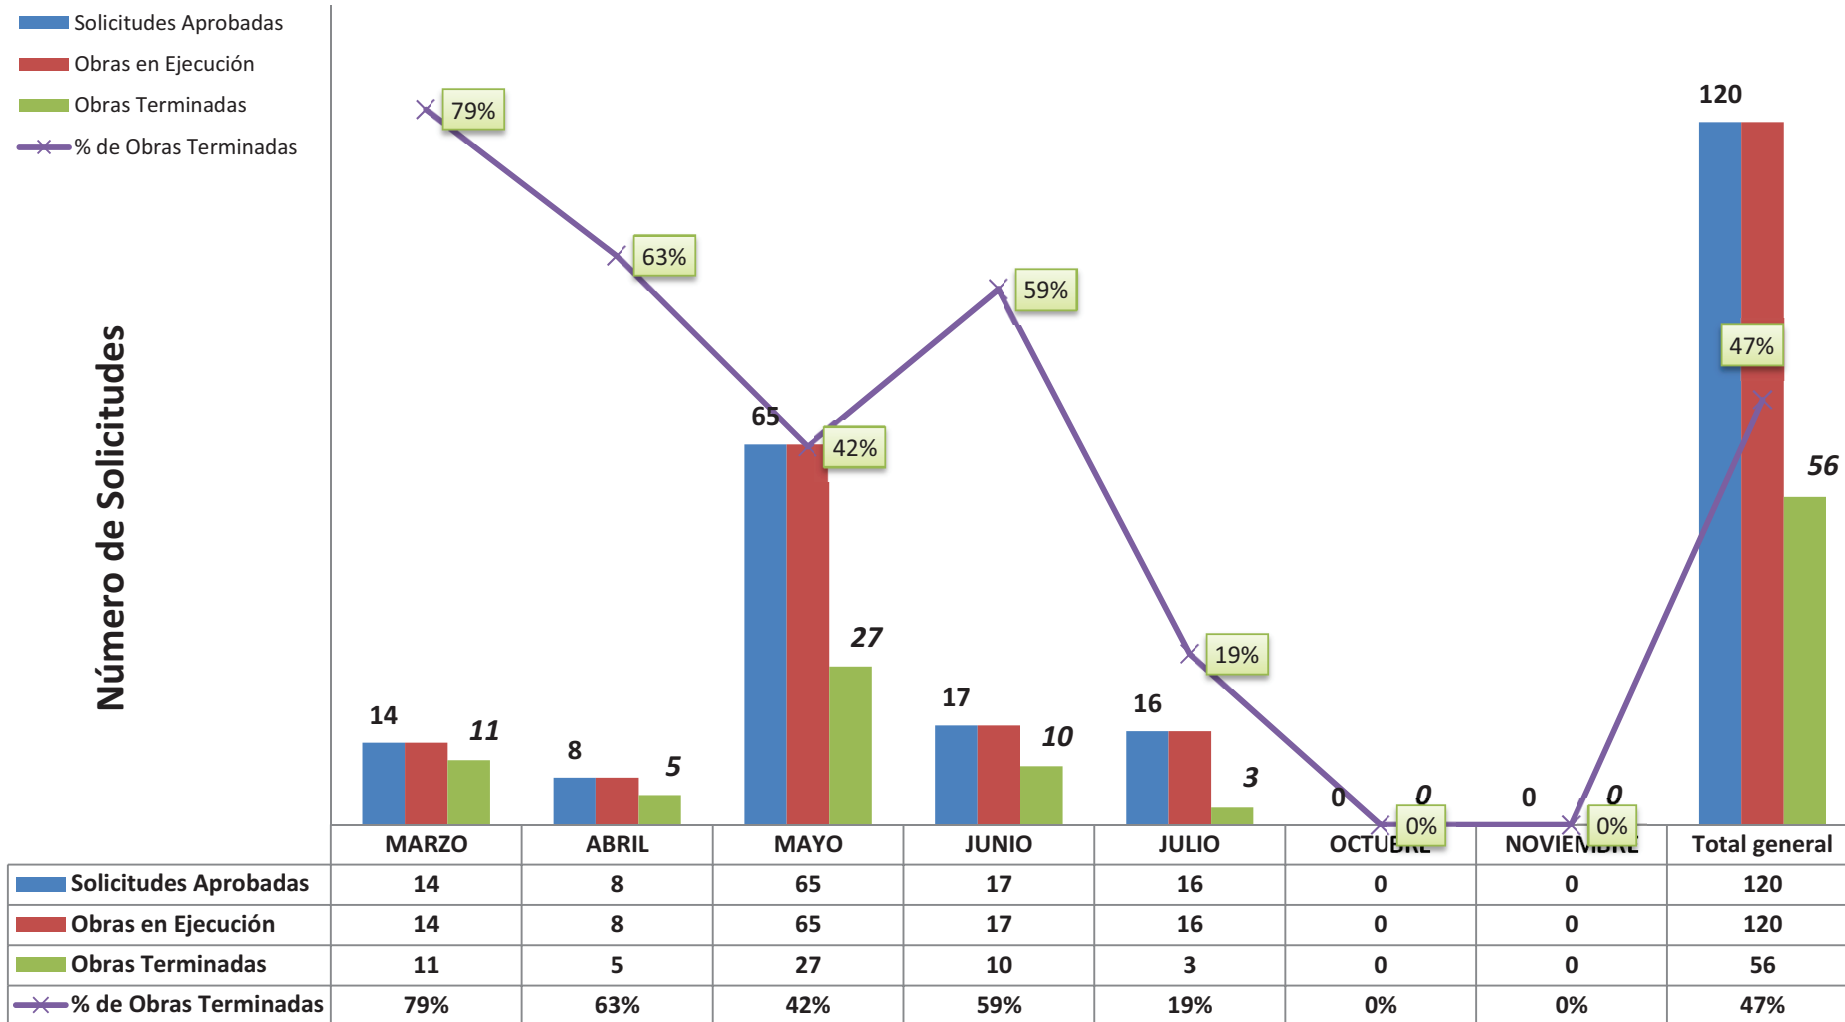

Fuente: Empresa de Seguimiento y control 12/04/2012



DESEMBOLSOS A CARTERAS COLECTIVAS Y GIROS A CONTRATISTAS DE ACUERDO AL MES DE APROBACIÓN DEPARTAMENTO DE SUCRE

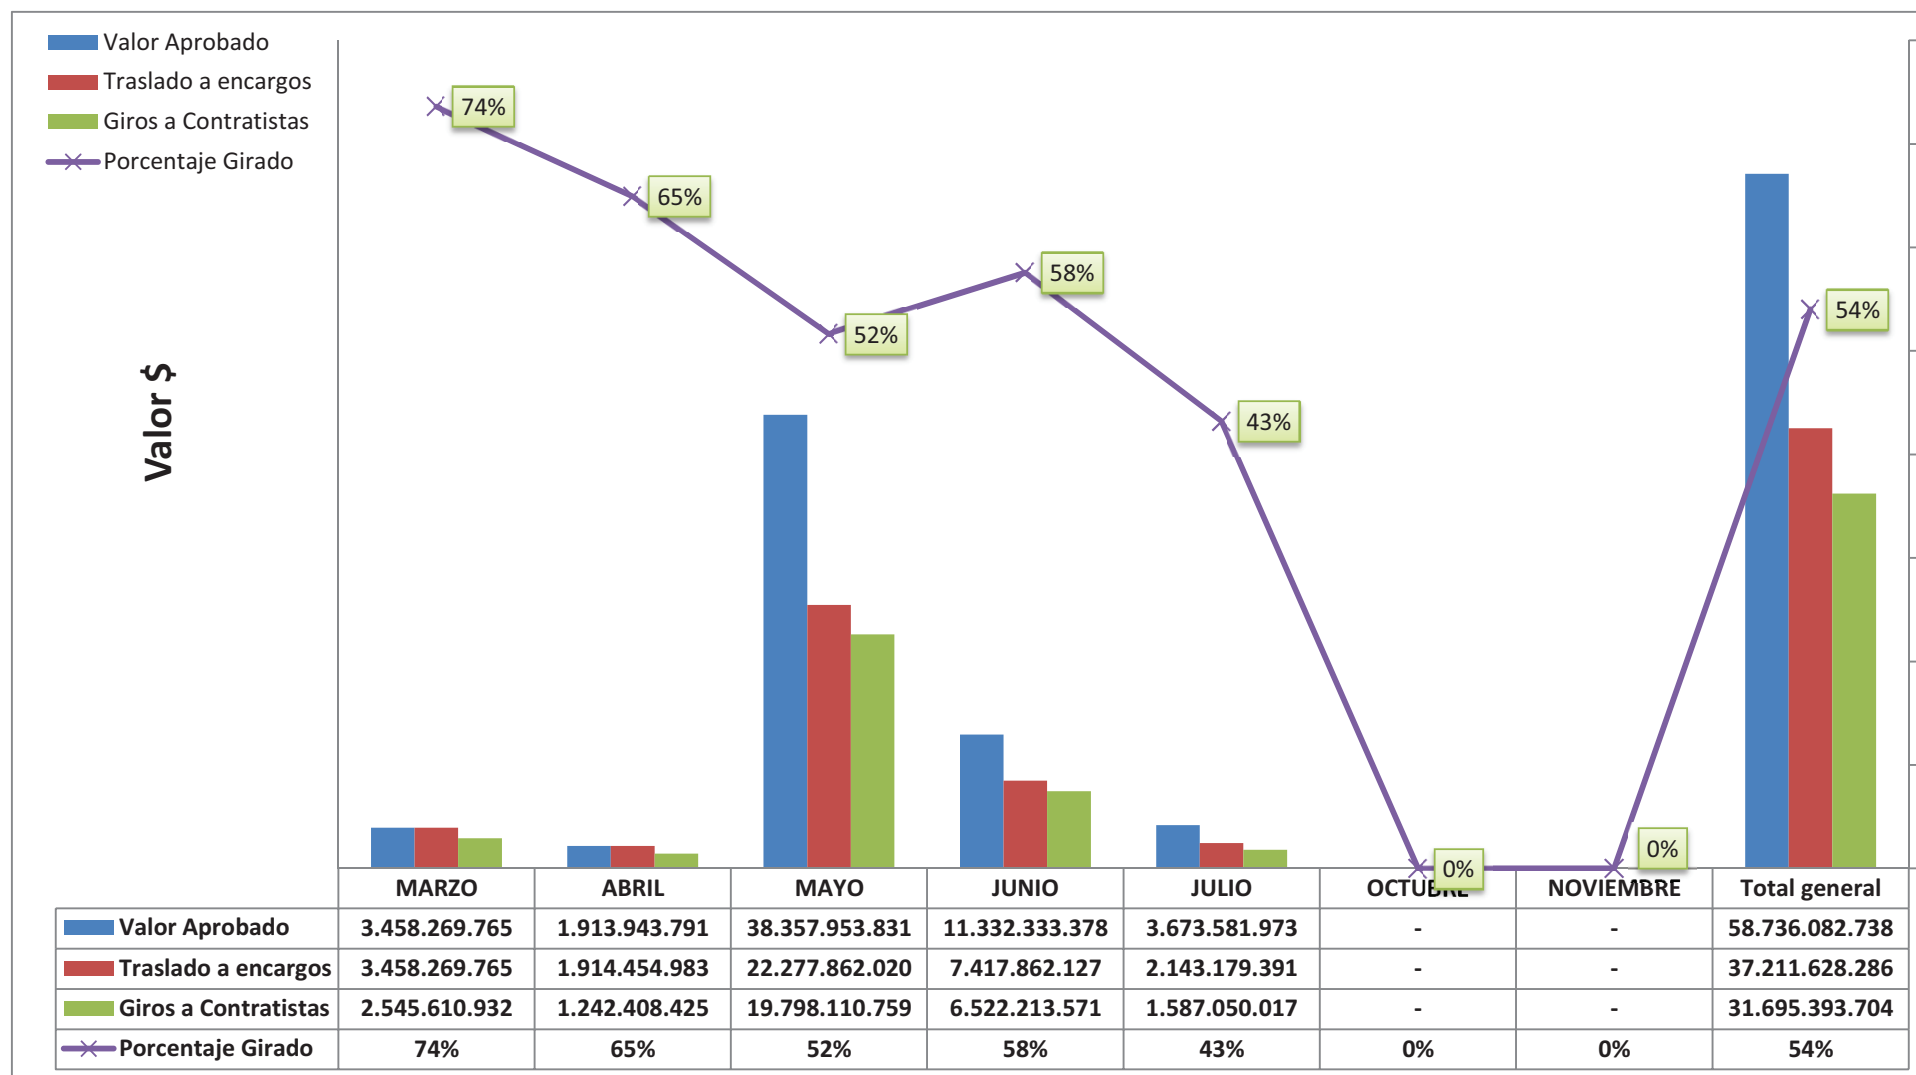


Fuente: Fiduprevisora 11 de Abril de 2012



APROBADO - DESEMBOLSADO EN CARTERAS Y GIRADO A CONTRATISTAS POR TIPO DE OBRA DEPARTAMENTO DE SUCRE

63 % Traslados a carteras colectivas

54 % Girado a Contratistas

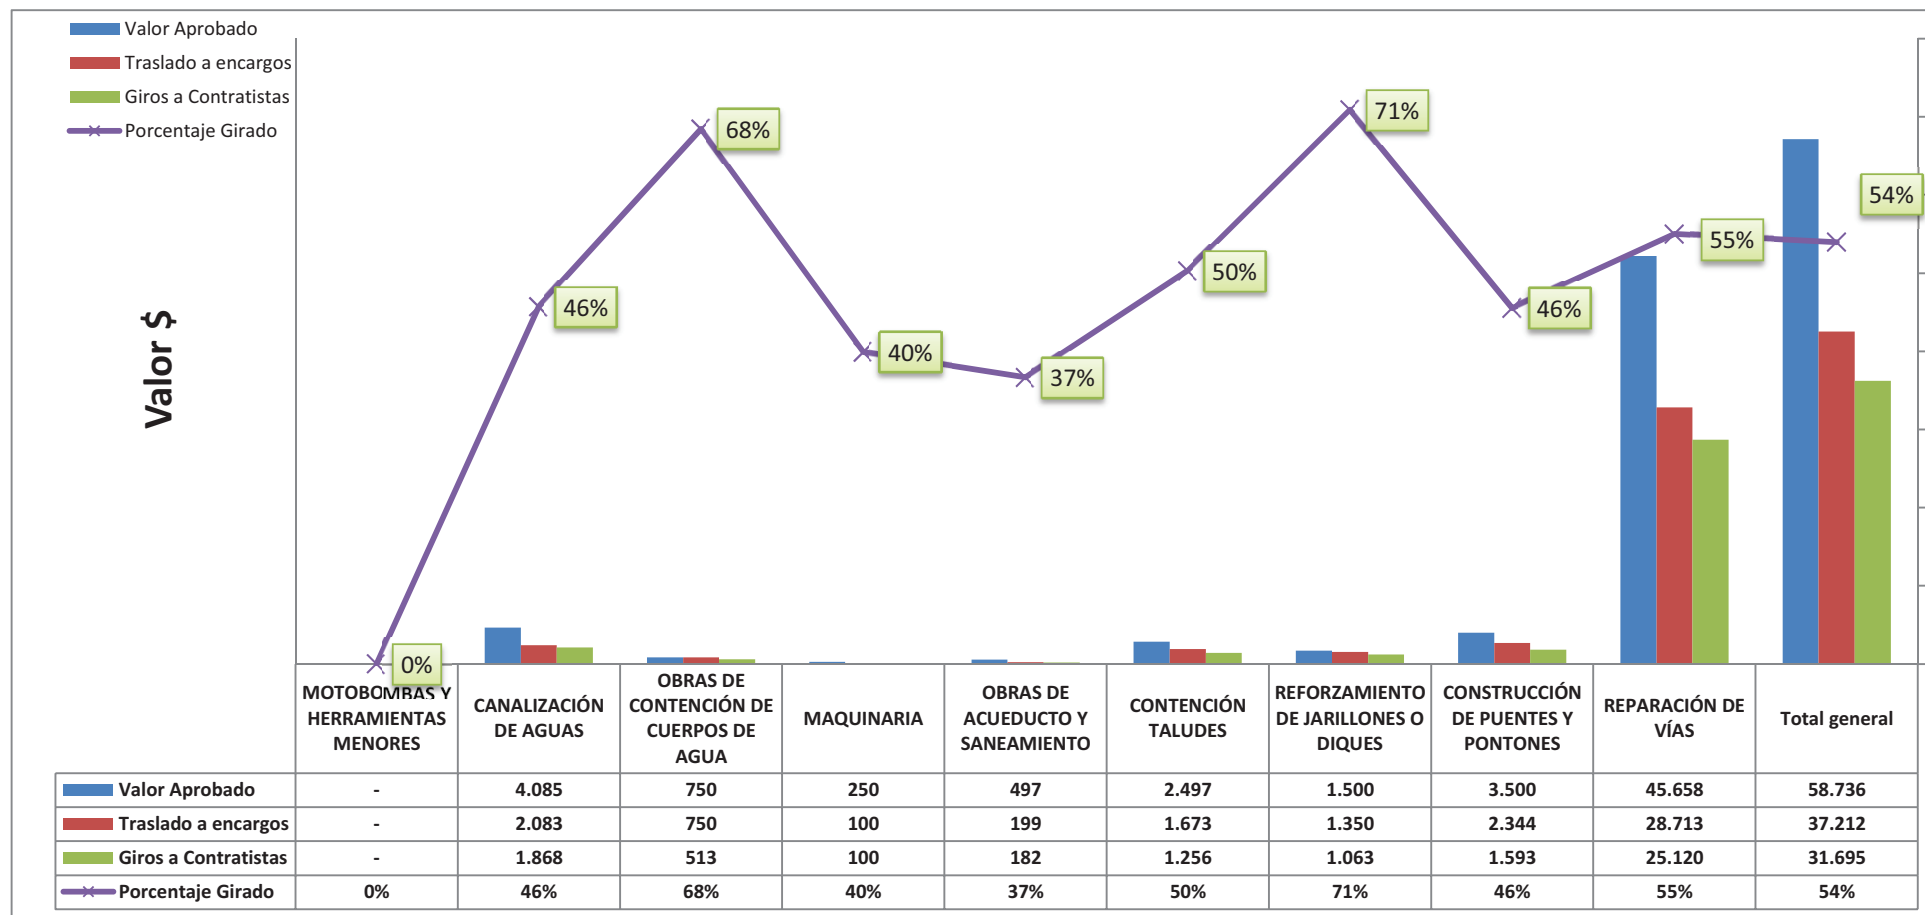

Fuente: Fiduprevisora 11 de abril de 2012 (Cifras en millones de pesos)

CONVENIOS EN EJECUCIÓN CON ENTIDADES NACIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# PROYECTOS Y SUBPROYECTOS	# PROYECTOS TERMINADOS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	193	82	\$ 21.218.478.493	\$ 4.589.653.263	31,90%	Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura educativa
MADS - VICEMINISTERIO DE AMBIENTE	5	0	\$ 16.447.000.000	\$ 8.426.987.332	63,57%	Atención y restablecimiento de condiciones ambientales
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		0	\$ 13.988.308.668	\$ 13.988.308.668	84,13%	Plan de Inversiones para la atención del sector agrícola y ganadero
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	4	2	\$ 14.293.791.127	\$ 4.581.805.564	65,50%	Rehabilitación de vías
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI - 2	2	0	\$ 29.000.000.000	\$ 0	0,00%	Rehabilitación de vías
AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL	1		\$ 2.360.000.000	\$ 928.437.509	51,75%	Rehabilitación y adecuación de la infraestructura aeroportuaria afectada
ARMADA NACIONAL	1	1	\$ 109.600.000	\$ 45.867.600	100,00%	Rehabilitación de la infraestructura afectada de la Armada Nacional
POLICÍA NACIONAL 1	2	2	\$ 140.062.254	\$ 130.898.519	100,00%	Rehabilitación y Mantenimiento de las Unidades Policiales afectadas
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 2	2		\$ 1.035.988.352	\$ 0		Programa de Empleo de Emergencia
Total general	210	87	\$ 98.593.228.894	\$ 32.691.958.455	35,59%	

Fecha de Corte
abril 23 de 2012

OTROS CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS EN EJECUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

ENTIDADES NACIONALES CON CONVENIOS EN EJECUCIÓN	# ACTIVIDADES	# ACTIVIDADES TERMINADAS	RECURSOS PROGRAMADOS PARA EJECUCIÓN	VALOR EJECUTADO DECLARADO	AVANCE FISICO DECLARADO (%)	OBJETO DEL CONVENIO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD		0	\$ 350.046.400	\$ 350.046.400	100,00%	Atención de emergencias
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	1		\$ 235.600.000	\$ 56.071.159	53,90%	Fortalecer la atención a niños, niñas, adolescentes y familias afectados
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DAPS 1		0	\$ 328.205.551	\$ 328.205.551	100,00%	Registro Único de Damnificados
CRUZ ROJA COLOMBIANA	1	1	\$ 1.219.890.000	\$ 1.219.890.000	100,00%	Compra de materiales para construcción de albergues temporales
Total general	2	1	\$ 2.133.741.951	\$ 1.954.213.110	97,57%	
