



Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD certificado en:



Seguimiento de Acciones en Mocoa - Putumayo

07 de Septiembre de 2018



PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

1.

AVANCE PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN MOCOA-PUTUMAYO

Evento del 31 de Marzo de 2017

EVENTO QUE SE PRESENTÓ

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa.

MARCO LEGAL

- Decreto de Desastre No. 599, expedido por la Presidencia.
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica No. 601, expedido por la Presidencia
- Decreto de Calamidad Pública Departamental No.068.
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056.
- CONPES 3904 Plan de Reconstrucción de Mocoa

AFECTACIÓN

PERSONAS



335	Personas fallecidas*
398	Personas heridas
53	Personas desaparecidas*
7.891	Familias registradas en RUD
22.322	Personas registradas en RUD

INFRAESTRUCTURA



1.461	Viviendas averiadas
3	Puentes averiados
2	Puente destruidos
2	Acueducto afectados
1	Red de Gas
1	Subestación eléctrica



* Fuente: Medicina Legal Seccional Mocoa

FASES DE ATENCIÓN



\$ 27.594 millones

Ofrecimientos apoyo en especie Internacionales

Shelterbox Organización
(Reino Unido)

\$288 millones

63 carpas para
4 personas

Entregadas
100%

Estado de Japón

\$67 millones

30 Generadores
eléctricos

SNGRD

República de Turquía

200 Kits de aseo
básico
100 lámparas
solares

Secretaria de
Salud de
Mocoa

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

China

\$2.854 millones

\$1.908 vivienda Urbana
\$641 Plaza de Mercado
\$306 Vivienda Rural

Asignación
100%

Turquía

\$430 millones

Vivienda
Urbana

Asignación
100%

Emiratos Árabes

\$19.691 millones

\$8.500 Colegio Sauces II
\$1.186 Vivienda Urbana
\$5.000 Vías Urbanas
\$1.505 Vivienda Rural
\$3.000 Obras de Mitigación

Asignación
97%

Dinamarca

\$130 millones

Viviendas Urbanas

Asignación
100%

Tailandia

\$293 millones

Plaza de
Mercado

Asignación
100%

Gobierno de Corea

\$872 millones

Vivienda Urbana

Asignación
100%

1.2 Donaciones Internacionales

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

Banco Centroamericano de
integración Económica

\$718 millones

Uniformes Estudiantes
colegio Mocoa

**Asignación
99.9%**

BID

\$569 millones

Asistencia
Humanitaria de
Emergencia

**Asignación
100%**

CAF

\$286 millones

\$107 Plaza de Mercado
\$169 Vivienda Rural

**Asignación
97%**

Key Coffee Japón

\$26 millones

Viviendas Urbanas

**Asignación
85%**

Mitsubishi Corporation
(Japón)

\$132 millones

Plaza de
Mercado

**Asignación
100%**

KEIMYUNG CARITAS
(República de Corea)

\$12 millones

Vivienda
Urbana

**Asignación
75%**

BOOYOUNG HOUSING
CO LTD (República de Corea)

\$295 millones

Viviendas Urbanas

**Asignación
100%**

LIG NEX1 CO.,LTD.
(República de Corea)

\$59 millones

Plaza de
Mercado

**Asignación
100%**

GIFU BROADCASTING
SYSTEM INC

\$2.6 millones

Plaza de
mercado

**Asignación
100%**

1.2 Donaciones Internacionales

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

World Trade Organization

\$9.4 millones

Plaza de
Mercado

Asignación
100 %

HYUNDAI

\$293 millones

Plaza de
Mercado

Asignación
100 %

USA PEEC

\$72.5 millones

Plaza de
Mercado

Asignación
100 %

Give to Colombia
(Colombianos en USA)

\$173 millones

Dotación Centro de
Desarrollo Infantil

Asignación
100%

Caring for Colombia
(Colombianos en USA)

\$122.7 millones

Dotación
Colegio Ciudad
Mocoa

Asignación
96%

Alemania
(Colombianos en Alemania)

\$8 millones

Plaza de
Mercado

Asignación
100 %

Personas en el Extranjero

\$172 millones

Viviendas
Urbanas

Asignación
93%

\$ 10.169 millones

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

Claro

\$479 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Senado de la República

\$370 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Caracol Televisión

\$290 millones

Colegio Ciudad
Mocoa

Asignación
100%

Colonia China en
Colombia

\$202 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Cámara de
Representantes

\$155 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Davivienda

\$150 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Seguros Bolívar

\$150 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

DIAN

\$113 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

SACYR (España)

\$100 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

1.3 Donaciones Nacionales

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

Shell

\$27 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Banco de la República

\$26 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Unidad de Atención y
Reparación de las

\$23 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

IGAC

\$20 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Terranum

\$20 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Findeter

\$16 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Cámara de Comercio de
Cali

\$28 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Gobernación del
Atlántico

\$13 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Ministerio de Trabajo

\$9 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

1.3 Donaciones Nacionales

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

Superintendencia Financiera

\$9 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Superintendencia de
Sociedades

\$7 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales–
UGPP

\$6 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

DAPRE

\$5 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

RTVC

\$3 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Gobernación del Cauca

\$3 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Coldeportes

\$3 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

UNGRD

\$3 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Ministerio de Hacienda

\$2 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

Ministerio de Vivienda

\$2 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Comisión de Regulación de
Comunicaciones

\$2 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Unidad de Planeación
Minero Energética

\$2 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Embajada del Perú en
Colombia

\$2 millones

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Ministerio de Cultura

\$2 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Instituto de Planificación
de Soluciones

\$1 millón

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Unidad del Servicio
Público del Empleo

\$1 millón

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Superintendencia de la
Economía Solidaria

\$1 millón

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Sanatorio de Agua de
Dios

\$1 millón

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Donaciones en Efectivo – Asignación PAE Mocoa

Ministerio del Interior

\$1 millón

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares

\$906 mil pesos

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Superintendencia de
Industria y Comercio

\$900 mil pesos

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

IDEAM

\$650 mil pesos

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Ministerio de Minas

\$600 mil pesos

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Agencia Nacional de
Seguridad Vial

\$494 mil pesos

Viviendas
Rurales

Asignación
100%

Metro Cali S.A.

\$274 mil pesos

Viviendas Rurales

Asignación
100%

Donaciones generales

\$7.904 millones

Viviendas
Rurales

Asignación
13%

1.4 INTERVENCIONES MINISTERIALES

\$ 1,2 billones

Periodo: 2017-2022

Departamento Nacional de Planeación

✓ Comprende **122 acciones** en 6 líneas de acción estratégicas:

- Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión del Riesgo.
- Infraestructura Social.
- Conectividad e Integración Regional.
- Desarrollo Económico.
- Desarrollo Social.
- Desarrollo Institucional.

Documento
CONPES

CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

3904

PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN

DE

MOCOA

2017 - 2022

4 Proyectos por valor de \$204.875 millones

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (3)

PROYECTO		AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	1.209 Viviendas Urbanas Convenio-UNGRD	Fase 1: 300 viv: Obra 100% Escrituración: se entregaron 191 y en proceso de entrega 109.	\$ 21.077	May 2017- Ago 2018
		Fase 2: 909 viv: Se adelantan la fase de estudios y diseños	\$ 60.477	Jun 2018- Sep 2019
2	Centro de Des. Infantil	Etapa de diseño culminada. Avance en obra.	\$ 4.076	Ago 2018 - Mar 2019
3	Sistema de Acueducto	Bocatoma Palmeras: 100% Desarenador: 95% PTAP: 2% Tanque 1 (930m3): 60% Tanque 2 (1.500m3): 40% Líneas de conducción: 28% Redes distribución: 91% Se incluyeron nuevas obras de mitigación listas en el 1er Semestre 2019	\$ 28.074	Jun 2017 – May 2019
TOTAL			\$ 113.675	



PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN (1)

PROYECTO		AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
4	Plan Maestro Alcantarillado	- Parte del préstamo BID-Mocoa. - Acción 1: PMA listo en el 2020 - Acción 2: Identificación y ejecución de obras prioritarias en paralelo - Acción 3: Selección lista corta y ajustes a los TDR para la contratación de la Gerencia del Proyecto.	\$ 91,200	5 Años Ago 2018 – Jul 2023

3 Proyectos por valor de \$20.443 millones

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (1)

PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
1 Proyectos productivos Convenio-UNGRD	85% de avance en la entrega de dotación y herramientas a 180 familias.	\$ 1.020	Feb 2018- Ago 2018



PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN (2)

PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
2 252 Viviendas Rurales Convenio-UNGRD	Se adquirió predio. Banco Agrario desembolsó una parte de los recursos al FNGRD, pendiente el 6%.	\$ 14.611	Abr 2018 - Oct 2019
3 Mejoramiento de 280 viviendas rurales	- En etapa evaluativa de los posibles beneficiarios propuestos por la Alcaldía Municipal. - Sin asignación de recursos	\$ 4.812	-



9 Proyectos por valor de \$58.004 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (3)

	PROYECTO	VALOR
1	89 becas Programa ser Pilo Paga	\$ 1.805
2	2.294 créditos congelados con el ICETEX	\$ 26.800
3	2518 uniformes escolares	\$ 727
	TOTAL	\$ 29.332



PROYECTOS EN EJECUCIÓN (6)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
4	Megacolegio Sauces II Convenio-UNGRD	Contratada obra e interventoría	\$ 9.095	Jun 2018 – Jul 2019
5	Construcción 24 Aulas	6- Pio XII: 9,5% avance físico 10 -Simón Bolívar y 8 -Alto Afán: Estudios y diseños	\$ 7.500	Abr 2018 – Jul 2019
6	Mejoramiento 9 sedes educativas	41% de avance físico	\$ 2.897	May 2018 – Oct 2018
7	Intervención 6 aulas colegio Kamentsa Gobernación	85% de avance físico	\$ 1.180	Dic 2017 – Oct 2018
8	Construcción colegio Fray Placido Gobernación	Estudios y diseños	\$ 7.500	Abr 2018 – Mar 2019
9	Intervención 3 aulas Sede Belén del Palmar	En proceso de adjudicación estudios y diseños	\$ 500	Nov 2018 – Ene 2019
	TOTAL		\$ 28,672	

5 Proyectos por valor de \$14.712 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (3)

	PROYECTO	VALOR
1	500 apoyos programa familias y jóvenes en acción	\$ 496
2	500 cupos programa mi negocio	\$ 2.349
3	430 Red Unidos y Donaciones	\$ 293
TOTAL		\$ 3.138



Mejoramiento de Vivienda

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (2)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
4	Construcción Plaza de Mercado Convenio-UNGRD	-Obras Preliminares: 11.34 % Avance físico -Recursos desembolsados al FNGRD	\$ 8.100	Jun 2017 – Jun 2020
5	Mejoramiento de 300 viviendas urbanas	1ra etapa – 62% de avance físico (24 mejoramientos) 2da etapa – 0% de avance físico 3ra etapa – 0% de avance físico	\$ 3.474	Abr 2018 – Oct 2018
TOTAL			\$ 11.574	

6 Proyectos por valor de \$34.330 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (05)

	PROYECTO	VALOR
1	Reactivación de 173 Negocios Formales	\$ 4.722*
2	3.239 beneficiarios con crédito Bancóldex**	\$ 27.486
3	1.030 créditos garantizados, por COP\$17.761 millones-FNG	\$ 900
4	169 artesanos beneficiarios y 5 cabildos indígenas fortalecidos***	\$ 680
5	Promoción del turismo (3 programas: promoción Mocoa, formadores nativos e implementación y certificación de prestadores de servicios turísticos en normas técnicas sectoriales)	\$ 454
	TOTAL	\$ 34.242



Negocios reactivados

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (01)

	PROYECTO	VALOR Y AVANCE	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	3 programas de Promoción del Turismo (inventario turístico, guiones turísticos e implementación de modelos de gestión de Turismo, Paz y Convivencia). Avance físico: 70%	\$ 88	Sep 2018 – Ene 2019
	TOTAL	\$ 88	

*Incluye costos de administración

** Incluidos \$2.000 millones, costo directo asumido para abrir el instrumento y lograr la colocación del crédito

*** En 2018 se avanza en procesos de seguimiento y acompañamiento técnico a los proyectos 2017.

5 Proyectos por valor de \$29.196 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (01)

PROYECTO		VALOR
1	Puente sobre el río Mulato INVIAS	\$ 3.240



Avance Puente Mulato

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (04)

PROYECTO		AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
2	Puente sobre el río Sangoyaco – Av. Colombia INVIAS	22% avance físico	\$ 3.500	Oct 2017 – Dic 2018
3	Construcción Variante San Francisco - Mocoa Segunda licitación (programada 3-09-18) INVIAS	En etapa de preconstrucción Licitación II – Septiembre 2018	\$ 8.936 \$ 7.020	Jun 2018 – Dic 2018
4	Puente sobre la Quebrada San Antonio ANI (Concesión Aliadas)	Sin diseños – Sin recursos	\$ 3.900	-
5	Puente sobre el río Sangoyaco – Terminal INVIAS	Se tiene los estudios y diseños – Sin recursos	\$ 2.600	Oct 2017 – Mar 2020
TOTAL			\$ 25.956	

4 Proyectos por valor de \$45.554 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (1)

	PROYECTO	VALOR
1	Subsidios al consumo de energía y gas natural de los estratos 1,2 y 3	\$ 554



PROYECTOS EN EJECUCIÓN (2)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
2	Restablecimiento provisional estación Junín	95% avance físico		Dic 2017- Sep 2018
3	Reubicación torres línea Mocoa - Puerto Caicedo	Inicio de diseños		Ago 2018 - Dic 2018

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN (1)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
4	Construcción de la nueva subestación "RENACER" Empresa de Energía de Bogotá	16% avance en estudios y diseños Pendiente definición del lote	\$ 45.000	Mar 2018- Mar 2020

8 Proyectos por valor de \$7.400 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (8)

	PROYECTO	VALOR
1	3 licencias de emisoras comunitarias.	-
2	226 becas en TI- competencias técnico laborales.	\$ 700
3	4.500 Computadores Para Educar a 33 sedes educativas pertenecientes a etnias indígenas con apoyo de la Alcaldía.	\$ 3.497
4	Se capacitaron 318 MiPymes en el uso de tecnología.	\$ 250
5	Se instalaron 6 zonas WiFi.	\$ 702
6	Transformación digital de 200 MiPymes	\$ 250
	TOTAL	\$ 5.399



PROYECTOS EN EJECUCIÓN (2)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
7	2.500 decodificadores de TDT	6% avance físico (150 decodificadores entregados)	\$ 1.153	Oct 2017 - Sep 2019
8	Punto Vive Digital + LAB	En estructuración del proceso de selección	\$ 848	Mar 2018 - Dic 2018
	TOTAL		\$ 2.001	

1 Proyecto por valor de \$364 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (1)

PROYECTO		VALOR
1	Construcción Biblioteca Embajada de Japón	\$ 364



1 Proyecto por valor de \$63.400 millones

Ejecutado por la Gobernación del Putumayo

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (1)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	Construcción y Dotación Hospital José María Hernández Gobernación	61.4% avance físico	\$ 63.400	Jun 2017- Mar 2020



4 Proyectos por valor de \$10.059 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (2)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	Máquina Cisterna para Mocoa (DNBC)	Entregada	\$ 344	Jun 2017 – Oct 2017
2	Kit Hidráulico de desinundación (DNBC)	Entregado	\$ 118	Ago 2017 – Ene 2018

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN (2)

	PROYECTO	AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
3	Construcción Bunker Fiscalía	No ha sido definido el lote	\$ 9.532	21 meses
4	Fortalecimiento equipos de protección personal cuerpo de Bomberos Mocoa (DNBC)	En proceso de compra	\$ 65	Dic 2018

2 Proyectos por valor de \$899 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (1)

PROYECTO		AVANCE	VALOR
1	Construcción Casa Lúdica	100% avance físico	\$ 800



Avance Casa Lúdica

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (1)

PROYECTO		AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
2	Cancha Deportiva	40% avance físico Construcción del cerramiento y adecuación del terreno para fundir placa	\$ 99	Jul 2018 – Nov 2018

2 Proyectos por valor de \$133.000 millones

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN (2)

PROYECTO		AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	Estudios y Diseños de Obras de Mitigación UNGRD	Se acordaron los términos de referencia para los estudios y diseños, y se encuentra en proceso de contratación.	\$ 3.000	6 Meses
2	Construcción de Obras de Mitigación	Definición de los puntos a intervenir sobre las cuencas, que tipo de estructuras se van a construir y asignación de recursos por parte del MHYCP (Depende del PBOT)	\$ 130.000	-



1 Proyecto por valor de \$4.886 millones

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (1)

PROYECTO		AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
1	Revisión y Ajuste del PBOT + Estudios de Riesgos	58% avance físico (Fase de Diagnóstico 80%. En revisión por interventoría productos asociados a riesgos.)	\$4.886	Ago 2017 – Oct 2018

**PROGRAMA
POT
MODERNOS**

2 Proyectos por valor de \$1.700 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (2)

	PROYECTO	VALOR
1	Estudio de amenaza por movimiento en masa y flujo	\$ 1.300
2	Estudios de Microzonificación Sísmica	\$ 400
	TOTAL	\$ 1,700



10 Proyectos por valor de \$22.656 millones

PROYECTOS FINALIZADOS (5)

PROYECTO		VALOR
1	Instalación Sistema de Alerta Temprana	\$ 2.073
2	Rehabilitación cancha deportiva El Pepino	\$ 330
3	Adecuación y dotación colegio Ciudad Mocoa	\$ 407
4	60 medios de vida para reactivación económica Cruz Roja Colombiana	\$ 351
5	4 Puentes Peatonales	\$ 386
6	Oficina de Gobierno Nacional	\$ 2.084
TOTAL		\$ 5.631



Entrega Kits Alimentarios Julio, 2018

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (4)

PROYECTO		AVANCE	VALOR	PLAZO DE EJECUCIÓN
7	Pavimentación de 2,2 km de vía Min Defensa	52% avance físico	\$ 5.145	Oct 2017 - Mar 2019
8	Rehabilitación Coliseo Modesto Ruano	22,5% avance físico	\$ 767	Jul 2018 - Nov 2018
9	Pago de Subsidios de Arriendo	Se realiza el pago de 1.220 subsidios cada tres meses	\$ 10.200	Hasta la entrega de las viviendas
10	Entrega de Asistencia Humanitaria	Se realiza la entrega de 1.220 kits alimentarios mensualmente	\$ 913	
TOTAL			\$ 17.025	

2.

LLUVIA TORRENCIAL MOCOA, PUTUMAYO

Evento del 12 de Agosto 2018

CONDICIONES DEL EVENTO

- Lluvias de alta intensidad entre las 11:15 pm del 11 de agosto y 4:17 am del 12 de agosto de 2018.
- 139,16 milímetros de agua en un periodo de 5 horas.
- Creciente por encima de los niveles de tolerancia de los ríos Mulato y Sangoyaco.

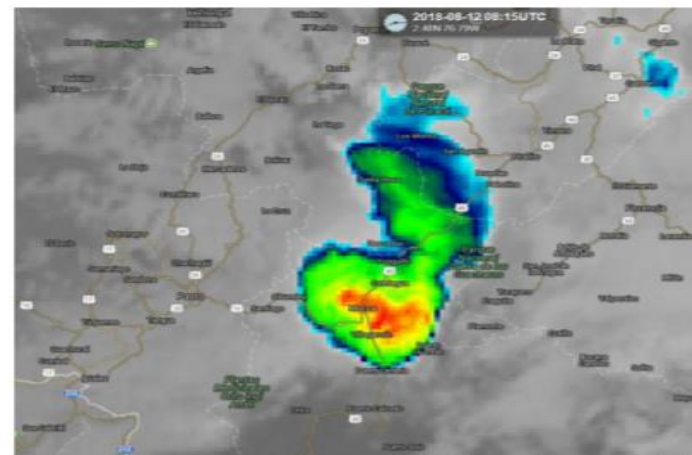


Figura 1. Imagen de satélite Goes 16 del 12 de agosto de 2018, a las 3:15 HLC, para la cuenca del río Mocoa. **Fuente:** GOES 16 SSEC.


CONDICIONES HIDROLÓGICAS

El río Mocoa registró un caudal pico de 4.09 m a las 05:00 HLC en el nivel del río Mocoa

3 Ríos: Mulato, Sangoyaco y Mocoa

2 Quebradas: Taruca y Taruquita

Fuente:

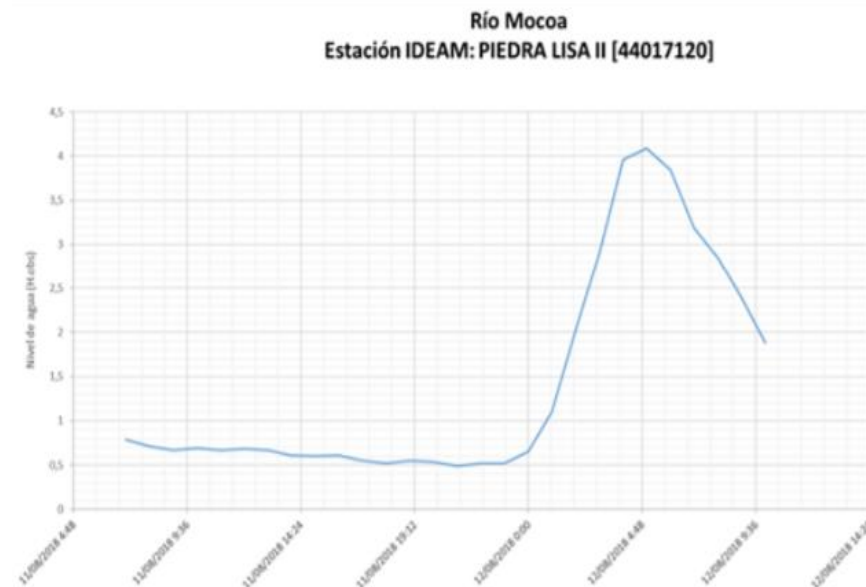

MARCO LEGAL

- Declaratoria de Calamidad Pública municipio de Mocoa. Decreto No. 176 del 12 de agosto de 2018.

AFECTACIÓN

0	Fallecidos
0	Desaparecidos
9	Personas lesionadas
19	Barrios
20	Veredas
582	Familias afectadas
56	Comerciantes afectados



Seguimiento PAE Mocoa. 20 de agosto de 2018.

SECTORES AFECTADOS

167 VIVIENDAS	96 Urbanas 71 Rurales
VÍAS	3 Vías
PUENTES	1 Puente Peatonal colapsado sobre el río Mulato 4 Puentes peatonales averiados 3 Puentes Vehiculares
AGUA Y SANEAMIENTO	2 Acueductos afectados (Aguas Mocoa y Barrios Unidos) 1 Alcantarillado afectado en 4 sectores 4 Acueductos Rurales
SERVICIOS PÚBLICOS	1 Red de Gas 1 Torre de energía con riesgo de colapso
INFRAESTRUCTURA	3 Sensores del SAT destruidos 10 Puntos con pérdida de jarillones a lo largo de los ríos Sangoyaco y Mulato

ACTIVACIÓN SNGRD

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en cabeza del señor Presidente de la República.

Activación inmediata del Puesto de Mando Unificado- PMU

- 19** Entidades participantes del SNGRD
- 30.000** Personas evacuadas

ASISTENCIA HUMANITARIA ENTREGADA

- 312** Mercados
- 312** Kit de Aseo
- 36** Frazadas
- 36** Colchonetas

AGUA Y SANEAMIENTO

- 701.359** Litros de Agua entregados
- 11** Carrotanques en operación
(3 UNGRD, 1 Policía Nacional, 7 Bomberos)
- 1** Planta de Tratamiento de agua dispuesta por la Cruz Roja
- 2** Acueducto en recuperación
- 1** Equipo en descolmatación de Bocatoma
- 1** Vactor – limpieza de la red de alcantarillado

SERVICIOS PÚBLICOS REESTABLECIDOS

- 100%** Servicio de agua (48 horas)
- 100%** Servicio de acueducto (48 horas)
- 100%** Servicio de gas (72 horas)
- 100%** Servicio de energía (12 horas)



Puesto de Mando Unificado

INFRAESTRUCTURA

- 1** Puente vehicular rehabilitado
- 1** Puente peatonal sobre el río Mulato desarmado
- 13** Equipos de maquinaria amarilla en descolmatación de ríos y demolición de viviendas



Carrotanque en operación.

SALUD

Activación de vigilancia comunitaria en salud

- Equipo social para el apoyo a las familias damnificadas

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

- 15.300 Unidades de bienestarina entregada
- 130 Paquetes de alimento nutricional
- 400 Familias caracterizadas por el ICBF

EDUCACIÓN

- Instituciones educativas en rehabilitación

100% Restablecimiento del servicio educativo en Mocoa y Villagarzón.

COMERCIO

Activación de la línea de crédito Bancoldex



Entrega de Asistencia Humanitaria Mocoa

Familias Registradas en el RUD



582

Personas Registradas en el RUD



1.896



Muchas Gracias

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Avenida Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 – Piso 2
