



20-05-2025

Bogotá D.C.

Doctor

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA

Secretario General Cámara de Representantes

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Secretaria.general@camara.gov.co

Carrera. 7 No 8-68, Edificio Nuevo del Congreso

Ciudad

Asunto: Respuesta a su Proposición No. 109 - Debate de Control Político sobre proyectos viales en el Departamento de Putumayo.
Radicados MT No. 20253030777422, 20253030794852 y 20253030820462

Respetado Secretario, reciba un cordial saludo,

En atención a los radicados del asunto, mediante los cuales solicitó a esta Cartera ministerial y a sus entidades adscritas, Instituto Nacional de Vías - Invías y Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, entre otros temas, información relacionada con los proyectos viales en el *departamento de Putumayo*, a continuación, se brinda respuesta en los siguientes términos, de conformidad con las competencias asignadas al Ministerio de Transporte y con base en los datos que reposan en sus sistemas de información:

CUESTIONARIO MINISTERIO DE TRANSPORTE

1. ***"El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una audiencia pública en el municipio de San Francisco, Putumayo, se comprometió a entregar la variante San Francisco - Mocoa antes de que termine este Gobierno. ¿La cartera ministerial mantiene el compromiso con el departamento de Putumayo?"***

Aun cuando este proyecto se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Vías – Invías, es pertinente mencionar que el mismo está declarado como de importancia estratégica.

Actualmente, se ejecuta en el marco de dos contratos: uno de obra y otro de interventoría por valor de \$1.20 billones aproximadamente, los cuales se detallan a continuación:

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.


Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

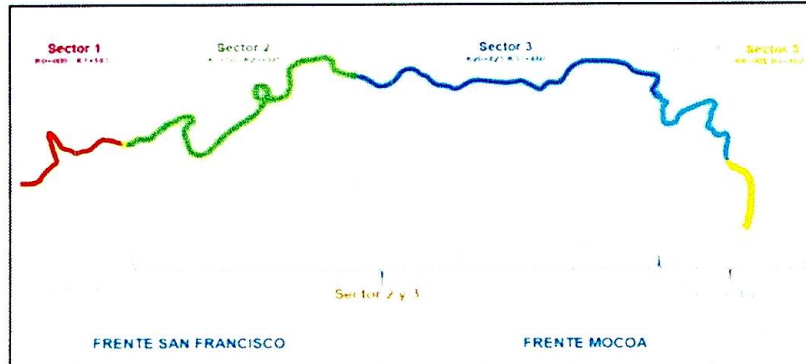

1. Frente San Francisco:

Frente San Francisco	
Proyecto	Variante San Francisco - Mocoa Sector 2
No. Contrato de Obra	1111-2021
Objeto	Construcción, mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la variante San Francisco Mocoa tramo 2 (frente San Francisco), departamento de Putumayo, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y Reactivación Visión 2030"
Acta de inicio	02/07/2021
Fecha de finalización	31/08/2030
Contratista Obra	CONSORCIO SAN FRANCISCO Estyma Estudios y Manejos S.A 50% Unidad Infraestructura Y Construcciones Asociadas SAS 35% Termotecnica Coindustrial SAS 8% Hb Structuras Metálicas SAS 7%
Inversión total (millones)	\$634.461
No. Contrato de Interventoría	977 - 2021
Contratista Interventoría	CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO HMV Ingenieros LTDA 40% Grupo Interdiseños S.A.S. 30% Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. 30%
Estado de obra programado	25.84%
Estado de obra ejecutado	32.79%
Porcentaje Planeado Financiero	20.58% - \$125.646 millones
Porcentaje Ejecutado Financiero	22.40% - \$136.743 millones
Alcance	Construcción Vía Nueva: 6.6 Km Construcción Puentes: 16 UN Rehabilitación Tramo Mallama - Ricaurte: 20.78 Km

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTetf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



Longitud del corredor	14.47 Km
Longitud a Intervenir	6.60 Km
Necesidades	Construcción vía nueva: 7.3 Km, puentes: 17 Un y túnel: 1 Un

Vale la pena resaltar que, durante la vigencia 2024, se intervinieron los siguientes puntos críticos: PR 49 Sector Río Negro – Santiago, por valor de \$12.000.000.000 y PR 75 Sector San Francisco – Chorlavi, por valor de \$8.000.000.000, en este último, se realizaron las obras de canalización de la quebrada, construcción de Jarillón, obras de protección para evitar la erosión de talud y nivelación de la vía con material de mejoramiento.

2. Frente Mocoa

Frente Mocoa	
Proyecto	Variante San Francisco - Mocoa Sector 3
No. Contrato de Obra	964 - 2021
Objeto	<i>Construcción, mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de la Variante San Francisco - Mocoa Tramo 3 (Frente Mocoa) en el Departamento de Putumayo, en marco de la reactivación económica, mediante el Programa de obra Pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030"</i>
Acta de inicio	21/06/2021
Fecha de finalización	31/08/2030
Contratista Obra	CONSTRUCCIONES EL CONDOR Construcciones El Condor S.A. 100%
Inversión total (millones)	\$565.389
No. Contrato de Interventoría	977 - 2021
Contratista Interventoría	CONSORCIO REACTIVACION PUTUMAYO HVM Ingenieros LTDA 40% Grupo Interdiseños S.A.S. 30% Consultoría en Ingeniería Integral S.A.S. 30%
Estado de obra programado	25.84%
Estado de obra ejecutado	32.79%
Porcentaje Planeado Financiero	23.95% \$ 129.647 millones
Porcentaje Ejecutado Financiero	23.65% \$ 118.057 millones
Alcance	Construcción Vía Nueva: 5.6 Km Construcción Puentes: 17 UN Túneles: 1 UN
Longitud del corredor	12.47 Km
Longitud a Intervenir	5.6 Km
Necesidades	Construcción vía nueva: 7.0 Km, puentes: 14 Un y túnel: 1 Un

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.

Es preciso mencionar que, a la fecha, el Instituto Nacional de Vías - Invías está avanzando en la reingeniería del nuevo trazado propuesto, que abarca aproximadamente 19 km, iniciando en el Km 12+100 por el frente San Francisco y en el Km 14+400 por el frente Mocoa. Para dar continuidad a la ejecución de este nuevo trazado se hace necesario modificar la licencia ambiental.

En todo caso, según lo indicado, se requieren más de \$2 billones para terminar este importante proyecto, recurso con el que no se cuenta a la fecha, por lo tanto, es necesario que el Invías adelante la gestión correspondiente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2. "¿Cuál es el estado de ejecución del plan de vías terciarias del departamento de Putumayo?"

Si bien el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total -CCPT- se encuentra a cargo del Invías, en las siguientes tablas se resume el avance por fases, con corte a abril de 2025, así:

Fase I

Ítem	Nº Convenio	Municipio	Vía priorizada	Fecha suscripción.	Fecha inicio	Fecha termina	Estado obra programado	Estado obra ejecutado	Inversión total (millones)
1	3322-2023	Puerto Guzmán	Junta De Acción Comunal De San Jose De La Montaña	sep-23	dic-23	jun-24	100%	100%	\$ 224
2	3571-2023	Mocoa	Junta De Acción Comunal Vereda Monclart	sep-23	nov-23	jun-24	100%	100%	\$ 216
3	3736-2023	Mocoa	Junta De Acción Comunal De Pueblo Viejo	oct-23	nov-23	may-24	100%	100%	\$ 252
4	3580-2023	Orito	Junta De Acción Comunal Vereda La Esmeralda	sep-23	nov-23	may-24	100%	100%	\$ 218
5	4713-2023	Orito	Junta De Acción Comunal De La Vereda Siberia.	nov-23	dic-23	ago-24	100%	100%	\$ 227
6	4669-2023	Puerto Asís	Junta De Acción Comunal De Vereda Carmen Del Piñuña	nov-23	dic-23	jun-24	100%	100%	\$ 237
7	3448-2023	Puerto Asís	Junta De Acción Comunal De Alto Cuembi	sep-23	nov-23	ago-24	100%	100%	\$ 225

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.
Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950
Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>
Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042
Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>
Correo electrónico: servicioc Ciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



20-05-2025

Ítem	Nº Convenio	Municipio	Vía priorizada	Fecha suscripción.	Fecha inicio	Fecha termina	Estado obra programado	Estado obra ejecutado	Inversión total (millones)
8	4770-2023	Puerto Caicedo	Junta De Acción Comunal Vereda El Triunfo	dic-23	dic-23	jun-24	100%	100%	\$ 228
9	3640-2023	Puerto Guzmán	La Junta De Acción Comunal De La Vereda Puerto Rosario	sep-23	dic-23	jun-24	100%	100%	\$ 251
10	3645-2023	Puerto Leguizamo	Junta De Acción Comunal De La Vereda La Raicita	oct-23	dic-23	jun-24	100%	100%	\$ 226
11	3342-2023	San Francisco	Junta De Acción Comunal De La Vereda Chorlavi	sep-23	dic-23	jun-24	100%	100%	\$ 217
12	3727-2023	San Miguel	Asociación De Juntas Comunales	oct-23	nov-23	may-24	100%	100%	\$ 215
13	4195-2023	Santiago	Junta De Acción Comunal De El Porvenir	nov-23	dic-23	may-24	100%	100%	\$ 215
14	3382-2023	Sibundoy	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Cedro	sep-23	dic-23	may-24	100%	100%	\$ 215
15	3360-2023	Valle del Guamuez	Junta De Acción Comunal De La Vereda El Palmar	sep-23	nov-23	may-24	100%	100%	\$ 235
16	4666-2023	Villa Garzón	Junta De Acción Comunal Vereda Betulia	nov-23	dic-23	jun-24	100%	100%	\$ 216
17	3462-2023	Villa Garzón	Junta De Acción Comunal De La Vereda Río Blanco	sep-23	dic-23	ene-25	100%	100%	\$ 214

Fase II

Ítem	Nº Conven	Munic	Vía priorizada	Fecha Suscripción.	Fecha Inicio	Fecha Terminación.	Estado Obra Programado.	Estado Obra Ejecutado	Inversión total (millones)	Estado
1	2113-2024	Colón	Junta De Acción	jul-24	ago-24	mar-25	0%	0%	\$ 240	En Ejecución

5

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



Ítem	Nº Conven	Munic	Vía priorizada	Fecha Suscripción.	Fecha Inicio	Fecha Terminación.	Estado Obra Programado.	Estado Obra Ejecutado	Inversión total (millones)	Estado
			Comunal De La Vereda La Gulumbia							
2	2085-2024	Mocoa	Junta De Acción Comunal De San Luis De Chontayaco	jun-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 241	Suspendido
3	2267-2024	Mocoa	Junta De Acción Comunal Vereda Campucana	jul-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 241	En Ejecución.
4	3516-2024	Mocoa	Junta De Acción Comunal Villa Rosa	sep-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución.
5	3590-2024	Mocoa	Resguardo Indígena De Yungullo	sep-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 240	En Ejecución.
6	2195-2024	Orito	Junta De Acción Comunal Barrio La Alameda	jul-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución.
7	2523-2024	Orito	Junta De Acción Comunal Vereda La Palmira	jul-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 241	En Ejecución.
8	3592-2024	Orito	Junta De Acción Comunal Monserrate	sep-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución.
9	2228-2024	Puerto Asís	Junta De Acción Comunal De La Vereda Brisas Del Hong Kong	jul-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 241	En Ejecución.
10	2477-2024	Puerto Asís	Junta De Acción Comunal Vereda La Pradera	jul-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución.
11	3537-2024	Puerto Asís	Junta De Acción Comunal El Aguila	sep-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 248	En Ejecución.
12	3620-2024	Puerto Asís	Junta De Acción Comunal Vereda Carmelita	sep-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 244	En Ejecución.
13	3548-2024	Puerto Caicedo	Junta De Acción Comunal	sep-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución.

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



Ítem	Nº Conven	Munic	Vía priorizada	Fecha Suscripción.	Fecha Inicio	Fecha Terminación.	Estado Obra Programado.	Estado Obra Ejecutado	Inversión total (millones)	Estado
			Quebradonía							
14	2075-2024	Puerto Guzmán	Junta De Acción Comunal De El Cedro	jun-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución.
15	2987-2024	San Francisco	Junta De Acción Comunal De La Vereda Minchoy	ago-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	Suspendido
16	3436-2024	San Francisco	Junta De Acción Comunal San Miguel	ago-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 244	En Ejecución
17	2179-2024	San Miguel	Junta De Acción Comunal Vereda Risaralda	jul-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución
18	2218-2024	San Miguel	Junta De Acción Comunal Vereda El Sabalito	jul-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución
19	3704-2024	San Miguel	Junta De Acción Comunal Vereda El Sabalo	sep-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	Suspendido
20	2036-2024	Valle Del Guamez	Junta De Acción De Comunal Vereda El Venado	jun-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	Suspendido
21	2076-2024	Valle Del Guamez	Junta De Acción Comunal Vereda Alto Palmira	jun-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 241	En Ejecución
22	2095-2024	Valle Del Guamez	Junta De Acción Comunal Vereda El Tigre	jun-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución
23	3639-2024	Valle Del Guamez	Junta De Acción Comunal Vereda Laureles	sep-24	oct-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	En Ejecución
24	4106-2024	Valle Del Guamez	Cabildo Indígena Nueva Isla Municipio De La Hormiga	oct-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 241	Suspendido
25	2032-2024	Villa Garzón	Junta De Acción Comunal Vereda La Palanca	jun-24	sep-24	mar-25	0%	0%	\$ 242	Suspendido

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



Ítem	Nº Conven	Munic	Vía priorizada	Fecha Suscripción.	Fecha Inicio	Fecha Terminación.	Estado Obra Programado.	Estado Obra Ejecutado	Inversión total (millones)	Estado
26	4217-2024	Villa Garzón	OPIAC	nov-24	dic-24	abr-25	0%	0%	\$ 721	En Ejecución

Fuente: Invías con corte al 30 de abril de 2025

3. "¿Cuál es el avance del Gobierno Nacional en el Plan Vial Departamental de Putumayo 2021-2030?"

En virtud de lo señalado en el numeral 2.9 del artículo 2 del Decreto 087 de 2011, el Ministerio de Transporte apoya y presta colaboración técnica a los organismos estatales en los planes y programas que requieran, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario.

Asimismo, en los documentos Conpes 3480 y 3481, el Ministerio de Transporte asumió el compromiso de gestor del Programa Plan Vial Regional, el cual está orientado a facilitar dentro del marco regional y nacional, la competitividad e integración de los departamentos.

En concordancia con lo anterior, es preciso señalar que el Ministerio de Transporte ha venido trabajando de manera articulada con las gobernaciones de los 32 departamentos de Colombia, con el objetivo de realizar el apoyo técnico y el acompañamiento en la estructuración para la posterior aprobación de los Planes Viales Departamentales (PVD). Este esfuerzo conjunto responde a la necesidad de optimizar la gestión y el desarrollo de la infraestructura vial en cada región del país.

El Plan Vial Departamental tiene como propósito fundamental orientar de manera eficiente las inversiones y las intervenciones en la red vial de competencia departamental. Esto se logra mediante un ejercicio detallado y técnico elaborado por cada uno de los departamentos, siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Transporte.

El trabajo conjunto del Ministerio de Transporte con las gobernaciones busca asegurar que las inversiones en infraestructura vial se realicen de manera eficaz y equitativa, priorizando aquellas obras que son más urgentes y que traerán un mayor impacto positivo a las comunidades y economías locales.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y de acuerdo con su solicitud, le informamos que, el plan vial del departamento de Putumayo fue actualizado en el año 2021 con una vigencia de 10 años, es decir, hasta el año 2031. En la actualización del plan, el departamento incluyó 13 tramos con una longitud total de 129,67 km y, para su intervención en el momento de la aprobación, se estimó una inversión por valor de \$330 mil millones aproximadamente.

Ahora bien, es preciso señalar que, de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley 105 de 1993, corresponde a los departamentos la atención y gestión de las vías de su competencia. En este marco, y para hacer seguimiento a la implementación de los Planes Viales Departamentales (PVD), se solicita a las entidades territoriales el reporte de las inversiones efectuadas sobre las vías incluidas en dichos planes, conforme con lo programado en las matrices de formulación del plan.

En virtud de lo anterior, el Departamento del Putumayo remitió la matriz, cuya copia se adjunta al presente documento, en la cual se evidencian las inversiones realizadas en las vías incluidas en el Plan Vial del Departamento.

Finalmente, teniendo en cuenta la especificidad de las preguntas 1 y 2 formuladas en el cuestionario

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.




remitido, de acuerdo con lo expuesto en precedencia y que los contratos y/o proyectos a los que se ha hecho referencia están a cargo del Instituto Nacional de Vías – Invías, este Ministerio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 “*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo*”, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, ha realizado traslado a dicha entidad mediante el oficio MT 20251080574081, el cual se anexa, para que de acuerdo con las competencias a su cargo, brinde la información requerida con mayor detalle.

Cordialmente,



MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA
Ministra de Transporte

Anexo: Comunicación MT No. 20251080574081.
Matriz e Información Plan Vial

Aprobó: Liliana Ospina Arias - Viceministra de Infraestructura 
Yurany Pérez Castro - Asesora 1020 Grado 13

Revisó: Elizabeth Marín - Asesora Viceministerio de Infraestructura 
Andrea Ramírez - Contratista Viceministerio de Infraestructura 

Proyectó: Angela Cuadros Veloza - Contratista Viceministerio de Infraestructura 

Consolidó: Juan Garzón - Oficina Enlace Congreso 

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.



Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.



ARDILA
Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

OK

Aprobado

PROPOSICIÓN

Debate de Control Político sobre proyectos viales en el Departamento de Putumayo

Con la venia de la Honorable Mesa Directiva, me permito poner a consideración la presente proposición de citación a debate de control político sobre el estado de los proyectos viales en el departamento de Putumayo.

Para el efecto, cítese al Ministro de Transporte, Dr. William Fernando Camargo Triana; a la Directora General del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Dra. María Constanza García Alicastro; al Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dr. Francisco Ospina Ramírez, así como al Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves.

Igualmente, invítese a la Contraloría General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Gobernación de Putumayo, a las demás autoridades municipales y locales, así como también a las veedurías ciudadanas del departamento.

Para la realización de este debate de control político, dejo a consideración de la Mesa Directiva la fecha que mejor convenga.

Adjunto los cuestionarios correspondientes.

Cordialmente,

CARLOS ARDILA ESPINOSA
Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo



Subsecretaría General


Fecha:

Abril 23/2024

Hora:

2:28

N: 109



ARDILA


Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

**CUESTIONARIO
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

1. El Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una audiencia pública en el municipio de San Francisco, Putumayo, se comprometió a entregar la variante San Francisco - Mocoa antes de que termine este Gobierno. ¿La cartera ministerial mantiene el compromiso con el departamento de Putumayo?
2. ¿Cuál es el estado de ejecución del plan de vías terciarias del departamento de Putumayo?
3. ¿Cuál es el avance del Gobierno Nacional en el Plan Vial Departamental de Putumayo 2021-2030?

N: 109

28




ARDILA

Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

CUESTIONARIO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS)

1. ¿Cuáles fueron las gestiones del INVÍAS para asegurar los recursos para la culminación de los 27 km faltantes del proyecto Variante San Francisco-Mocoa?
2. Favor adjuntar copia de los contratos de obra N° 1111 de 2021 y 964 de 2021 y del Contrato de interventoría N° 977 de 2021.
3. ¿Cuál es el estado de avance de los tramos 1, 4 y 5 del corredor vial de los contratos antes descritos?
4. ¿En qué estado del trámite se encuentra la modificación de la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA según el Decreto 1076 de 2015 y la ampliación del polígono de sustracción de la reserva forestal ante la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS de acuerdo con la Resolución 110 del 2022, para implantar los diseños de la alternativa que buscan el mejoramiento de las vías?
5. ¿Cuál es el estado de la reingeniería de los sectores 2 y 3 y diseño de los siguientes 20 kilómetros del proyecto "Variante San Francisco-Mocoa" del trazado definido como "Nueva alternativa"?
6. En cuanto a los 20 km pendientes de estos sectores y el empalme con los 3 primeros kilómetros de cada frente con una adecuada transición conforme a los requerimientos normativos garantizando la seguridad de los usuarios en la vía, ¿cuáles son los avances?
7. ¿Cuál es el estado del pavimento del denominado Corredor Sur se ubica en la Ruta 4501 en la región Amazónica de Colombia, el cual presentaba avance del 98,6% para el 08 de agosto de 2023?
8. ¿Qué avances se tienen en el proceso sancionatorio para la aplicación de la cláusula penal pecuniaria por el incumplimiento de las obligaciones del contrato de obra No. 948-2022?

34




ARDILA

Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

9. Favor adjuntar copia de los contratos de obra e interventoría 985 - 2022 y 988 - 2022 respectivamente, los cuales tienen fecha 18 y 19 de mayo de 2022, derivados de los procesos LP-DTE-055-2021 y CMA-DTE-SEP-190-2021, así como también de las resoluciones de apertura 4134 de Dic-17-21 y 4052 de Dic-14-21 y de las resoluciones de adjudicación 938 de marzo 23 de 2022 (contrato de obra) y 1135 de marzo 30-22 (contrato de interventoría), al igual que la copia del Registro Presupuestal No. 585822 con fecha 20 de mayo de 2022.
10. Favor adjuntar copia del contrato de obra N° 985 de 2022, la Garantía Única de Cumplimiento No. 400040822, Anexo 1 del 28 de junio de 2022 y Anexo 2 del 15/07/2022 y el Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400040821, Anexo 1 del 28 de junio de 2022 que amparan el contrato principal de obra.
11. Favor explicar el anuncio de que el INVÍAS no cuenta con recursos para financiar el costo de \$ 129.520 millones destinado a la construcción del puente sobre el Río Putumayo, en el Municipio de Puerto Asís que fueron determinados para el 29 de julio de 2022 por el contrato de consultoría No. 963 de 2021 y el Contrato de interventoría No. 954 de 2021 para la elaboración de todos los estudios y diseños de las obras requeridas a Fase III de contratación.


N-109



CUESTIONARIO
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI)

- 2-109
1. Favor adjuntar copia de la Resolución 146 de 2019 confirmada mediante Resolución 494 de 2019 por la cual se declara el incumplimiento grave del contrato de concesión N° 012 de 2015.
 2. ¿Qué acciones se ejecutaron en la fase de normalización, entre la cesión del contrato y la reactivación del nuevo plan de obras (02 de julio de 2021 - 02 de julio de 2022)?
 3. ¿Cuáles fueron los puntos críticos atendidos y no atendidos en el Plan Remedial presentado por Aliadas?
 4. ¿Cuál es el estado actual de las Unidades Funcionales UF6 - San Juan de Villalobos - Mocoa y UF7 - Mocoa-Santana?
 5. ¿Qué medidas se han tomado en el sector de la Bota Caucana en la UF6 - San Juan de Villalobos - Mocoa ante las dificultades con las comunidades indígenas y campesinas, quienes en el primer caso no permiten el ingreso de la concesionaria para ejecutar las obras hasta tanto se realicen consultas previas y en el segundo caso hasta tanto se atiendan sus necesidades básicas insatisfechas?
 6. En relación con la pregunta anterior, favor adjuntar los conceptos del Ministerio del Interior donde manifiesta que no procede la consulta previa para esas comunidades y las actas de las reuniones de la Concesionaria con las comunidades, con acompañamiento de la ANI, la interventoría del proyecto, y del Ministerio Público (Defensoría y Procuraduría) como garantes, con el objetivo de llegar a acuerdos, que permitan la ejecución de las obras en el sector.
 7. A partir de la reactivación del nuevo plan de obras iniciado el día 02 de julio de 2022 por parte de la estructura plural conformada por Rodovías Colombia y Mercantil Colpatria (posteriormente Concesionaria Ruta al Sur S.A.S.), ¿Cuál ha sido el avance de las obras en la UF6 - San Juan de Villalobos - Mocoa?
 8. ¿En qué consisten los instrumentos de intervención ambiental y social, como el PAGA que permiten apoyar a las comunidades mitigando las necesidades que

54



ARDILA

Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo



son competencia del proyecto y que se encuentran dentro del alcance del contrato de concesión vial?

9. Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa – Santana – Puerto Asís), en el trámite de obtención de las licencias ambientales de la variante de Puerto Caicedo y de la Perimetral de Villagarzón, favor incluir las actas de las reuniones de acercamiento con las comunidades indígenas a ser consultadas, para adelantar las consultas previas y con el objetivo de obtener las licencias ambientales con la mayor celeridad.
10. Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa – Santana – Puerto Asís), ¿cuáles han sido los avances entre la Concesionaria y la comunidad, con el acompañamiento de la interventoría y la ANI, donde se ha manifestado la posibilidad de realizar ajuste al diseño de la ampliación de ancho de la vía, que a la fecha no se encuentra dentro del alcance contractual?

N: 109

CUESTIONARIO

042



ARDILA

Representante a la Cámara
Departamento del Putumayo

MINISTERIO DEL INTERIOR

1. Para el caso de la Unidad Funcional 7 (Mocoa – Santana – Puerto Asís), en el trámite de obtención de las licencias ambientales de la variante de Puerto Caicedo y de la Perimetral de Villagarzón, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI manifestó que obtuvo pronunciamiento de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sobre la procedencia de nuevas consultas a una nueva comunidad del área de influencia de la perimetral de Villagarzón y de una comunidad adicional de la zona de aferencia de la variante de Puerto Caicedo. ¿Cuál es el estado de dicho proceso de consulta previa?

N-109

7/12
